

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna
(delibera Cipess n.22/2021)

**Report sullo STATO DI ATTUAZIONE dell'ex PIANO OPERATIVO FSC 2014-
2020 (Delibera CIPE n.76/2017)**

Dati di monitoraggio al 31 dicembre 2021

Indice

1. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2021 sul Sistema Gestione Progetti (SGP)	4
2. STATO DI ATTUAZIONE del Piano Operativo per SINGOLA LINEA D’AZIONE al 31 dicembre 2021 5	
2.1 Linea d’azione “Qualificazione Impianti Sportivi”	5
2.2 Linea d’azione “Valorizzazione delle sedi di spettacolo”	5
2.3 Linea d’azione “Interventi di Edilizia Scolastica”	6
2.4 Linea d’azione “Edilizia Universitaria”	7
2.5 Linea d’azione “Valorizzazione dei beni e del Patrimonio Culturale”	7
2.6 Sintesi avanzamento procedurale	8
2.7 Sintesi avanzamento finanziario totale	8
2.8 Sintesi avanzamento finanziario FSC	9

1. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2021 sul Sistema Gestione Progetti (SGP)

Nella presente relazione si illustra lo stato di attuazione del Piano sviluppo e coesione della regione Emilia-Romagna, più precisamente ci si sofferma sulla programmazione 2014/2020 (ex Piano Operativo da Delibera CIPE n.76/2017).

Al 31 dicembre 2021, **119 interventi finanziati con risorse FSC** sono stati inseriti in SGP e monitorati (*Figura1*); nr.1 intervento di assistenza tecnica al Piano non è inserito in SGP. Questo intervento è stato riprogrammato durante la prima seduta del comitato di sorveglianza del 15 ottobre 2021; in tale occasione si è proceduto ad approvare la riprogrammazione di risorse rese disponibili all'interno del Piano operativo stesso, per azioni a supporto delle attività di gestione, sorveglianza e controllo del Piano FSC. Tali risorse ammontano complessivamente ad euro 159.988,71 (nello specifico euro 124.988,71 provenienti dalla linea di azione 'Valorizzazione delle sedi di spettacolo' ed euro 35.000,00 dalla linea di azione 'Qualificazione degli impianti sportivi').

Questo intervento non è però ricompreso alla data della presente relazione nel Sistema Gestione Progetti, il programma informativo utilizzato per la raccolta dati ed il monitoraggio del PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020.

2. STATO DI ATTUAZIONE del Piano Operativo per SINGOLA LINEA D'AZIONE al 31 dicembre 2021

2.1 Linea d'azione "Qualificazione Impianti Sportivi"

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.12.2021 Impianti sportivi

Impianti sportivi				
Interventi monitorati	Costo totale interventi	Risorse FSC	Impegni totali	Pagamenti totali
71	89.327.150,94 €	19.965.000,00* €	69.778.165,50 €	34.084.277,31€

Fonte: dati di monitoraggio Sistema Gestione progetti (SGP) versione 31.12.2021

Tabella 2 Avanzamento procedurale Impianti Sportivi 31.12.2021

Iter Procedurale	N. di interventi	Risorse FSC
Studio di fattibilità	1	210.000 €
Progettazione Preliminare		
Progettazione Definitiva	3	1.264.342,08 €
Progettazione Esecutiva	1	454.500,00 €
Definizione e stipula contratto	5	1.668.036,90 €
Esecuzione Lavori	32	11.791.059,60 €
Funzionalità		
Concluso	29	4.577.061,42 €
Totale	71	19.965.000,00 €*

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021

* non sono ricompresi i 35.000,00 euro riprogrammati su assistenza tecnica dal CDS il 15/10/2021

2.2 Linea d'azione "Valorizzazione delle sedi di spettacolo"

Tabella 3 Avanzamento finanziario al 31.12.2021 Valorizzazione e Spettacolo

Valorizzazione e Spettacolo				
Interventi monitorati	Costo totale interventi	Risorse FSC	Impegni totali	Pagamenti totali
32	13.201.028,81 €	4.875.011,27 €**	8.225.552,28€	€ 5.729.269,84

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021

Tabella 4 Avanzamento procedurale al 31.12.2021 Valorizzazione e spettacolo

Iter Procedurale	N. di interventi	Risorse FSC
Studio di fattibilità		
Progettazione Preliminare		
Progettazione Definitiva		
Progettazione Esecutiva	1	500.000,00 €
Definizione e stipula contratto	1	147.000,00 €
Esecuzione Lavori	12	2.960.271,57 €
Forniture in corso	1	113.345,00 €
Concluso	17	1.154.394,70 €
	32	4.875.011,27** €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021

** non sono ricompresi i 124.988,73 euro riprogrammati su assistenza tecnica dal CDS il 15/10/2021

2.3 Linea d'azione "Interventi di Edilizia Scolastica"

Tabella 5 Avanzamento finanziario al 31.12.2021 Edilizia Scolastica

Edilizia scolastica				
Interventi monitorati	Costo totale interventi	Risorse FSC	Impegni totali	Pagamenti totali
12	24.551.946,12 €	20.000.000 €	12.059.546,35€	6.760.884,42 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021

Tabella 6 Avanzamento procedurale al 31.12.2021 Edilizia Scolastica

Iter Procedurale	N. di interventi	Risorse FSC
Studio di fattibilità		
Progettazione Preliminare	3	4.830.000,00 €
Progettazione Definitiva		
Progettazione Esecutiva	1	1.814.000,00 €
Definizione e stipula contratto		
Esecuzione Lavori	4	8.830.000,00 €
Funzionalità		
Collaudo		€
Concluso	4	4.526.000,00 €
	12	20.000.000,00 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021

2.4 Linea d'azione "Edilizia Universitaria"

Tabella 7 Avanzamento Finanziario al 31.12.2021 Edilizia Universitaria

Edilizia Universitaria				
Interventi monitorati	Costo totale interventi	Risorse FSC	Impegni totali	Pagamenti totali
3	42.434.331,00 €	7.000.000,00 €	1.402.425,20 €	945.703,11€

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021

Tabella 8 Avanzamento procedurale al 31.12.2021 Edilizia Universitaria

Iter Procedurale	N. di interventi	Risorse FSC
Studio di fattibilità		
Progettazione Preliminare		
Progettazione Definitiva		
Progettazione Esecutiva		
Definizione e stipula contratto	1	2.317.000,00 €
Esecuzione Lavori	2	4.683.000,00 €
Funzionalità		
	3	7.000.000,00 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021

2.5 Linea d'azione "Valorizzazione dei beni e del Patrimonio Culturale"

Tabella 9 Avanzamento finanziario al 31.12.2021 Patrimonio Culturale

Patrimonio Culturale				
Interventi monitorati	Costo totale interventi	Risorse FSC	Impegni totali	Pagamenti totali
1	5.300.000,00 €	3.000.000,00 €	230.122,26 €	35.228,31 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021


Tabella 10 Avanzamento procedurale al 31.12.2021 Patrimonio Culturale

Iter Procedurale	N. di interventi	Risorse FSC
Studio di fattibilità		
Progettazione Preliminare	1	3.000.000,00 €
Progettazione Definitiva		
Progettazione Esecutiva		
Definizione e stipula contratto		
Esecuzione Lavori		
Funzionalità		
totale	1	3.000.000,00 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2021

2.6 Sintesi avanzamento procedurale

Figura 2 Valore interventi e numero dei progetti distinti per fase procedurale

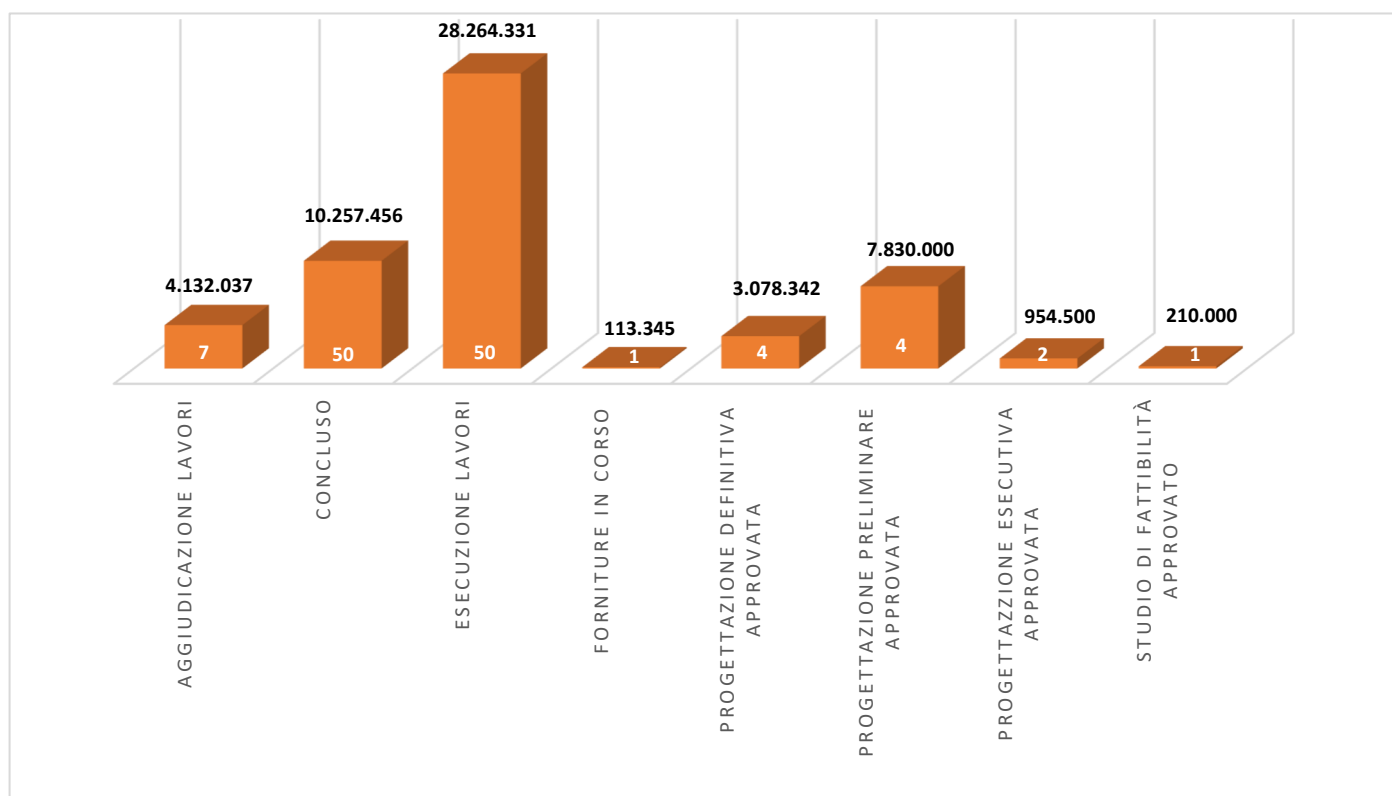

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.21

Per quanto riguarda l'iter procedurale (Figura2), il numero maggiore di interventi si concentra nella fase di esecuzione lavori con 50 interventi per un valore di 28.264.331,00 €; sono 7 gli interventi in fase di definizione e stipula contratto.

Infine, sono stati conclusi i lavori per 50 interventi per un valore che ammonta a 10.257.456,00 €.

2.7 Sintesi avanzamento finanziario totale

Tabella 11 Avanzamento finanziario al 31.12.2021 Totali

Linea d'azione	Risorse totali	Risorse FSC (post CDS 15-10-2021)	Impegni totali	Pagamenti totali
Impianti Sportivi	89.196.784,52 €	19.965.000,00 €	69.778.165,50 €	34.084.277,31 €
Valorizzazione e Spettacolo	€ 13.201.028,81	4.875.011,27 €	8.225.552,28	5.729.269,84 €
Edilizia Scolastica	24.551.946,12 €	20.000.000,00 €	12.059.546,35 €	6.760.884,42 €
Edilizia Universitaria	42.434.331,00 €	7.000.000,00 €	1.402.425,20 €	945.703,11 €
Patrimonio Culturale	5.300.000,00 €	3.000.000,00 €	230.122,26 €	35.228,31 €
Assistenza tecnica	-	159.988,71 €	-	-
TOTALI	174.684.090,45 €	55.000.000,00 €	91.695.811,59 €	47.555.362,99 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.21, tranne per l'intervento di Assistenza tecnica

Al 31.12.2021 sono stati monitorati e inviati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) 119 interventi finanziati a valere sul FSC; considerando anche l'intervento di assistenza tecnica descritto in premessa e riprogrammato con il CDS, il totale di risorse assegnate è di 55 milioni di euro (Tabella 11). Inoltre, le risorse FSC hanno attivato attraverso un effetto leva ulteriori risorse; infatti, quasi tutti gli interventi sono cofinanziati con altri finanziamenti pubblici o privati per un totale complessivo di 174.842.997,67 €.

2.8 Sintesi avanzamento finanziario FSC

Tabella 12 Avanzamento finanziario al 31.12.2021 Totali Banca Dati Unitaria

Linea d'azione	Impegni FSC	Pagamenti FSC
Impianti Sportivi	9.709.473,87 €	6.978.720,50 €
Valorizzazione e Spettacolo	3.429.085,63 €	2.760.803,32 €
Edilizia Scolastica	10.099.700,38 €	6.335.568,25 €
Edilizia Universitaria	1.402.425,20 €	945.703,11 €
Patrimonio Culturale	230.122,26 €	35.228,00 €
Assistenza tecnica	0 €	0 €
Totali	24.870.807,34 €	17.056.023,49 €

Fonte: Sistema Analisi Dati (SGP) versione 31.12.21 tranne per l'intervento di Assistenza tecnica

Relativamente ai dati trasmessi al Sistema Analisi Dati (SAD) di Igrue per l'avanzamento finanziario, il totale degli impegni FSC al 31 dicembre 2021 è di 24.870.807,34 euro, mentre i pagamenti corrispondono a 17.056.023,68 euro (Tabella 12).
