

ACCORDO DI PROGRAMMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia-Romagna,
Città Metropolitana di Bologna

“Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della
regione Emilia-Romagna”

Programmazione FSC 2014-2020

DELIBERA CIPE N. 76/2017

**RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020**

ANNO 2019

(punto 2.b Delibera CIPE 25/2016 e punto A.1 Circolare 1/2017)

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE, ISTITUZIONI

Indice

1. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2019 sul Sistema Gestione Progetti (SGP)	5
2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER SINGOLA LINEA D'AZIONE AL 31.12.2019	6
2.1 Qualificazione Impianti Sportivi	6
2.2 Qualificazione e innovazione del patrimonio teatrale, musicale e artistico (ai sensi della L.R. 13/99)	7
2.3 Interventi di Edilizia Scolastica	7
2.4 Edilizia Universitaria	8
2.5 Patrimonio Culturale	9
2.6 Sintesi	10
3. Costo Realizzato al 31.12.2019 per singola Linea di azione	12
4. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2019 sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) IGRUE	12
5. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 28.02.2020 sul Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE (SNM)	14

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

(punto 2.b Delibera CIPE 25/2016 e punto A.1 Circolare 1/2017)

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

ID Codice Piano	2018POFSCMROM
Titolo del Piano	Piano Operativo territoriale
Delibera CIPE di assegnazione risorse	Del. Cipe n.76/2017
Amministrazione di Riferimento	Regione Emilia-Romagna

QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE

Con Delibera n.76 del 7 agosto 2017 il Cipe ha destinato alla Regione Emilia-Romagna, a completamento dei Programmi operativi ministeriali, risorse per 55 milioni di euro per l'attuazione di interventi strategici in materia di edilizia scolastica e universitaria, qualificazione di impianti sportivi, valorizzazione delle sedi di Spettacolo, dei beni e del Patrimonio culturale. Gli interventi individuati e approvati dalla suddetta Delibera Cipe costituiscono il Piano Operativo della Regione Emilia- Romagna.

In data 16 settembre 2017 è stato sottoscritto l' Accordo di Programma (in seguito Accordo) tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna¹ "Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della regione Emilia- Romagna". L'Accordo individua le Linee di Sviluppo strategiche ed i principali ambiti di intervento coerenti con le aree tematiche individuate per la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, così come definite nell'ambito della Delibera CIPE n. 25/2016.

Nell'Accordo sono ricompresi sia gli interventi afferenti al piano Operativo della Regione Emilia-Romagna (in seguito Piano) approvato con delibera Cipe n.76/2017 sia gli interventi dei Piani Operativi di competenza delle Amministrazioni Centrali (PO Infrastrutture approvato con delibera Cipe n.54/2016 e PO Ambiente approvato con delibera Cipe n.55/2016) e ancora gli interventi inseriti nel

Piano stralcio "Cultura e Turismo" (approvato con delibera Cipe n.3/2016), gli interventi relativi all'Accordo quadro per lo sviluppo della Banda Ultra Larga sul territorio nazionale ed infine gli interventi inseriti nell'Accordo per la mitigazione del rischio idrogeologico individuato con DPCM 15 settembre 2015.

DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE DEL PIANO

Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Piano (Autorità di Gestione del Piano)	Francesco Raphael Frieri Direttore Generale DG Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
Comitato di Indirizzo e controllo	Istituito
Organismo di Certificazione	DGR n.2143/2018
Si.Ge.Co	Approvato con Atto dirigenziale n. 23640 del 20/12/2019
Monitoraggio	Inserimento delle informazioni in BDU: avviato SI allineato con lo stato di attuazione SI

Con Delibera di Giunta regionale n.2143/2018 è stato designato l'Organismo di certificazione, autorità abilitata a richiedere i pagamenti FSC. L'organismo individuato è Agrea. Con lo stesso atto è stata individuata la Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa quale direzione competente nell'attuazione delle linee di azione del Piano e individuato infine il Comitato Fondi, già esistente, come sede e per attuare il raccordo ed il coordinamento di tutti i piani operativi finanziati con risorse FSC e ricompresi nell'accordo di programma. Allo stesso tempo si è preso atto della nomina

¹ Approvato con delibera di giunta regionale n. 1325 del 11/09/2017

del Rappresentante regionale unico per l'attuazione dell'Accordo (RUA) individuato nel Direttore Frieri, nomina avvenuta nella seduta del comitato di indirizzo e controllo tenutosi in data 13.04.2018.


A seguito di alcune modifiche riguardanti la sostituzione di un intervento più altre modifiche di tipo non sostanziale, proposte dalla Regione al Dipartimento per le politiche di coesione e da questi approvate, si è proceduto con il prendere atto del piano aggiornato.

Con Delibera di Giunta regionale n.1691/2019 è stato designato l'Organismo per l'esecuzione dei controlli in loco, individuato in ART-ER,

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

Il Si.Ge.Co. - redatto in conformità con le "Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014- 2020" del 4 maggio 2017 adottate dal Nucleo di Verifica e Controllo – Settore "Autorità di audit e verifiche" (di seguito, NUVEC SAV) – è stato definitivamente approvato con Atto dirigenziale n. 23640 del 20/12/2019 a seguito del rapporto definitivo della verifica preliminare di adeguatezza del Si.Ge.Co del Piano Operativo territoriale FSC 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna trasmesso dal NUVEC con nota prot. AICT 20410 del 17-12-20

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE FSC

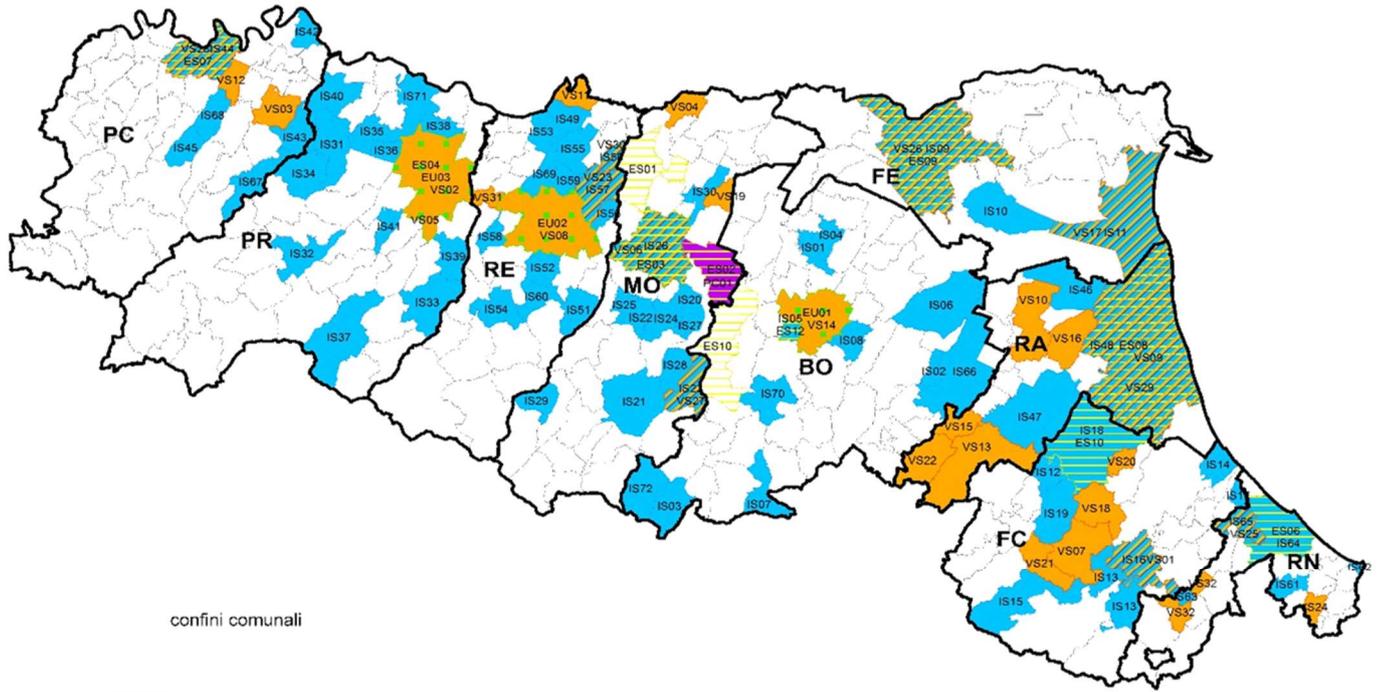

confini comunali

- IS - Impiantistica Sportiva (72 interventi)
- VS- Valorizzazione Spettacolo (32 interventi)
- ES - Edilizia Scolastica (12 interventi)
- EU - Edilizia Universitaria (3 interventi)
- PC - Patrimonio Culturale (1 intervento)
- Zone di sovrapposizione IS e VS

IS01	Comune Di Argelato	IS15	Comune Di Santa Sofia	IS29	Comune Di Montefiorino	IS43	Comune Di Alseno	IS57	Comune Di Correggio	IS71	Comune Di Sissa Trecasali	VS13	Unione Romagna Faentina	VS27	Comune Di Zocca	ES09	Provincia Di Ferrara
IS02	Comune Di Dozza	IS16	Comune Di Mercato Saraceno	IS30	Comune Di Bomperto	IS44	Comune Di Piacenza	IS58	Comune Di Bibbiano	IS72	Comune Di Lizzano In Belvedere	VS14	Fondazione Teatro Comunale Di Bologna	VS28	Comune Di Piacenza	ES10	Provincia Di Forli-Cesena
IS03	Comune Di Alto Reno Terme	IS17	Comune Di San Mauro Pascoli	IS31	Comune Di Fidenza	IS45	Comune Di Mercato Saraceno	IS59	Comune Di Bagnolo In Piano	VS01	Comune Di Mercato Saraceno	VS15	Comune Di Riolo Terme	VS29	Fondazione Ravenna Manifestazioni	ES11	Provincia Di Bologna
IS04	Comune Di San Giorgio Di Piano	IS18	Comune Di Forli'	IS32	Comune Di Solignano	IS46	Comune Di Parma	IS60	Comune Di Viano	VS02	Comune Di Parma	VS16	Comune Di Bagnacavallo	VS30	Comune Di Rio Saliceto	ES12	Provincia Di Bologna
IS05	Comune Di Casalecchio Di Reno	IS19	Comune Di Predappio	IS33	Comune Di Neviano Degli Arduini	IS47	Comune Di Fiorenzuola D'arda	IS61	Comune Di Montescudo - Monte Colombo	VS03	Comune Di Fiorenzuola D'arda	VS17	Comune Di Comacchio	VS31	Comune Di Sant'Ilario D'Enza	EU01	Provincia Di Bologna
IS06	Comune Di Medicina	IS20	Comune Di Spilamberto	IS34	Comune Di Salsomaggiore Terme	IS48	Comune Di Concordia Sulla Secchia	IS62	Comune Di Cattolica	VS04	Comune Di Concordia Sulla Secchia	VS18	Comune Di Meldola	VS32	Comune Di Novafeltria	EU02	Provincia Di Reggio Emilia
IS07	Comune Di Castiglione Dei Pepoli	IS21	Comune Di Pavullo Nel Frignano	IS35	Comune Di Fontanellato	IS49	Fondazione Teatro Regio Di Parma	IS63	Comune Di Talamello	VS05	Fondazione Teatro Regio Di Parma	VS19	Comune Di Ravarino	ES01	Provincia Di Modena	EU03	Provincia Di Parma
IS08	Comune Di San Lazzaro Di Savena	IS22	Comune Di Maranello	IS36	Comune Di Fontevivo	IS50	Comune Di Rio Saliceto	IS64	Comune Di Rimini	VS06	Comune Di Modena	VS20	Comune Di Forlimpopoli	ES02	Provincia Di Modena	PC01	Provincia Di Modena
IS09	Comune Di Ferrara	IS23	Comune Di Zocca	IS37	Comune Di Corniglio	IS51	Comune Di Castellarano	IS65	Comune Di Santarcangelo Di Romagna	VS07	Comune Di Civitella Di Romagna	VS21	Comune Di Galeata	ES03	Provincia Di Modena		
IS10	Comune Di Portomaggiore	IS24	Comune Di Castelvetro Di Modena	IS38	Comune Di Torrile	IS52	Comune Di Albinea	IS66	Comune Di Imola	VS08	Fondazione I Teatri Di Reggio Emilia	VS22	Comune Di Casola Valsenio	ES04	Provincia Di Reggio Emilia		
IS11	Comune Di Comacchio	IS25	Comune Di Fiorano Modenese	IS39	Comune Di Traversetolo	IS53	Comune Di Gualtieri	IS67	Comune Di Vernasca	VS09	Ravenna Teatro Soc. Coop.	VS23	A.T.E.R. Associazione e Teatrale Emilia-Romagna	ES05	Provincia Di Parma		
IS12	Comune Di Castrocaro Terme e Terra del Sole	IS26	Comune Di Modena	IS40	Comune Di Busseto	IS54	Comune Di Casina	IS68	Comune Di San Giorgio Piacentino	VS10	Comune Di Lugo	VS24	Comune Di Montefiore Conca	ES06	Provincia Di Rimini		
IS13	Comune Di Sarsina	IS27	Comune Di Vignola	IS41	Comune Di Sala Baganza	IS55	Comune Di Novellara	IS69	Comune Di Cadelbosco Di Sopra	VS11	Comune Di Luzzara	VS25	Associazione e "Santarangelo Dei Teatri" Rimini	ES07	Provincia Di Piacenza		
IS14	Comune Di Cesenatico	IS28	Comune Di Guiglia	IS42	Comune Di Castelvetro Piacentino	IS56	Comune Di San Martino In Rio	IS70	Comune Di Marzabotto	VS12	Comune Di Pontenure	VS26	Comune Di Ferrara	ES08	Provincia Di Ravenna		

1. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2019 sul Sistema Gestione Progetti (SGP)

Il caricamento dei progetti in SGP è stato avviato all'inizio del 2019.


Il primo inserimento dei dati nel sistema di gestione ha riguardato i progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio **Impiantistico Sportivo (ERIS)**, tale linea d'azione ha finanziato con risorse FSC² pari a 20M€, **72 progetti**, nel mese di marzo 2019 è avvenuta la prima validazione in Banca dati Unitaria (BDU) di IGRUE. Nello stesso periodo si è proceduto altresì al caricamento dei progetti relativi agli interventi di **Valorizzazione e Spettacolo (ERVS)**, tale linea ha finanziato con risorse FSC pari a 5M€, **32 progetti**, i dati comunicati dai beneficiari al 30 aprile e sono stati validati nel maggio 2019 nella Banca dati Unitaria (BDU) di IGRUE. Successivamente si è proceduto con il caricamento dei progetti di **Edilizia Scolastica (ERES)**, linea che ha finanziato con risorse FSC pari a 20M€, **12 progetti**, i dati comunicati dai beneficiari al 30 giugno, sono stati validati nel luglio 2019 in Banca dati Unitaria (BDU) di IGRUE. Nello stesso mese di luglio, si è proceduto con il caricamento dei progetti di **Edilizia Universitaria (EREU)** e **Patrimonio Culturale (ERPC)**, con tali linee di azione sono stati finanziati rispettivamente, con risorse FSC, **3 progetti** per Edilizia Universitaria pari a 7M€ e **1 progetto** per patrimonio culturale pari a 3M€. La prima validazione nella Banca dati Unitaria (BDU) di IGRUE, dei dati comunicati dai beneficiari al 31 agosto, per i progetti a valere su queste linee di azione è avvenuta nel settembre 2019.

Al 31.12.2019 tutti i **120 progetti finanziati con risorse FSC** sono stati inseriti in SGP (vedesi *Figura 1*), di questi 120 progetti, alla stessa data del 31.12, sono 81 i progetti monitorati (vedesi *Figura 2*), in dettaglio i progetti, sono: 51 di Impiantistica Sportiva, 15 di Valorizzazione e Spettacolo, 11 di Edilizia Scolastica, 3 di Edilizia Universitaria e 1 per il Patrimonio Culturale.

(Per progetti monitorati si fa riferimento agli interventi che hanno comunicato il set minimo di dati utili alla validazione in BDU e che hanno inviato l'aggiornamento dei dati ad ogni bimestre di monitoraggio³).


La Regione Emilia-Romagna al 31.12.2019 ha impegnato risorse per 43,2 M€ pari a circa l'80 del totale dei finanziamenti FSC (55M€) assegnati con la delibera Cipe n.76/2017.

Figura 1 - Dati caricati in SGP AL 31.12.2019

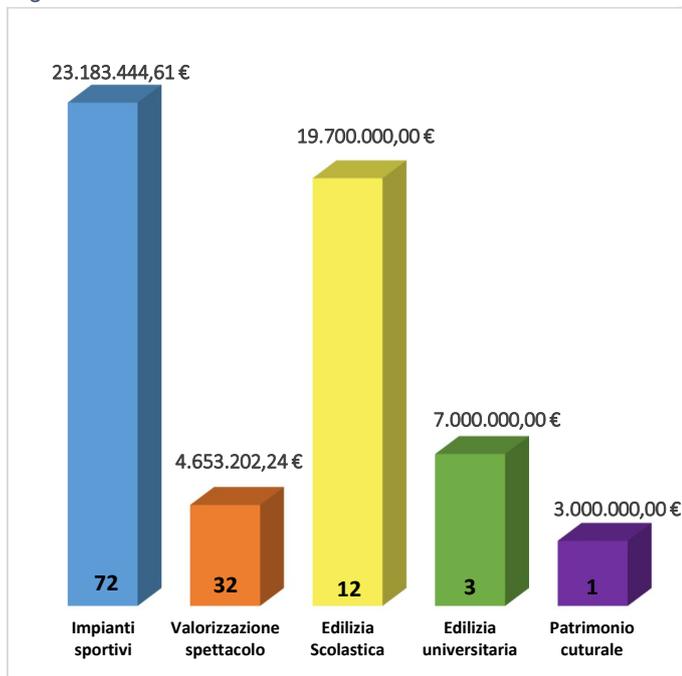

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)

Figura 2 - Progetti monitorati su SGP al 31.12.2019

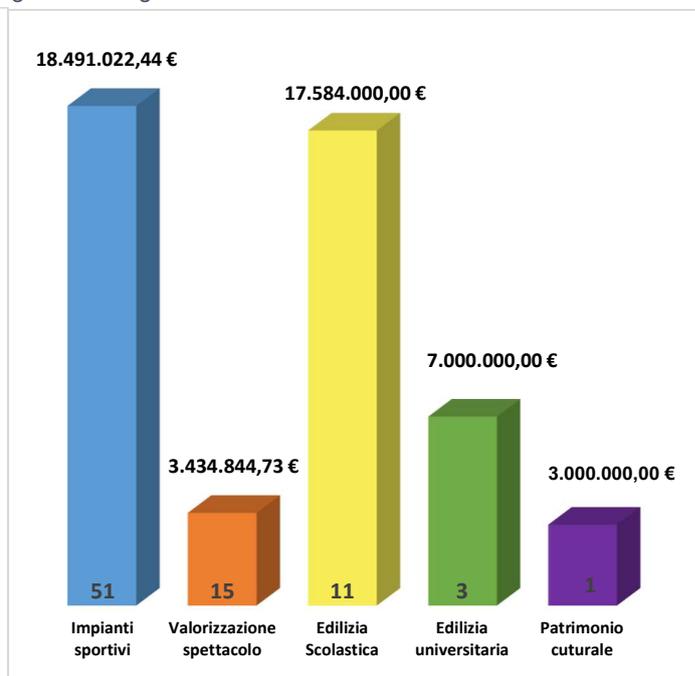

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)

² Con delibera Cipe 76/2017 sono stati finanziati tutte e 5 le linee di azione (Impianti Sportivi, Valorizzazione Spettacolo, Edilizia Scolastica, Edilizia Universitaria, Patrimonio Culturale) per una dotazione finanziaria complessiva di 55M€.

³ Circolare n.10 del 28 febbraio 2017 del ministero dell'economia e delle finanze

2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER SINGOLA LINEA D'AZIONE AL 31.12.2019

L'attuazione e la gestione degli interventi afferenti alle diverse linee di azione del Piano è stata svolta dalla Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa attraverso i Servizi competenti in materia, in qualità di referenti responsabili per l'attuazione e gestione delle linee di azione individuate.

2.1 Qualificazione Impianti Sportivi

La Giunta regionale ha finalizzato l'utilizzo delle risorse FSC, pari a euro 20.000.000,00, alla riqualificazione del patrimonio dell'impiantistica sportiva regionale. L'obiettivo è stato perseguito con l'approvazione del bando di cui alla DGR n. 1944/2017 riguardante la presentazione da parte degli enti locali di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale. Con determina n. 14613/2018 sono state impegnate le risorse per finanziare un totale di 88 progetti, di cui 65 finanziati con risorse FSC a partire dal 2019. Con successiva DGR 1630/2018 sono state impegnate ulteriori risorse FSC a partire dal 2019 per ulteriori 6 progetti, su un totale di 9 finanziati. Con DGR 381/2019 si è poi provveduto ad impegnare ulteriori risorse per 35 progetti, di cui 1 progetto finanziato parzialmente con risorse FSC e con assegnazione a partire dal 2020. Successivamente con DGR 658/2019 sono stati impegnate ulteriori risorse per 9 progetti sui quali non è prevista l'assegnazione di risorse FSC.

Complessivamente sono stati finanziati 141 progetti di cui 72 a valere su risorse FSC.

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Impianti sportivi

Impianti Sportivi				
Interventi monitorati	Contributo FSC*	Altre fonti di finanziamento	Impegni	Pagamenti
51	18.491.022,44 €	59.406.156,03 €	20.541.065,81 €	9.276.548,05 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

* sono ricompresi nel dato anche le risorse regionali

Al 31.12.2019 su SGP dei 72 progetti finanziati dal FSC per gli Impianti Sportivi (51) sono stati monitorati e inviati alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 20.541.065,81 €, mentre i pagamenti sono pari a 9.276.548,05 €.

Tabella 2 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Impianti Sportivi

Iter Procedurale	N. di interventi	FSC*
Studio di fattibilità	11	1.306.997,57 €
Progettazione Preliminare	4	1.309.100,00 €
Progettazione Definitiva	3	680.000,00 €
Progettazione Esecutiva	14	7.703.514,59 €
Definizione e stipula contratto	1	88.000,00 €
Esecuzione Lavori	33	10.278.588,78 €
Funzionalità	6	1.817.243,67 €
	72	23.183.444,61 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

* sono ricompresi nel dato anche le risorse regionali

Con riferimento all'iter procedurale 6 progetti sono nella fase conclusiva dell'intervento e hanno terminato i lavori, 33 sono nella fase di esecuzione dei lavori, 1 definizione e stipula contratto 14 nella progettazione esecutiva. Mentre un minore numero di progetti sono nelle fasi iniziali della progettazione.

2.2 Qualificazione e innovazione del patrimonio teatrale, musicale e artistico (ai sensi della L.R. 13/99)

Le risorse FSC previste per questa linea di azione ammontano a 5 milioni di euro. Con DRG 500/2018 è stato predisposto l'avviso; con DGR 1575/2018 l'approvazione della graduatoria e la quantificazione contributi. Il provvedimento prevede l'ammissione a contributo di 35 progetti di cui 32 vengono finanziati con risorse FSC, mentre 3 solo con risorse regionali. Con Determina Dirigenziale 20379/2018 si è predisposta l'assegnazione e concessione di tutti i contributi ma con impegno di risorse solo per l'anno 2018 e solo delle risorse regionali. Con successiva Determina Dirigenziale 4562/2019 si è provveduto all'impegno di spesa per gli anni 2019-20-21 dei contributi già concessi (risorse FSC). Per quanto alla fase di attuazione dei progetti la definizione temporale nell'allocatione delle risorse programmata rispettivamente nel 2019 per la linea delle sedi dello spettacolo e nel 2021 per la valorizzazione del patrimonio culturale fanno sì che i progetti siano attualmente per lo più in fase di progettazione preliminare e /o esecutiva. Sette progetti sono in fase di esecuzione lavori.

Tabella 3 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Valorizzazione e Spettacolo

Valorizzazione e Spettacolo					
Interventi monitorati	Contributo FSC	Regione	Altre fonti di finanziamento	Impegni	Pagamenti
15	3.434.844,73 €	794.609,98 €	4.237.574,99 €	2.909.134,16 €	1.215.922,36 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

* sono ricompresi nel dato anche le risorse regionali

Al 31.12.2019 su SGP dei 32 progetti finanziati dal FSC per la Valorizzazione e lo Spettacolo (15) sono stati monitorati e inviati alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 2.909.134,16 €, mentre i pagamenti sono pari a 1.215.922,36 €.

Tabella 4 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Valorizzazione e spettacolo

Iter Procedurale	N. di interventi	FSC
Studio di fattibilità	6	388.216,56 €
Progettazione Preliminare	1	65.000,00 €
Progettazione Definitiva	1	500.000,00 €
Progettazione Esecutiva	8	1.927.055,40 €
Definizione e stipula contratto	1	66.729,10 €
Esecuzione Lavori	11	1.562.763,80 €
Funzionalità	4	143.437,38 €
	32	4.653.202,24 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

Con riferimento all'iter procedurale 6 progetti sono nella fase conclusiva dell'intervento e hanno terminato i lavori, 33 sono nella fase di esecuzione dei lavori, 1 definizione e stipula contratto 14 nella progettazione esecutiva. Mentre un minore numero di progetti sono nelle fasi iniziali della progettazione.

2.3 Interventi di Edilizia Scolastica

Con le Deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n.64/2016 e 100/2016 si definiscono i criteri e le modalità di presentazione delle programmazioni provinciali, individuando per ciascuna Provincia/Città metropolitana la quota di risorse spettanti sui 20 milioni di fondi FSC. Con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 382/2019 viene approvato il piano regionale di edilizia scolastica e di assegnazione risorse FSC e con successiva Determinazione dirigenziale n. 6510/2019 si provvede alla concessione dei contributi e impegno delle risorse. Gli interventi ammessi riguardano la qualificazione del sistema scolastico regionale con riferimento alle scuole secondarie di II grado; in particolare si tratta di 12 progetti dislocati sul territorio regionale per lo più interessati da progetti di

ampliamento/ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti, in alcuni casi di costruzione di nuovi edifici per apertura nuova sede, ed in altri si provvede all'adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Si segnala in particolare che per quanto ai progetti candidati dalle Province/Città Metropolitana di Bologna questi sono finalizzati:

- 1) al soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente all'aumento della popolazione scolastica;
- 2) all'adeguamento degli edifici alle nuove esigenze della scuola e ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;
- 3) alla razionalizzazione distributiva della rete scolastica sul territorio.

Tabella 5 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Edilizia Scolastica

Edilizia Scolastica				
Interventi monitorati	Contributo FSC	Altre fonti di finanziamento	Impegni	Pagamenti
11	17.584.000,00 €	2.966.000,00 €	4.001.531,53 €	1.990.137,63 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

* sono ricompresi nel dato anche le risorse Provinciali

Al 31.12.2019 su SGP dei 12 progetti finanziati dal FSC per l'Edilizia Scolastica (11) sono stati monitorati e inviati alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 4.001.531,53 €, mentre i pagamenti sono pari a 1.990.137,63 €

Tabella 6 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Edilizia Scolastica

Iter Procedurale	N. di interventi	FSC
Studio di fattibilità	0	
Progettazione Preliminare	1	2.116.000,00 €
Progettazione Definitiva	4	6.644.000,00 €
Progettazione Esecutiva	1	1.670.000,00 €
Definizione e stipula contratto	0	
Esecuzione Lavori	6	9.270.000,00 €
Funzionalità	0	
	12	19.700.000,00 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

Per quanto riguarda l'iter procedurale 6 progetti sono nella fase di esecuzione dei lavori, 1 nella progettazione esecutiva. Mentre un minore numero di progetti sono nelle fasi iniziali della progettazione.

2.4 Edilizia Universitaria

Le deliberazioni dell'Assemblea Legislativa regionale nn. 39/2015 e 211/2019 che, in attuazione della L.R n. 15/2007, approvano il Piano regionale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione rispettivamente per il triennio 2016-2018 e 2019-2021 identificano nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali per attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale al fine di realizzare il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi che accompagnano i piani delle Università.

Complessivamente i progetti in questo ambito sono tre. Ai fini della candidatura al bando statale del 2017 ex L. 338/2000, la Regione con DGR 524/2017 ha previsto l'assegnazione di risorse FSC pari a sette milioni di euro. I progetti (San Francesco a Parma, Villa Marchi a Reggio Emilia e Lazzaretto a Bologna, riguardano la realizzazione di nuove costruzioni e interventi di restauro conservativo e recupero di immobili da destinare a strutture residenziali per studenti universitari, al fine di promuovere la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture che garantiscono il diritto allo studio universitario e favorire l'attrattività del sistema universitario regionale. Attualmente, a seguito dell'ammissione al cofinanziamento statale ai sensi della Legge 338/2000 – D.M.

12/12/2018 GU 75 del 29/03/19, sono in fase di predisposizione gli atti regionali necessari a ridefinire il concorso finanziario regionale e gli Accordi sottoscritti con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi (Università e Azienda regionale per il diritto agli studi superiori) nonché ad assegnare le risorse FSC pari a 7 milioni di euro indicate nella DGR 524/2017 per la realizzazione degli interventi.

Tabella 7 Avanzamento Finanziario al 31.12.2019 Edilizia Universitaria

Edilizia Universitaria					
Interventi monitorati	contributo FSC	Regione	Altre fonti di finanziamento	Impegni	Pagamenti
3	7.000.000,00 €	1.000.000,00 €	34.434.331,00 €	336.219,13 €	67.039,20 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

Al 31.12.2019 su SGP tutti i progetti dei sono stati monitorati e inviati alla Banca Dati Unitaria IGRUE. Alla stessa data gli impegni degli interventi ammontano a 336.219,13 € mentre i pagamenti sono pari a 67.039,20 €.

Tabella 8 Avanzamento procedurale al 31.12.2019 Edilizia Universitaria

Iter Procedurale	N. di interventi	FSC
Studio di fattibilità		
Progettazione Preliminare		
Progettazione Definitiva	1	2.317.000,00 €
Progettazione Esecutiva	2	4.683.000,00 €
Definizione e stipula contratto		
Esecuzione Lavori		
Funzionalità		
	3	7.000.000,00 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

Con riguardo all'iter procedurale (2) progetti sono nella fase progettazione esecutiva. Mentre (1) nella fase di progettazione definitiva.

2.5 Patrimonio Culturale

Le risorse FSC per la linea di azione ammontano a 3 milioni di euro. Con DRG 35/2019 è stato predisposto l'invito., l'approvazione dei criteri e le modalità di attuazione. Con successiva DGR 463/2019 è stata operata l'approvazione dei progetti ammessi a contributo e la quantificazione degli stessi (ammessi a contributo 2 progetti di cui 1 progetto viene finanziato con risorse FSC e l'altro con risorse regionali). L'assegnazione e concessione delle risorse ai progetti ammessi è in corso di definizione. Le risorse FSC destinate alla valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale sono state allocate nel 2021 e 2022, pertanto i progetti risultano in fase di progettazione preliminare

Tabella 9 Avanzamento finanziario al 31.12.2019 Patrimonio Culturale

Patrimonio Culturale					
Interventi monitorati	Contributo FSC	Regione	Altre fonti di finanziamento	Impegni	pagamenti
1	3.000.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Al 31.12.2019 su SGP il progetto finanziato sulla linea di azione del Patrimonio Culturale è stato monitorato e inviato alla Banca Dati Unitaria IGRUE.

Iter Procedurale	N. di interventi	FSC
Studio di fattibilità	1	3.000.000,00 €
Progettazione Preliminare		
Progettazione Definitiva		
Progettazione Esecutiva		
Definizione e stipula contratto		
Esecuzione Lavori		
Funzionalità		
	1	3.000.000,00 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

Con riguardo all'iter procedurale il progetto è in fase di progettazione.

2.6 Sintesi avanzamento procedurale

In sintesi, al 31.12.2019 su un totale di 81 progetti monitorati le risorse impegnate sono 27.787.950,63 € mentre i pagamenti sono pari a 12.549.647,24 € (Figura 2).

Per quanto riguarda l'iter procedurale, il numero maggiore di progetti si concentra nella fase di esecuzione lavori con 50 progetti con un valore di 21.111.352,58 €, in fase di progettazione esecutiva abbiamo 25 progetti per un valore pari a 15.983.569,99 €. Nella fase conclusiva della Funzionalità abbiamo invece 10 progetti per un valore che ammonta a 1.960.681,05.

Figura 1 Valore progetti monitorati al 31.12.2019



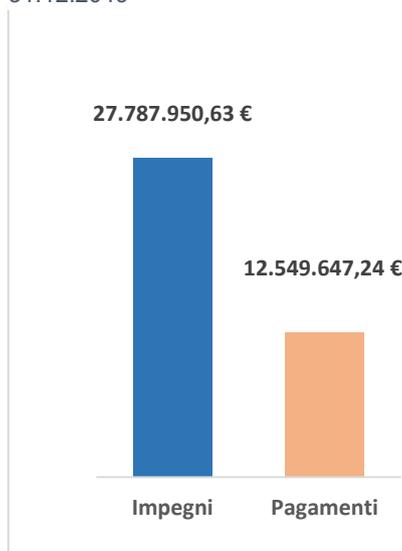


Figura 4 Valore progetto per fase procedurale

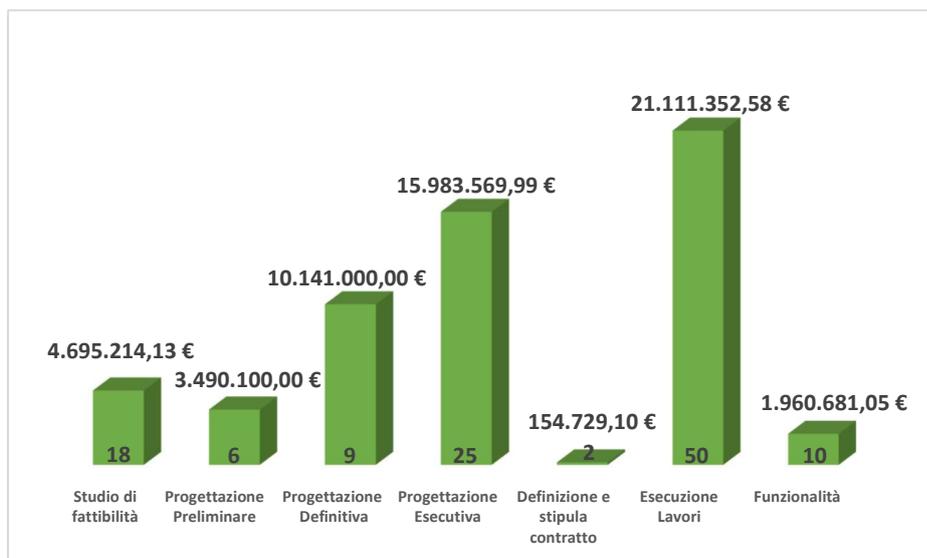

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019

Distribuzione territoriale FSC per Linea di Azione

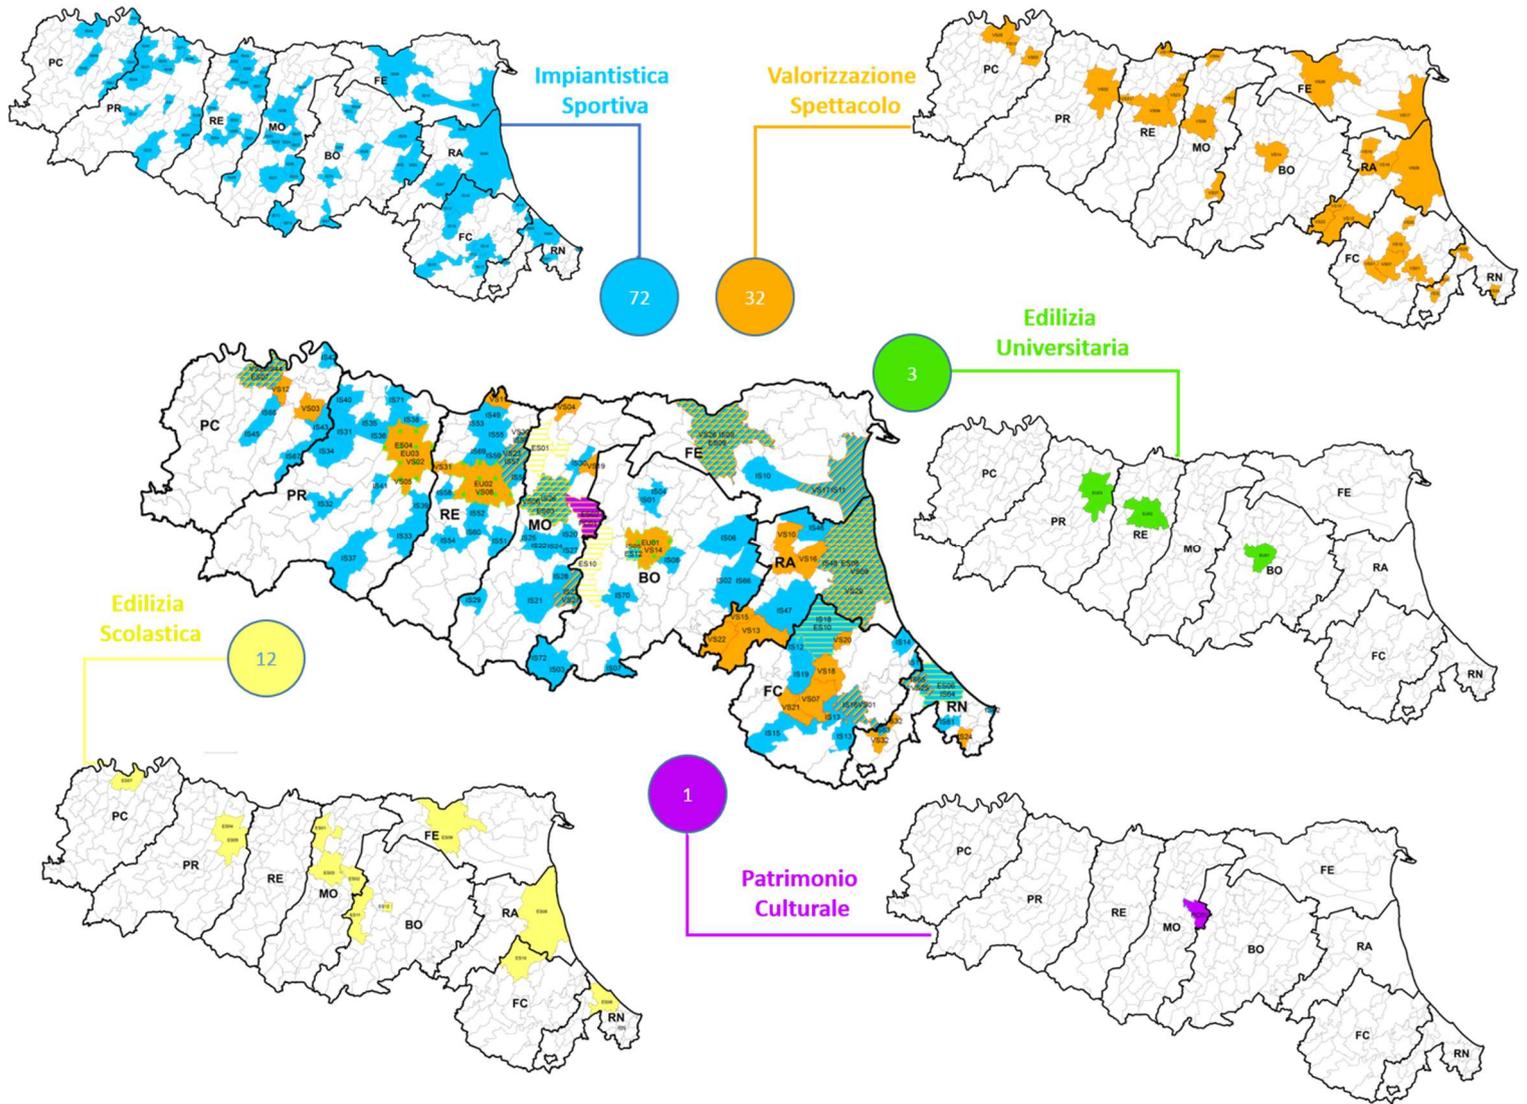


3. Costo Realizzato al 31.12.2019 per singola Linea di azione

AL 31.12.2019 il costo realizzato complessivo dei 5 ambiti di intervento è pari a 12.549.647,25 €.

In questo caso il costo realizzato comprende anche somme delle altre fonti di finanziamento e non quindi solo quelli specifici dell'FSC.

Gli interventi che hanno un costo realizzato maggiore sono quelli riguardano gli Impianti Sportivi con 9.276.548,05 €, seguire l'Edilizia Scolastica con 1.990.137,63 €, Valorizzazione e Spettacolo 1.215.922,36 € e in fine l'Edilizia Universitaria con 67.039,20 € (figura 5).

Figura 5 Costo realizzato al 31.12.2019

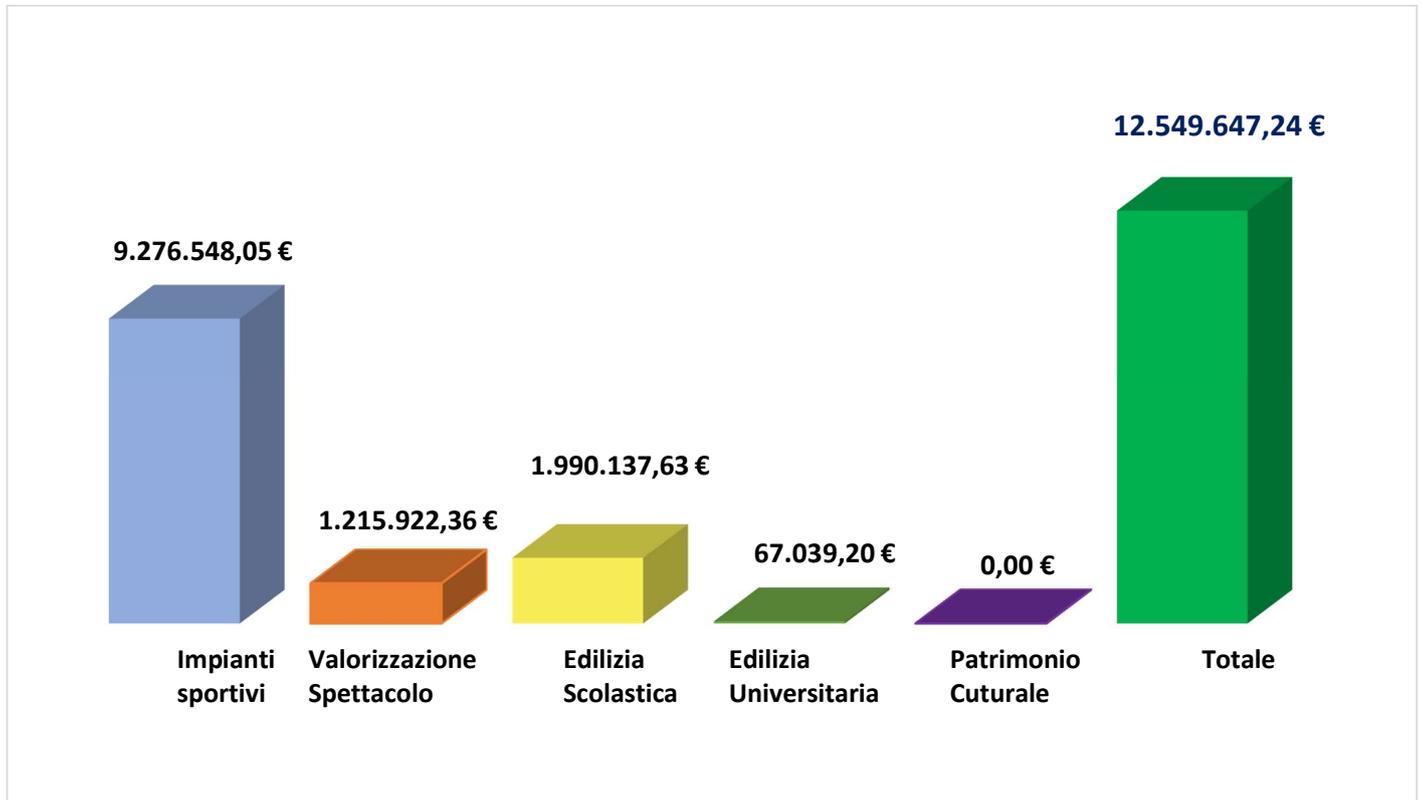

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 31.12.2019


4. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2019 sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) IGRUE

Al 31.12.2019 su SGP sono stati monitorati e inviati alla banca dati unitaria di IGRUE **81 progetti** di questi 53 per la linea di azione impianti sportivi, 15 su Valorizzazione e spettacolo, 11 su Edilizia Scolastica, 3 Edilizia Universitaria, 1 Patrimonio culturale (*Figura 6*).

Per i dati FSC relativi al 31/12/2019, non è stato possibile procedere con la validazione entro la scadenza prevista del 23 febbraio 2020 per problemi legati al sistema di colloquio tra il sistema di monitoraggio SGP (sistema gestione progetti) e il portale IGRUE. Per questa ragione un BDU al 31.12.2019 sono presenti **57 progetti** di questi 27 sulla linea di azione Impianti Sportivi, 17 valorizzazione e spettacolo, 10 Edilizia Scolastica, Edilizia Universitaria, 1 Patrimonio Culturale (*Figura 7*). Le ragioni di questa differenza tra i dati in SGP e IGRUE e dovuta principalmente a due ragioni:


- 1) alla scadenza del 31 dicembre 2019 a causa di problemi tecnici dovuti al continuo 'reset' dell'utenza di accesso a IGRUE non è stato possibile validare i progetti in BDU;
- 2) a causa di dati "sporchi" il sistema IGRUE non è riuscito ad acquisire i dati inviati da SGP. Il problema riguarda la lettura dei Txt di invio da SGP a IGRUE. Per risolvere questo problema abbiamo proceduto con la pulizia dei dati effettuata da "progetto monitoraggio" assistenza tecnica dell'Agencia per la Coesione Territoriale.

Figura 6 Progetti monitorati su SGP al 31.12.2019

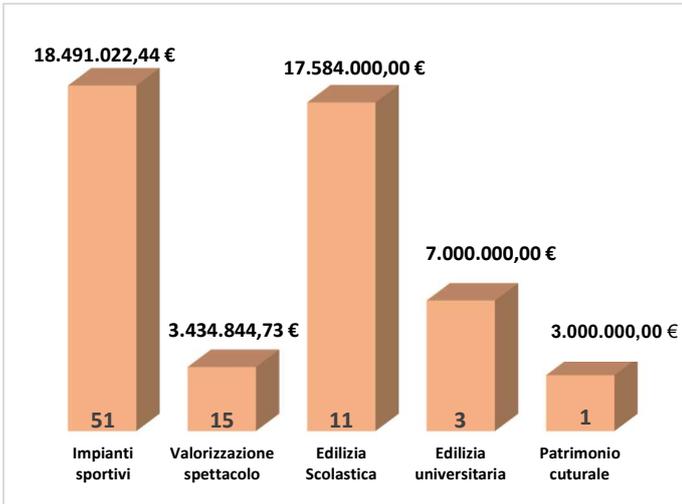

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)

Figura 7 Progetti monitorati su SAD al 31.12.2019

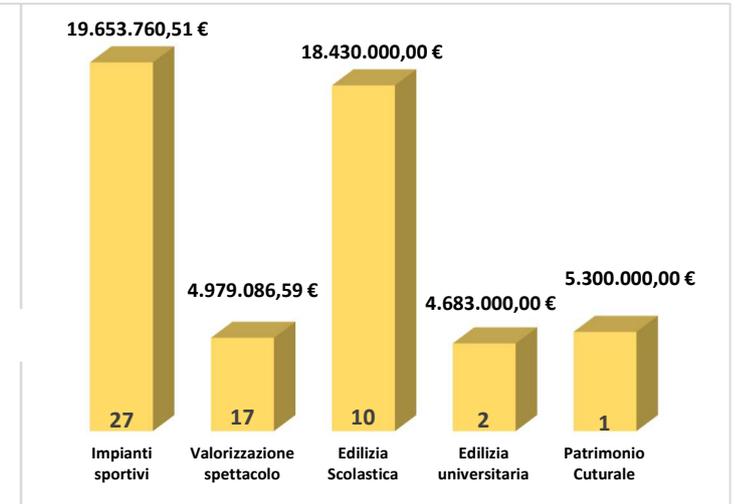


Fonte: Sistema Analisi Dati (SAD) IGRUE

Al 31/12 le risorse FSC monitorate su IGRUE sono pari a 53.194.070,73€ mentre in SGP ammontano a 49.509.867,17€ (Figura 8).

La differenza tra le risorse FSC presenti in BDU e quelle in SGP è data dal fatto che in BDU sono presenti risorse regionali, tranne che per Edilizia scolastica che dispone di risorse provinciali.


La presenza di risorse regionali è dovuta ad una errata comunicazione dei dati da parte dei beneficiari. Da specificare che questo dato è stato corretto in SGP come si evince dalla figura 6.

Figura 8 Risorse monitorate al 31.12.2019

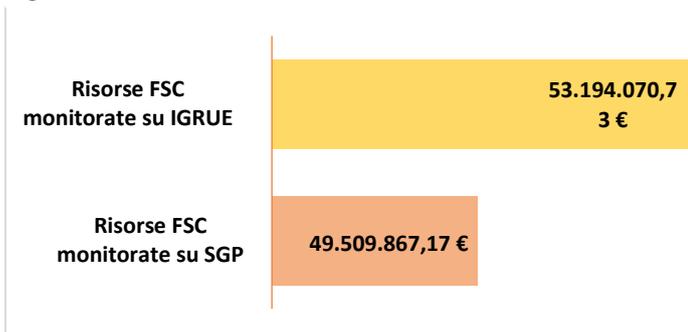

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e Sistema Analisi Dati (SAD) IGRUE

Figura 9 Progetti monitorati al 31.12.2019

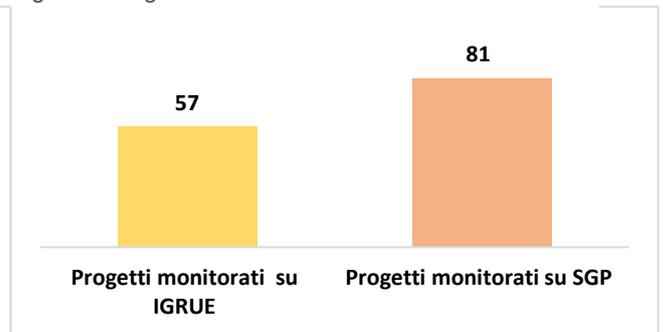

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e SAD IGRUE

Il disallineamento dei dati è legato a problemi tecnici tra il colloquio dei dati tra SGP e IGRUE.

Infatti, anche se i dati sono stati allineati in SGP e inviati a IGRUE, il sistema non ha recepito le modifiche con il conseguente disallineamento dei dati.

La soluzione individuata per sistemare i dati è stata quella di richiedere a IGRUE un file txt per ripulire i cd. da sporchi e che impediscono l'aggiornamento dei dati.


Inoltre, il mancato aggiornamento dei dati ha comportato anche una presenza minore di progetti in BDU (57) rispetto a quelli monitorati in SGP (81) figura 9.

5. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 28.02.2020 sul Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE (SNM)

Al 28.02.2020 su SGP sono stati monitorati e inviati alla banca dati unitaria di IGRUE **111 progetti** di cui 64 sulla linea d'azione Impianti Sportivi, 31 su Valorizzazione e Spettacolo, 3 Edilizia Universitaria, 1 patrimonio Culturale (Figura 10).


Alla stessa data su IGRUE sono invece presenti **91 progetti** di cui 48 sulla linea d'azione impianti sportivi, 28 Valorizzazione e Spettacolo, 11 Edilizia Scolastica., 3 Edilizia Universitaria, 1 Patrimonio Culturale (figura 11).

Figura 10 Progetti monitorati su SGP al 28.02.2020

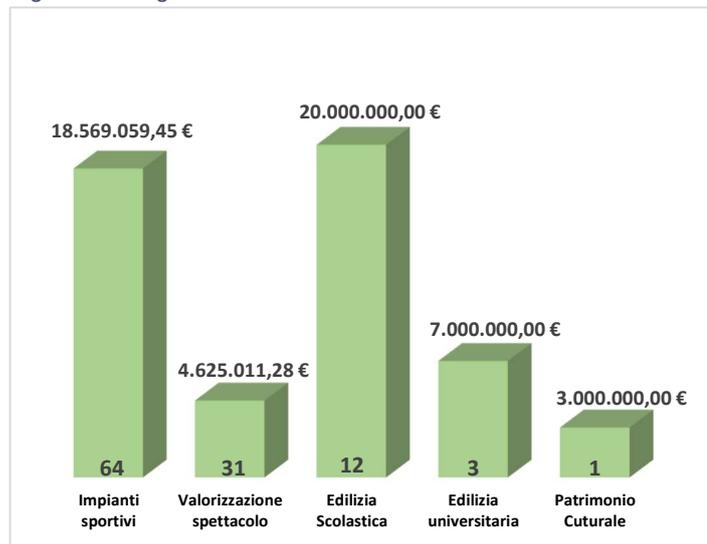


Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP)

Figura 11 Progetti monitorati su SAD al 28.02.2020

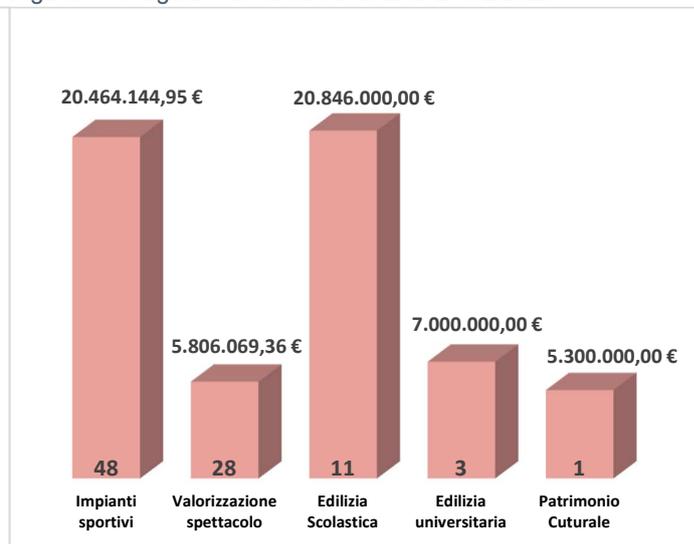


Fonte: Sistema Analisi Dati (SAD) IGRUE

Figura 12 Risorse monitorate al 28.02.2020

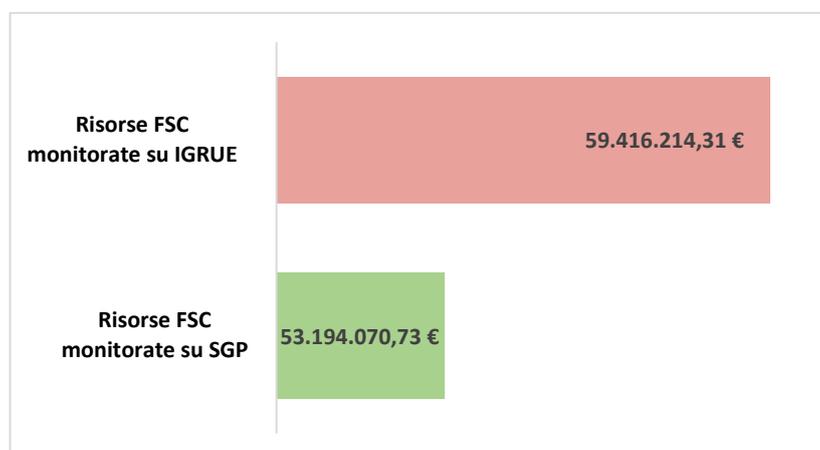

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e Sistema Analisi Dati (SAD) IGRUE

Figura 13 Progetti monitorati al 28.02.2020

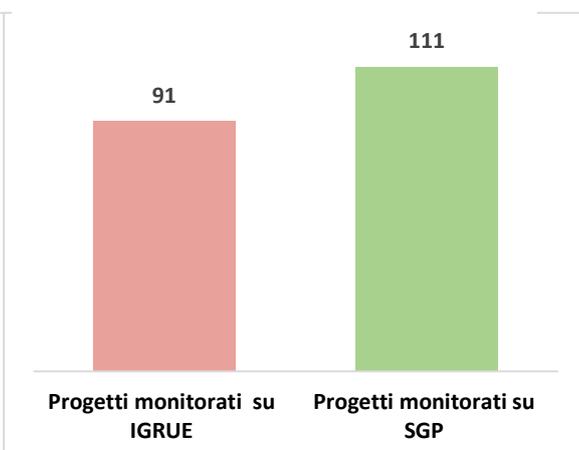

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e SAD IGRUE

Per quanto riguarda le risorse FSC monitorate su IGRUE al 28 febbraio come notiamo dalla figura 12 erano pari a 59.416.214,31€ e quindi superiore alla dotazione finanziaria concessa con delibera Cipe 76/2017 pari 55.000.000,00€ mentre su SGP erano paria a 53.194.070,73. Il disallineamento dei dati come spiegato nel paragrafo precedente è dovuto alla presenza di quote regionali che erroneamente sono state inserite dai beneficiari degli interventi come quote FSC, ma poi tempestivamente modificate nel sistema di monitoraggio SGP. A seguito della modifica dei dati in SGP e dell'invio a IGRUE a causa di problemi tecnici l'aggiornamento non è ancora stato riportato in IGRUE. Il problema di colloquio e di aggiornamento dei dati tra i sistemi ha portato anche ad avere anche un numero di progetti minore nella banca dati unitaria (91) mentre in SGP alla stessa data ne sono stati monitorati 111 (figura 13).
