

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia-Romagna
(delibera Cipess n. 22/2021)


**Report sullo STATO DI ATTUAZIONE dell'ex PIANO OPERATIVO FSC 2014-
2020 (Delibera CIPE n.76/2017)**

Dati di monitoraggio al 30 aprile 2022

DIEZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE, ISTITUZIONI

Sintesi avanzamento procedurale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP)

Figura 1 Valore interventi e numero dei progetti distinti per fase procedurale del PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

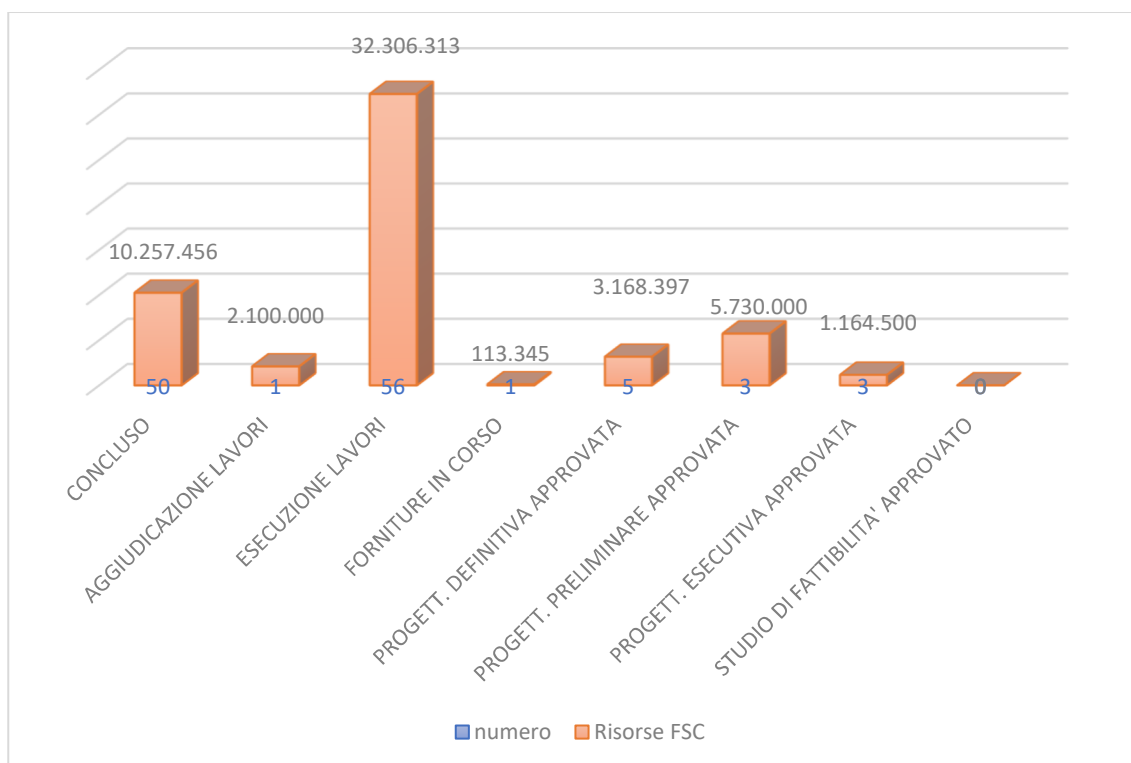

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 30.04.2022

Per quanto riguarda l'iter procedurale (Figura 1), il numero maggiore di interventi si concentra nella fase di esecuzione lavori con 56 interventi per un valore di 32.306.313 €; solo 1 intervento è in fase di definizione e stipula contratto. Nessuno è alla fase dello studio di fattibilità. Infine, sono stati conclusi i lavori per 50 interventi per un valore che ammonta a 10.257.456,00 €.

Sintesi avanzamento finanziario totale dal sistema informativo di monitoraggio (SGP):

Tabella 1 Avanzamento finanziario al 30.04.2022 Totali per il PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

Linea d'azione	Risorse totali	Risorse FSC (post CDS 15- 10-2021)	Impegni totali	Pagamenti totali
Impianti Sportivi	89.327.150,94 €	19.965.000,00 €	72.092.733,93 €	38.626.107,04 €
Valorizzazione e Spettacolo	13.229.569,61 €	4.875.011,27 €	8.391.929,99 €	6.432.987,00 €
Edilizia Scolastica	24.751.946,12 €	20.000.000,00 €	12.313.256,84€	7.427.987,66 €
Edilizia Universitaria	42.434.331,00 €	7.000.000,00 €	1.402.425,20 €	945.703,11 €
Patrimonio Culturale	5.300.000,00 €	3.000.000,00 €	230.122,26 €	35.228,31 €
Assistenza tecnica	-	159.988,71 €	-	-
TOTALI	€ 174.972.178,40	55.000.000,00 €	94.430.468,22 €	53.468.013,12 €

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) versione 30.04.2022, tranne per l'intervento di Assistenza tecnica

Sintesi avanzamento finanziario FSC: dati trasmessi alla banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente al FSC

Tabella 2 Avanzamento finanziario al 30.04.2022 Totali Banca Dati Unitaria per il PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020

Linea d'azione	Impegni FSC	Pagamenti FSC
Impianti Sportivi	10.275.890,08 €	8.380.359,30 €
Valorizzazione e Spettacolo	3.428.985,63 €	3.044.932,90 €
Edilizia Scolastica	10.353.410,87 €	7.002.671,49 €
Edilizia Universitaria	1.402.425,20 €	945.703,11 €
Patrimonio Culturale	230.122,26 €	35.228,00 €
Assistenza tecnica	0 €	0 €
totali	25.690.834,04 €	19.408.895,11 €

Fonte: Sistema Analisi Dati (SGP) versione 30.04.2022 tranne per l'intervento di Assistenza tecnica
