



Relazione di Avanzamento Annuale

- anno di riferimento 2022 -

**Accordo di Programma Quadro
Area Interna
Appennino Emiliano**

**Accordo di Programma Quadro
Area Interna
Basso Ferrarese**

**Accordo di Programma Quadro
Area Interna
Appennino Piacentino-Parmense**

**Accordo di Programma Quadro
Area Interna
Alta Valmarecchia**

Regione Emilia-Romagna

Giugno 2023

Sommario

PREMESSA.....	3
1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI APQ SNAI - PANORAMICA GENERALE.....	5
1.1 Avanzamento finanziario	6
1.2 Stato di attuazione degli interventi	8
1.3 Conclusioni	10
2 APQ APPENNINO EMILIANO	11
2.1 Inquadramento giuridico APQ	11
2.2 Avanzamento finanziario	11
2.3 Stato di attuazione degli interventi	12
2.4 Tabelle esplicative degli interventi	14
2.5 Esperienze e buone pratiche dal territorio.....	17
3 APQ APPENNINO PIACENTINO PARMENSE	18
3.1 Inquadramento giuridico APQ	18
3.2 Avanzamento finanziario	18
3.3 Stato di attuazione degli interventi	20
3.4 Tabelle esplicative degli interventi	21
3.5 Esperienze e buone pratiche dal territorio.....	28
4 APQ BASSO FERRARESE	30
4.1 Inquadramento giuridico APQ	30
4.2 Avanzamento finanziario	30
4.3 Stato di attuazione degli interventi	32
4.4 Tabelle esplicative degli interventi	33
4.5 Esperienze e buone pratiche dal territorio.....	36
5 APQ ALTA VALMARECCHIA.....	38
5.1 Inquadramento giuridico APQ.....	38
5.2 Avanzamento finanziario	38
5.3 Stato di attuazione degli interventi	40
5.4 Tabelle esplicative degli interventi	41
5.5 Esperienze e buone pratiche dal territorio.....	46

PREMESSA

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta una politica territoriale lanciata dal Governo nel ciclo 2014-2020 per contrastare il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese. Aggregati di comuni classificati aree interne promuovono una propria Strategia di sviluppo territoriale basata su un approccio *placed based* e articolata in due classi di intervento: lo sviluppo locale produttivo e il potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), cd servizi di cittadinanza.

La Strategia Nazionale Aree Interne in Regione Emilia-Romagna si è sviluppata coerentemente con la cornice programmatica definita nell'Accordo di Partenariato, che è stata avviata nel 2012 e successivamente adottata dal Programma Nazionale di Riforma deliberato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile 2014.

La Strategia nazionale è disciplinata dalle Delibere CIPE n. 9 del 2015, n. 43 del 2016, n. 80 del 2017, n. 52 del 2018 e n. 72 del 2019 – in attuazione delle indicazioni contenute nell'Accordo di Partenariato per l'Italia 2014-2020 (sezioni 1 e 3) – ed è finanziata con risorse a carico del Fondo di rotazione ex Legge n. 183/1987 attraverso le leggi di bilancio che si sono succedute.

La SNAI è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali, attribuite dalle Leggi di stabilità 2014, 2015, 2016 e dalla Legge di bilancio per il 2018.

La parola chiave di questa nuova sfida è stata “complessità” intesa come il numero di elementi e soggetti interagenti; si sono pertanto sviluppate nuove modalità di governance locale multilivello, volte ad affrontare, attraverso un approccio integrato, le sfide della marginalizzazione e dello spopolamento delle aree interne del nostro Paese.

Il processo di selezione delle aree interne è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, alla quale hanno partecipato tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne, la Regione interessata e gli attori della singola area interna. La governance è affidata al Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Regione Emilia-Romagna con la Delibera di Giunta n. 473 del 04 aprile 2016 ha assunto le proprie determinazioni sulla Strategia per le Aree Interne, procedendo alla formulazione della perimetrazione definitiva delle quattro aree individuate: Appennino Emiliano, Basso Ferrarese, Appennino Piacentino-parmense e Alta Valmarecchia e accompagnando i territori nella definizione delle strategie di area in accordo con il CTAI e con il sistema locale.

Le 4 aree interne della Regione, coerentemente con il processo di finanziamento del livello nazionale, che è avvenuto a scaglioni, hanno concluso il processo di programmazione delle strategie di area in tempi diversi e tutte entro il 2019.

Lo strumento identificato per l'attuazione delle strategie di area è l'Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto dalle Amministrazioni centrali, dalla Regione e dal Capofila dell'area interna.

L'APQ è stato sottoscritto a notevole distanza dall'approvazione delle strategie, in media dopo più di un anno, rallentando il processo di attuazione degli interventi finanziati con risorse nazionali.

L'Agenzia per la coesione territoriale svolge l'alto coordinamento per la gestione degli APQ, la Regione esprime il RUA - Responsabile Unico dell'Accordo che ha il compito, tra gli altri, di elaborare entro giugno di ogni anno una Relazione di Avanzamento Annuale che evidenzia lo stato di attuazione degli interventi. Per la Regione Emilia-Romagna è stato individuato quale RUA il Direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni (DGREII).

Questa RAA è relativa allo stato di avanzamento al 31/12/2022 ed è unica per i quattro APQ SNAI dell'Emilia-Romagna:


- APQ APPENNINO EMILIANO
- APQ BASSO FERRARESE
- APQ APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE
- APQ ALTA VALMARECCHIA.

Per quanto riguarda l'articolazione della presente Relazione, nel paragrafo 1 è possibile rinvenire una panoramica generale sull'attuazione complessiva e aggregata dei 4 APQ mentre nei paragrafi a seguire si trovano i focus specifici per le singole Aree.

1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI APQ SNAI- PANORAMICA GENERALE

Questo paragrafo è finalizzato a evidenziare lo stato di attuazione dei 4 APQ SNAI offrendo una panoramica generale e l'avanzamento finanziario. L'elaborazione dei dati di monitoraggio viene fatta in seguito al lavoro congiunto con le Autorità di Gestione del POR FESR, FSE e del PSR e con la struttura della DG REII impegnata nel controllo e monitoraggio degli interventi finanziati con risorse nazionali che forniscono i dati di monitoraggio al 31/12/2022. I dati così raccolti vengono poi elaborati e resi fruibili internamente all'Amministrazione tramite la creazione di uno strumento di Business Intelligence che consente appunto di monitorare l'avanzamento delle strategie e dei progetti in modo integrato.

I grafici presentati in questo documento sono, quindi, estrapolati dal suddetto strumento che consente la visualizzazione dinamica dei dati di monitoraggio. Tale cruscotto di monitoraggio è stato sviluppato internamente dal Settore Coordinamento delle Politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione della DG REII ed in particolare dal Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici della Regione Emilia-Romagna che coordina anche il gruppo di lavoro del monitoraggio SNAI.

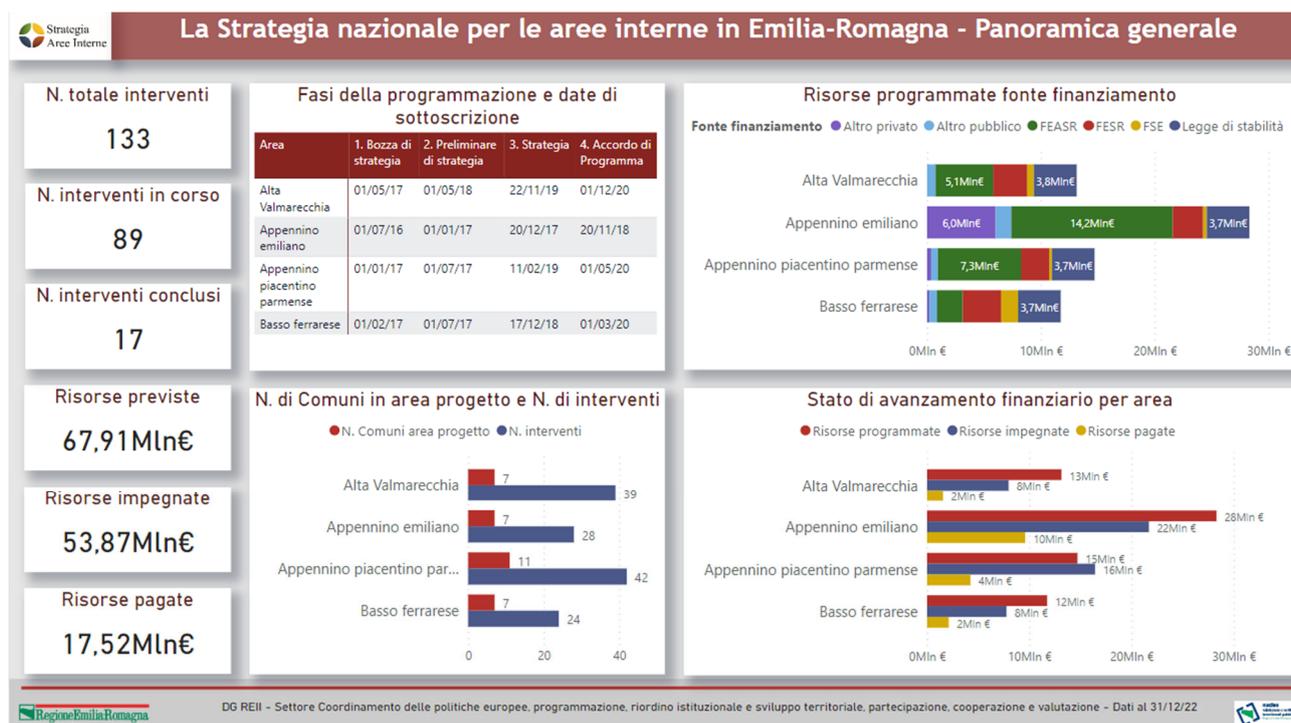

Nei focus sulle singole Aree vengono altresì riportate alcune informazioni più specifiche ricevute direttamente dai referenti del territorio.

1.1 Avanzamento finanziario

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento finanziario dei 4 APQ, di seguito si riporta una tabella riassuntiva. Quello che i dati restituiscono è una situazione più o meno uniforme tra le aree con una situazione leggermente più avanzata nel caso dell'Appennino Emiliano, che d'altronde è stata la prima area finanziata e che ha sottoscritto per prima l'APQ, e con una buona performance attuativa per Appennino piacentino-parmense.


In totale è stato impegnato quasi l'80% delle risorse programmate, mentre i pagamenti si attestano a circa il 26% del programmato.

AREA SNAI	Risorse Totali previste /programmate	Risorse impegnate	Risorse pagate	% risorse impegnate su programmate	% risorse pagate su programmate
Appennino Emiliano	28,3 Mln €	21,7 Mln €	9,6 Mln €	76,6%	33,9%
Appennino Piacentino Parmense	14,7 Mln €	16,4 Mln €	4,2Mln €	111,7%	28,9%
Basso Ferrarese	11,7 Mln €	7,8 Mln €	2,1 Mln €	66,2%	18,0%
Alta Val Marecchia	13,1Mln €	8,0 Mln €	1, 6 Mln €	60,7%	11,9%
TOTALE	67,9 Mln €	53,9Mln €	17,5 Mln €	79,3%	25,8%

È da sottolineare come tra le risorse si conteggino anche i cofinanziamenti attivati in aggiunta al contributo pubblico, soprattutto sul FEASR, i quali fanno sì che, nell'Appennino Piacentino-parmense, le risorse impegnate superino quelle inizialmente previste dall'APQ frutto di una stima ex ante.

Oltre al mero avanzamento finanziario si riporta di seguito anche un dettaglio più specifico delle risorse con una rappresentazione grafica di quelle programmate, impegnate e pagate suddivise per settore e fonte di finanziamento.

Grafico: Avanzamento finanziario per Settore e per Fonte di finanziamento

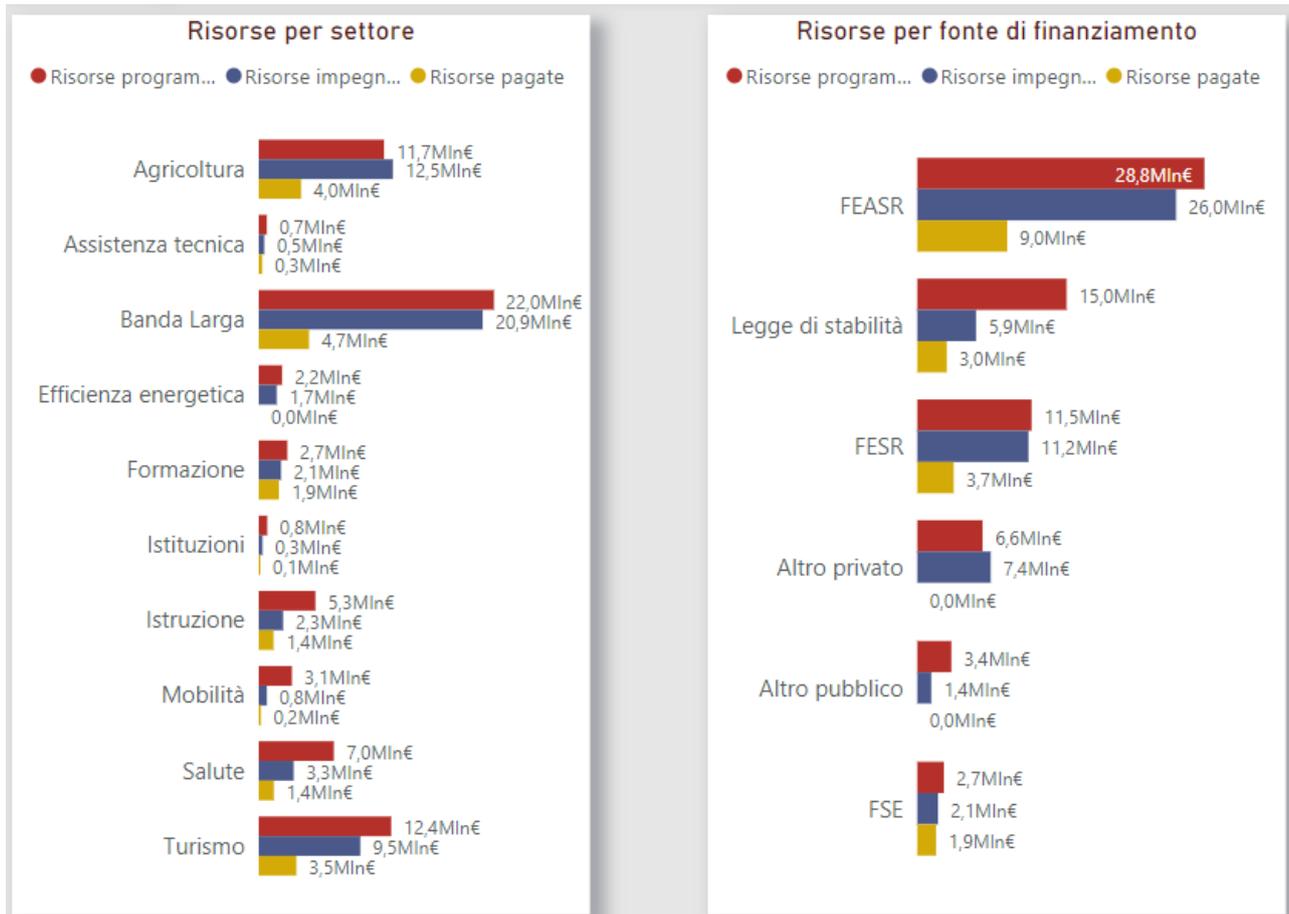

1.2 Stato di attuazione degli interventi

Di seguito il dettaglio dello stato di attuazione degli interventi con riferimento a quelli “in corso”, “conclusi” o “da avviare”:

AREA	N. di interventi previsti in APQ	N. di interventi in corso	N. di interventi conclusi	N. di interventi da avviare	N. di interventi annullati
Appennino Emiliano	28	16	4	6	2
Appennino Piacentino Parmense	42	33	6	2	1
Basso Ferrarese	24	17	3	3	1
Alta Val Marecchia	39	23	2	12	2
TOTALE	133	89	17	21	6


In relazione alla tabella che rappresenta lo stato di attuazione, si rende necessaria una specifica sulla colonna relativa agli interventi annullati. In questa fattispecie rientrano, infatti, differenti tipologie, fra cui troviamo gli interventi a cui gli stessi beneficiari hanno rinunciato, quelli revocati, quelli non ammessi a finanziamento e/o oggetto di riprogrammazione a beneficio di altri.

A questo proposito, si riporta di seguito una tabella di dettaglio puntuale:

Area	Intervento codice	Intervento titolo	Intervento settore	Fonte finanziamento	Criticità
Appennino emiliano	EMIAE11/B	Competenze per l'internazionalizzazione	Formazione	FSE	Misura non attuata per assenza interventi
Appennino emiliano	EMIAE21	Polo scolastico unificato	Istruzione	Legge di stabilità	non avviato
Appennino piacentino parmense	EMIAPP08/D	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Tornolo	Istruzione	Legge di stabilità	Annullato
Alta Valmarecchia	EMIAV21/B	E1b – Sant'Agata Feltria - Efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Casa della Musica	Efficienza energetica	FESR	Non ammesso a finanziamento
Alta Valmarecchia	EMIAV21/C	E1c – Sant'Agata Feltria - Efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Plesso scolastico e palestra	Efficienza energetica	FESR	Rinunciato
Basso ferrarese	EMIBF12	Il paniere dei prodotti dell'Area Interna	Agricoltura	FEASR	Nessuna domanda presentata dall'area

Anche in questo caso, oltre ai numeri di riepilogo degli interventi per area si riporta un dettaglio per settore - con salute, turismo e istruzione che predominano sugli altri -, per fonte di finanziamento e per tipologia.

Grafico: Numero di interventi per Settore, per Fonte di finanziamento e tipologia intervento

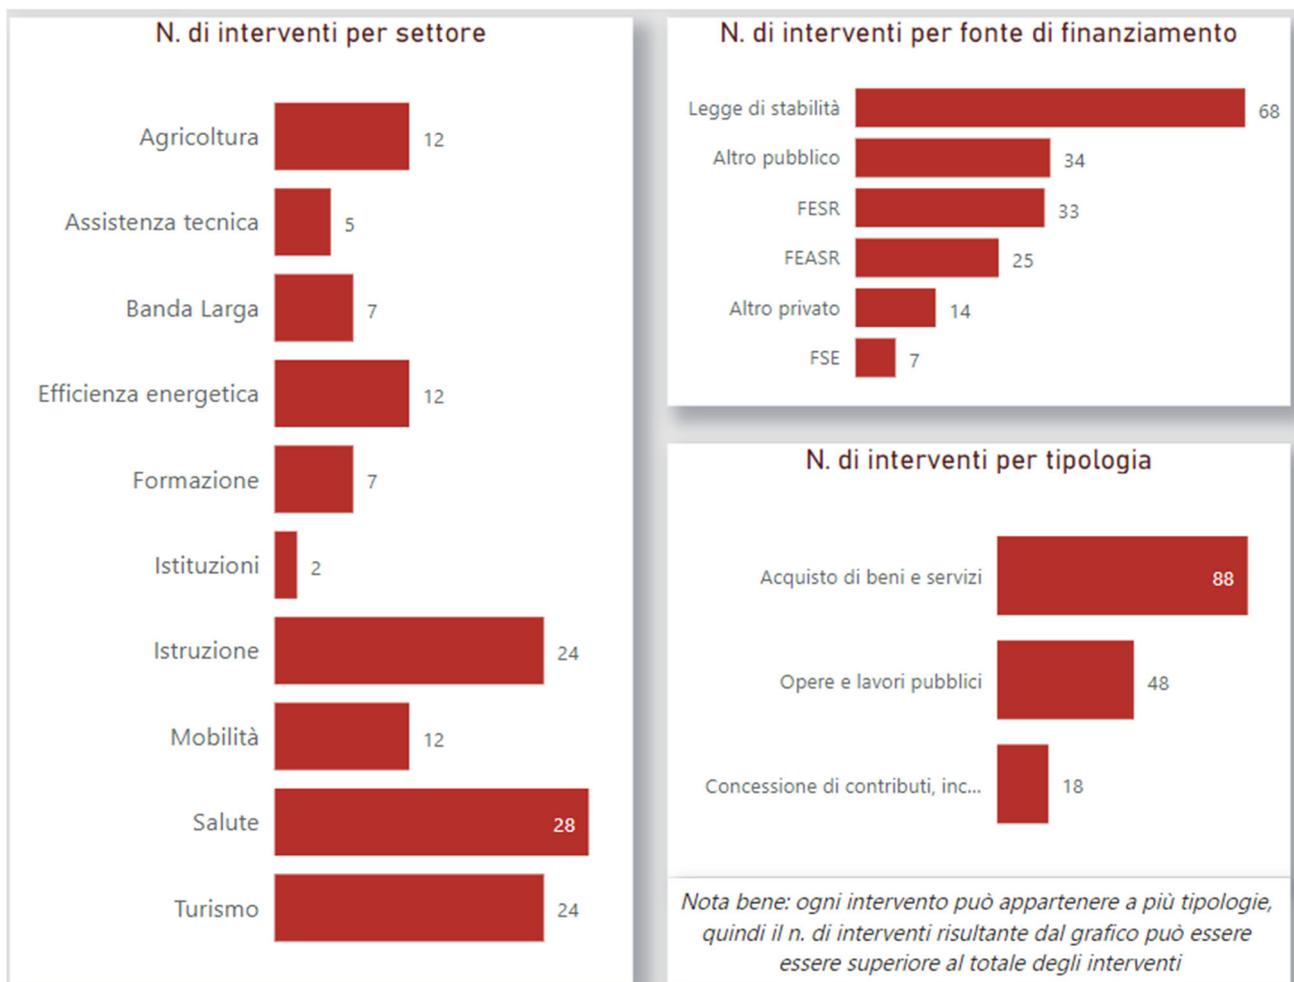

1.3 Conclusioni

L'attuazione è ancora in corso per tutti gli APQ. La pandemia e la crisi energetica successiva al conflitto russo-ucraino e il conseguente aumento del costo delle materie prime hanno molto rallentato il processo e causato un ritardo sui tempi, ma nel complesso lo stato di avanzamento può valutarsi soddisfacente con 89 interventi in corso sui 133 programmati e 17 interventi già conclusi, mentre 21 sono da avviare. Anche l'avanzamento finanziario è soddisfacente, con quasi l'80% delle risorse impegnate e il 26% pagate.


Alcuni interventi (sei) sono stati annullati per varie ragioni: mutate condizioni di contesto che hanno reso inopportuno l'intervento (EMIAE21, EMIAPP8/D), richieste di rinuncia da parte del soggetto attuatore per convenienza a candidare il progetto sul PNRR (EMIAV21/C), mancata presentazione del progetto sul bando regionale (EMIBF12, EMIAE11/B), inammissibilità della richiesta rispetto ai requisiti del bando (EMIAV21/B). In accordo con il Tavolo dei sottoscrittori e con l'Amministrazione di riferimento, le risorse dei progetti finanziati con risorse nazionali sono state riprogrammate per finanziare altri interventi coerenti nell'ambito della medesima strategia.

Nel corso del 2023, in attuazione alla delibera Cipess 41/2022 che ha trasferito ulteriori 300.000 € di risorse nazionali ad ogni area interna del ciclo 2014-20, nel contesto degli APQ vigenti sono stati identificati gli interventi da attuare, su cui si è in attesa di un riscontro dalle strutture nazionali di riferimento, e che sono esposti sinteticamente nella tabella seguente:

AREA INTERNA	SETTORE DI INTERVENTO	INTEGRAZIONE INTERVENTI APQ/NUOVO INTERVENTO	DENOMINAZIONE SCHEDA INTERVENTO	TOTALE RISORSE EX DELIBERA CIPESS 41/2022
APPENNINO EMILIANO	ISTRUZIONE	Integrazione intervento APQ	EMIAE 07 "Piattaforma 0-10 anni"	€300.000
BASSO FERRARESE	MOBILITA'	Integrazione intervento APQ	EMIBF09 "Soluzioni per la mobilità locale".	€300.000
APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE	MOBILITA'	Integrazione intervento APQ	EMIAPP12/B - Servizi flessibili di trasporto pubblico locale – mobility management e bus intelligenti in Valtaro e Valceno	€20.750
APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE	MOBILITA'	Integrazione intervento APQ	EMIAPP13/A - Acquisto mezzi e gestione del servizio nelle valli piacentine. Consolidamento servizio taxi sociale	€102.000
APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE	MOBILITA'	Integrazione intervento APQ	EMIAPP13/B - Acquisto mezzi e gestione del servizio nelle Valli Taro e Ceno. Consolidamento servizio taxi sociale	€51.000
APPENNINO PIACENTINO-PARMENSE	MOBILITA'	Integrazione intervento APQ	EMIAPP21 - Rafforzamento e integrazione del sistema locale di protezione civile - Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di accesso e spostamento interno nell'area	€126.250
ALTA VALMARECCHIA	MOBILITA'	Integrazione intervento APQ	EMIAV14 Pista ciclopedonale Valle del Marecchia	€150.000
ALTA VALMARECCHIA	MOBILITA'	Nuovo intervento	EMIAV14 BIS Pista ciclopedonale Valle del Marecchia, Ripristino ponte medioevale	€150.000

2 APQ APPENNINO EMILIANO

Di seguito si propone una rappresentazione generale dello stato di attuazione dell'APQ Appennino Emiliano estratta dal cruscotto di monitoraggio SNAI, che fornisce una panoramica sulle informazioni generali relative all'avanzamento dei progetti finanziati nell'area ma anche un riepilogo dei comuni e una mappa dell'area interna.

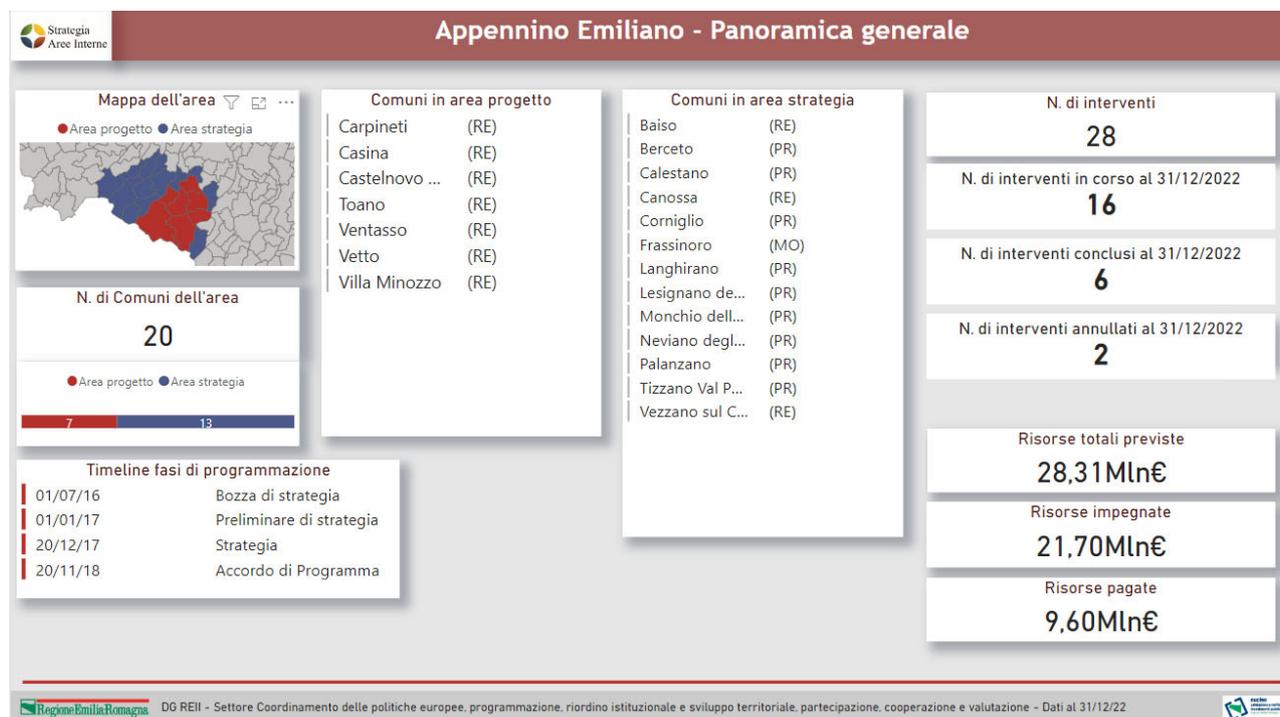


2.1 Inquadramento giuridico APQ

AREA INTERNA	Assegnazione risorse	Approvazione strategia	Approvazione schema di Accordo di Programma	Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro
Appennino Emiliano	Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015	DGR n. 2045 del 20 dicembre 2017	DGR n. 1108 del 09/07/2018	20 novembre 2018

2.2 Avanzamento finanziario

Risorse Totali previste /programmate (mil/€)	Risorse impegnate (mil/€)	Risorse pagate (mil/€)
28,31	21,7	9,6

Grafico: Avanzamento finanziario per Settore e per Fonte di finanziamento

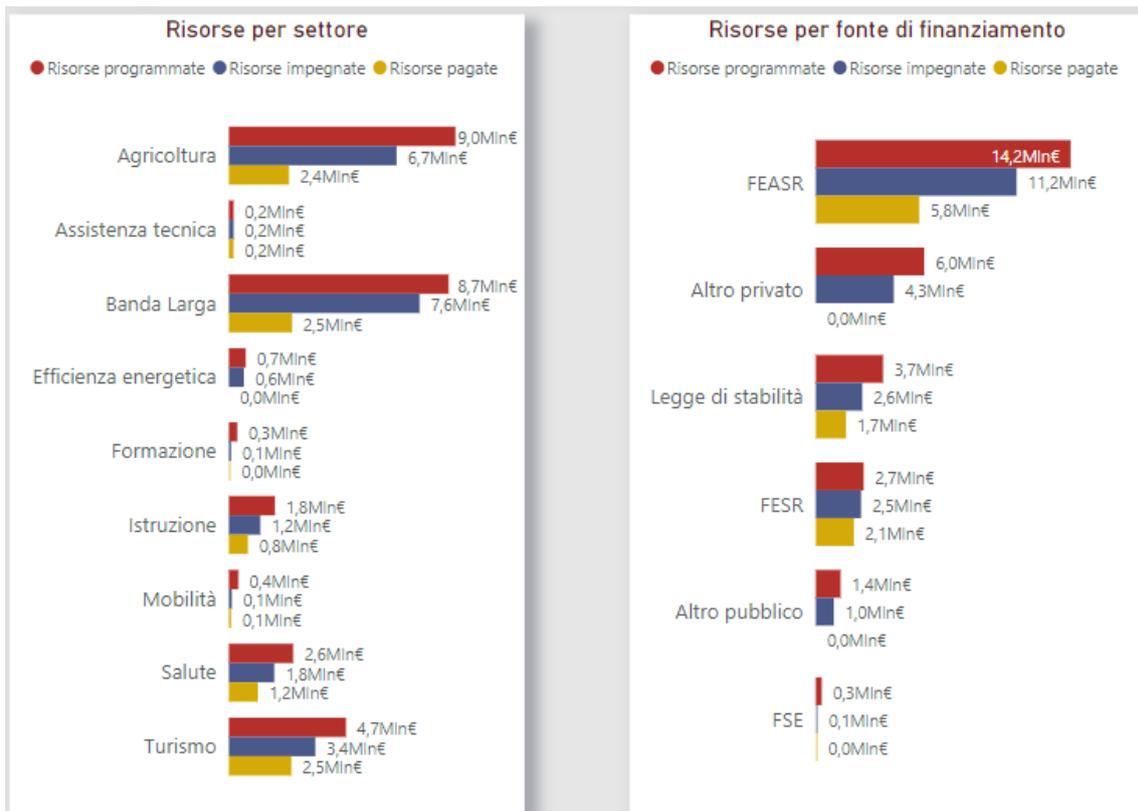


2.3 Stato di attuazione degli interventi

AREA	N. di interventi previsti in APQ	N. di interventi in corso	N. di interventi conclusi	N. di interventi da avviare	N. di interventi annullati
Appennino Emiliano	28	16	6	4	2*

* Vedi quanto descritto nella panoramica generale

Grafico: Numero di interventi per Settore, per Fonte di finanziamento e tipologia intervento

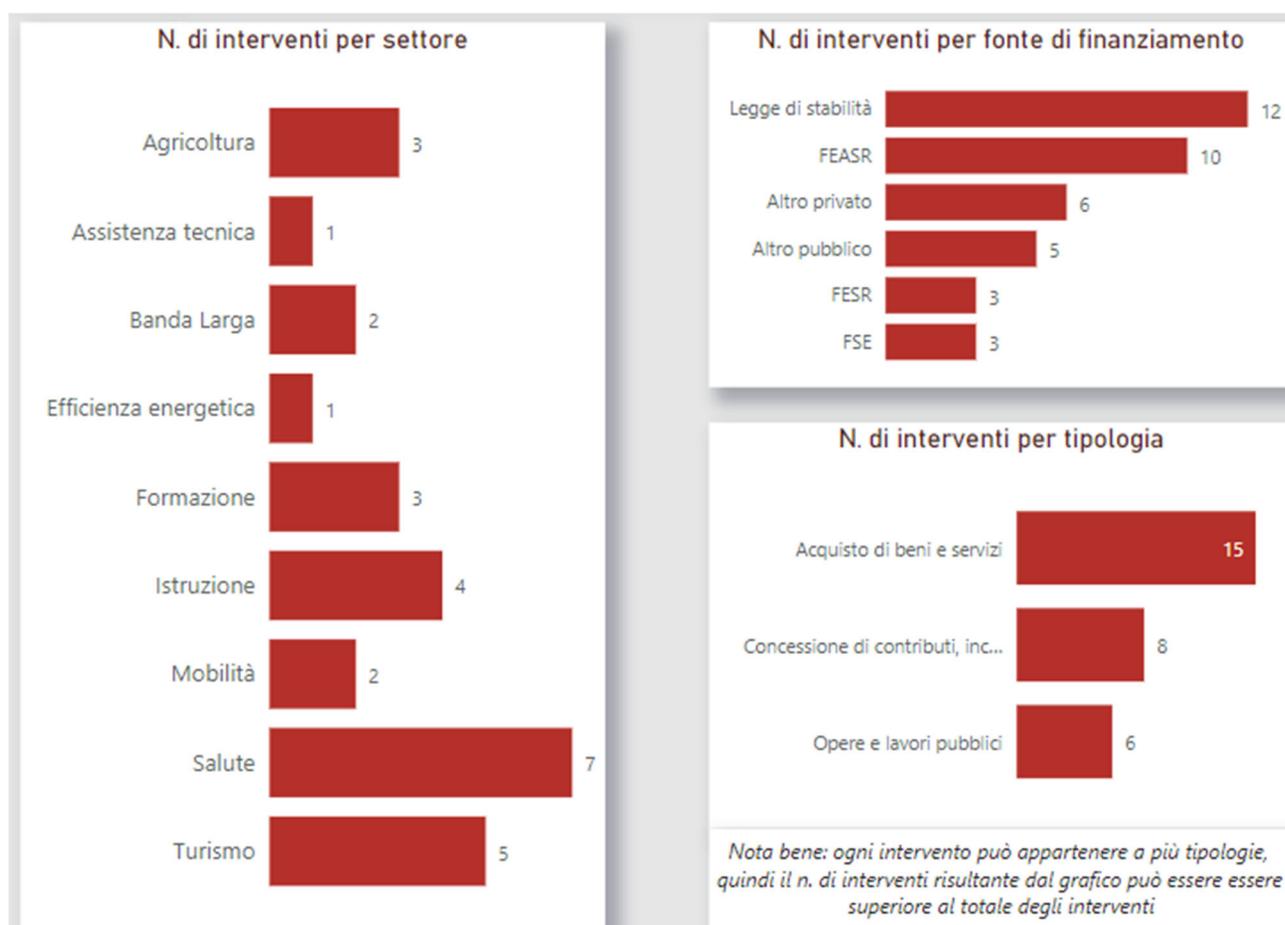

2.4 Tabelle esplicative degli interventi

Tabella: Anagrafica degli interventi

Codice intervento	Titolo intervento	Settore intervento	Fonte finanziamento	Intervento oggetto	Stato intervento
EMIAE01	Autosoccorso di comunità	Salute	Legge di stabilità	Creazione di un'area strutturata di "soccorritori laici in rete"	In corso
EMIAE02	Infermiere di comunità	Salute	Legge di stabilità	Implementazione e start up del servizio "infermiere di comunità"	Concluso
EMIAE03	Posti letto ad alto grado di intensità assistenziale presso casa residenza anziani	Salute	Legge di stabilità	Attivazione di due posti letto ad alto grado di intensità assistenziale nella Casa Residenza Anziani "I Ronchi" di Castelnuovo ne' Monti	In corso
EMIAE04	Centro di prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria	Salute	Legge di stabilità	Realizzazione di un Centro di Prevenzione Cardiovascolare Primaria e Secondaria	In corso
EMIAE05	Casa della salute a bassa complessità assistenziale	Salute	FEASR + Altro pubblico	Realizzazione del presidio sanitario "Casa della Salute a bassa complessità"	Concluso
EMIAE06/A	Il presidio sociale delle cooperative di comunità	Salute	Legge di stabilità	Sostegno e valorizzazione della cooperazione di comunità	In corso
EMIAE06/B	Il presidio sociale delle cooperative di comunità	Salute	FEASR + Altro pubblico	Sostegno e valorizzazione della cooperazione di comunità	Da avviare
EMIAE07	Piattaforma zero-dieci anni	Istruzione	Legge di stabilità	Progettazione integrata di comunità nella scuola	In corso
EMIAE08	Laboratorio appennino – qualità dell'offerta formativa	Istruzione	Legge di stabilità	Qualificazione dell'offerta formativa attraverso un approccio alla didattica laboratoriale, orientato a potenziare la qualità e l'attrattività delle Istituzioni scolastiche secondarie superiori, mediante l'innovazione pedagogica, didattica e organizzativa, orientando l'offerta scolastica verso l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità.	In corso
EMIAE09/A	Laboratorio appennino – miglioramento rapporti con il mercato del lavoro	Istruzione	Legge di stabilità	Istruzione: laboratori didattici, attività di alternanza scuola lavoro	In corso
EMIAE09/B	Laboratorio appennino – miglioramento rapporti con il mercato del lavoro	Formazione	FSE	Istruzione e formazione professionale: contrasto alla dispersione scolastica e attività di alternanza scuola-lavoro	In corso
EMIAE10	Riqualificazione energetica edifici scolastici	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Scuola media Bismantova di Castelnuovo ne' Monti - Azione pilota per l'intervento di riqualificazione energetica dell'area	In corso
EMIAE11/A	Competenze per l'internazionalizzazione	Formazione	FSE	Formazione professionale per personale occupato	Concluso
EMIAE11/B	Competenze per l'internazionalizzazione	Formazione	FSE	Formazione professionale per personale occupato	Annullato
EMIAE12	Centrale della mobilità	Mobilità	Legge di stabilità	Creazione della "Centrale della mobilità" e di altri servizi accessori ad essa strettamente connessi	Da avviare
EMIAE13	Bismantino	Mobilità	Legge di stabilità	Creazione di un servizio di trasporto pubblico	In corso
EMIAE14/A	Parmigiano reggiano di montagna	Agricoltura	FEASR + Altro pubblico	Sostanziare la distintività del Parmigiano-Reggiano prodotto dai caseifici dell'area come "PR di Montagna" attraverso innovazioni tecniche, varietali e organizzative della intera filiera di produzione a partire dalle imprese agricole per coinvolgere i caseifici e migliorare il loro posizionamento di mercato entro una logica di piena sostenibilità economica.	In corso
EMIAE14/B	Parmigiano reggiano di montagna - azioni di cooperazione per la ricerca e lo sviluppo di investimenti immateriali	Agricoltura	FEASR + Altro pubblico	Valorizzazione del Parmigiano Reggiano di Montagna	In corso
EMIAE15	Start up imprese agroalimentari	Agricoltura	FEASR + Altro pubblico	Azioni di promozione di nuove imprese di produzione agroalimentare e manifatturiera e di servizi alle imprese, anche attraverso attività di animazione rivolte ai giovani residenti in Appennino.	In corso
EMIAE16/A	Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco	Turismo	FESR + Altro pubblico	Offerta di servizi per il turismo e la fruizione sostenibile nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e nel Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, all'interno della Riserva della Biosfera UNESCO.	Concluso
EMIAE16/B	Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco	Turismo	FESR + Altro pubblico	Offerta di servizi per il turismo e la fruizione sostenibile nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e nel Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, all'interno della Riserva della Biosfera UNESCO.	Concluso
EMIAE17	Montagna di latte	Turismo	FEASR + Altro privato	Costituzione di una rete di imprese per la commercializzazione del prodotto turistico "La Montagna del Latte", attraverso l'attivazione di una specifica campagna promozionale e l'allestimento di spazi per la fruizione e la commercializzazione nei luoghi della produzione agroalimentare.	Da avviare
EMIAE18/A	Imprese turistiche in rete	Turismo	FEASR + Altro privato	Integrazione a rete del tessuto imprenditoriale locale	Da avviare
EMIAE18/B	Imprese turistiche	Turismo	FEASR + Altro privato	Riqualificazione del tessuto imprenditoriale locale	In corso
EMIAE19/A	Banda ultra-larga	Banda Larga	FEASR	Implementazione delle infrastrutture di rete per la Banda Ultra Larga, attraverso la realizzazione di tratte dorsali per il raggiungimento degli obiettivi 2020 dell'Agenda Digitale Europea.	In corso
EMIAE19/B	Banda ultra-larga	Banda Larga	FEASR	Implementazione delle infrastrutture di rete per la Banda Ultra Larga, attraverso la realizzazione di interventi di accesso per il raggiungimento degli obiettivi 2020 dell'Agenda Digitale Europea.	In corso
EMIAE20	Supporto all'attuazione della strategia	Assistenza tecnica	Legge di stabilità	Supporto all'attuazione della strategia, alla gestione delle attività previste e al monitoraggio degli interventi	Concluso
EMIAE21	Polo scolastico unificato	Istruzione	Legge di stabilità	Progettazione per la realizzazione di un polo scolastico che soddisfi l'intera offerta formativa del Comune, dal nido alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, fino alla scuola secondaria inferiore	Annullato

Tabella: Avanzamento finanziario degli interventi

Nella tabella l'avanzamento finanziario di ogni intervento è distinto per fonte di finanziamento (Fondo SIE o Legge di Stabilità e, laddove previsto, cofinanziamento indicato con Altro pubblico, se cofinanziamento pubblico locale, o Altro privato) e per ogni fonte una riga.

Intervento codice	Intervento titolo	Fonte finanziamento	Stato intervento	Risorse previste	Risorse impegnate	Risorse pagate
EMIAE01	Autosoccorso di comunità	Legge di stabilità	In corso	25.000 €	23.676 €	15.465 €
EMIAE02	Infermiere di comunità	Legge di stabilità	Concluso	380.000 €	380.000 €	380.000 €
EMIAE03	Posti letto ad alto grado di intensità assistenziale presso casa residenza anziani	Legge di stabilità	In corso	198.000 €	186.878 €	97.142 €
EMIAE04	Centro di prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria	Legge di stabilità	In corso	298.000 €	12.055 €	12.055 €
EMIAE05	Casa della salute a bassa complessità assistenziale	Altro pubblico	Concluso	250.000 €	250.000 €	0 €
EMIAE05	Casa della salute a bassa complessità assistenziale	FEASR	Concluso	500.000 €	500.000 €	500.000 €
EMIAE06/A	Il presidio sociale delle cooperative di comunità	Legge di stabilità	In corso	450.000 €	432.878 €	147.230 €
EMIAE06/B	Il presidio sociale delle cooperative di comunità	Altro pubblico	Da avviare	225.000 €	0 €	0 €
EMIAE06/B	Il presidio sociale delle cooperative di comunità	FEASR	Da avviare	225.000 €	17.590 €	0 €
EMIAE07	Piattaforma zero-dieci anni	Legge di stabilità	In corso	673.000 €	491.062 €	242.327 €
EMIAE08	Laboratorio appennino – qualità dell'offerta formativa	Legge di stabilità	In corso	514.000 €	525.119 €	350.219 €
EMIAE09/A	Laboratorio appennino – miglioramento rapporti con il mercato del lavoro	Legge di stabilità	In corso	240.000 €	230.756 €	163.724 €
EMIAE09/B	Laboratorio appennino – miglioramento rapporti con il mercato del lavoro	FSE	In corso	120.000 €	58.340 €	22.878 €
EMIAE10	Riqualificazione energetica edifici scolastici	Altro pubblico	In corso	266.391 €	192.465 €	0 €
EMIAE10	Riqualificazione energetica edifici scolastici	FESR	In corso	401.926 €	401.926 €	0 €
EMIAE11/A	Competenze per l'internazionalizzazione	FSE	Concluso	120.000 €	26.766 €	26.766 €
EMIAE11/B	Competenze per l'internazionalizzazione	FSE	Annulato	90.000 €	0 €	0 €
EMIAE12	Centrale della mobilità	Legge di stabilità	Da avviare	250.000 €	0 €	0 €
EMIAE13	Bismantino	Legge di stabilità	In corso	125.000 €	114.625 €	84.254 €
EMIAE14/A	Parmigiano reggiano di montagna	Altro privato	In corso	4.862.445 €	3.708.352 €	0 €
EMIAE14/A	Parmigiano reggiano di montagna	FEASR	In corso	3.234.450 €	2.424.824 €	2.233.868 €
EMIAE14/B	Parmigiano reggiano di montagna- azioni di cooperazione per la ricerca e lo sviluppo di investimenti immateriali	Altro privato	In corso	100.000 €	252.810 €	0 €
EMIAE14/B	Parmigiano reggiano di montagna- azioni di cooperazione per la ricerca e lo sviluppo di investimenti immateriali	FEASR	In corso	300.000 €	10.713 €	9.518 €
EMIAE15	Start up imprese agroalimentari	Altro privato	In corso	200.000 €	0 €	0 €
EMIAE15	Start up imprese agroalimentari	FEASR	In corso	300.000 €	264.919 €	137.658 €
EMIAE16/A	Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco	Altro pubblico	Concluso	517.000 €	440.430 €	0 €
EMIAE16/A	Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco	FESR	Concluso	1.833.000 €	1.688.976 €	1.688.976 €
EMIAE16/B	Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco	Altro pubblico	Concluso	121.000 €	119.130 €	0 €
EMIAE16/B	Fruizione sostenibile nei parchi della riserva della biosfera Unesco	FESR	Concluso	429.000 €	427.412 €	427.412 €
EMIAE17	Montagna di latte	Altro privato	Da avviare	40.000 €	0 €	0 €
EMIAE17	Montagna di latte	FEASR	Da avviare	60.000 €	0 €	0 €
EMIAE18/A	Imprese turistiche in rete	Altro privato	Da avviare	50.000 €	0 €	0 €
EMIAE18/A	Imprese turistiche in rete	FEASR	Da avviare	50.000 €	0 €	0 €
EMIAE18/B	Imprese turistiche	Altro privato	In corso	775.000 €	377.631 €	0 €
EMIAE18/B	Imprese turistiche	FEASR	In corso	775.000 €	377.631 €	365.122 €
EMIAE19/A	Banda ultra-larga	FEASR	In corso	3.293.136 €	2.633.133 €	2.507.537 €
EMIAE19/B	Banda ultra-larga	FEASR	In corso	5.434.657 €	4.940.598 €	0 €
EMIAE20	Supporto all'attuazione della strategia	Legge di stabilità	Concluso	187.000 €	187.000 €	187.000 €
EMIAE21	Polo scolastico unificato	Legge di stabilità	Annulato	400.000 €	0 €	0 €

2.5 Esperienze e buone pratiche dal territorio

Nel 2022 sono continuate con successo tutte le azioni implementate negli anni precedenti con avanzamenti significativi nell'attuazione delle diverse misure. Nello specifico, per quello che riguarda l'ambito dell'**Istruzione**, le attività di formazione e progettazione contenute nelle schede "*Laboratorio Appennino*" si sono potute espletare in presenza sia presso i due Istituti d'Istruzione Superiore di Castelnovo ne' Monti che attraverso esperienze formative e didattiche rivolte ai docenti e organizzate presso le sedi degli stakeholders coinvolti. La progettazione condivisa docenti/studenti ha portato all'allestimento di 4 laboratori tecnologici e 8 laboratori didattici che sono stati inaugurati alla presenza delle autorità locali e regionali il 4 Ottobre 2022.


Per quello che riguarda l'area **Sanità**, le figure degli infermieri di comunità hanno continuato il proficuo lavoro sul territorio stringendo una forte collaborazione con stakeholder locali e con le cooperative di comunità.

Per quanto riguarda, invece, gli **interventi finanziati dai fondi SIE** si registra un avanzamento procedurale, fisico e finanziario per tutti gli interventi relativi ai tre fondi FESR, FEASR e FSE.

Tra le buone pratiche si segnalano gli interventi "**Laboratorio Appennino: qualità dell'offerta formativa**" e "**Laboratorio Appennino: miglioramento dei rapporti con il mercato del lavoro**". L'obiettivo è quello di creare i presupposti per un progetto di vita dei giovani sul territorio che metta in risalto una comunità attiva, coesa e responsabile nella costruzione di un presente e di un futuro sostenibili. La scuola è intesa come laboratorio per lo sviluppo di una cultura identitaria, sostenibile e innovativa e come luogo ideale per costruire nuovi profili professionali orientati alla internazionalizzazione e a promuovere nuove competenze tecnico scientifiche. Per garantire una implementazione armoniosa delle azioni è stato costituito un tavolo di coordinamento Laboratorio Appennino che comprende il Parco Nazionale, Istituzioni scolastiche, Comuni, Imprese, Associazioni. A seguito della formazione, i docenti coinvolti, affiancati dagli esperti di UNIMORE e dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, hanno progettato e allestito aule laboratorio disciplinari: laboratorio umanistico, matematico/scientifico, linguistico, geostoria, tecnologico. Sono stati organizzati anche laboratori pomeridiani ed estivi a scuola in collaborazione con le realtà del territorio, laboratori globali per sostenere scambi tra scuole e visite a livello locale, nazionale e internazionale e laboratori diffusi.

3 APQ APPENNINO PIACENTINO PARMENSE

Di seguito si propone una rappresentazione generale dello stato di attuazione dell'APQ Appennino Piacentino Parmense, estratta dal cruscotto di monitoraggio SNAI, che fornisce una panoramica sulle informazioni generali relative all'avanzamento dei progetti finanziati nell'area ma anche un riepilogo dei comuni e una mappa dell'area interna.

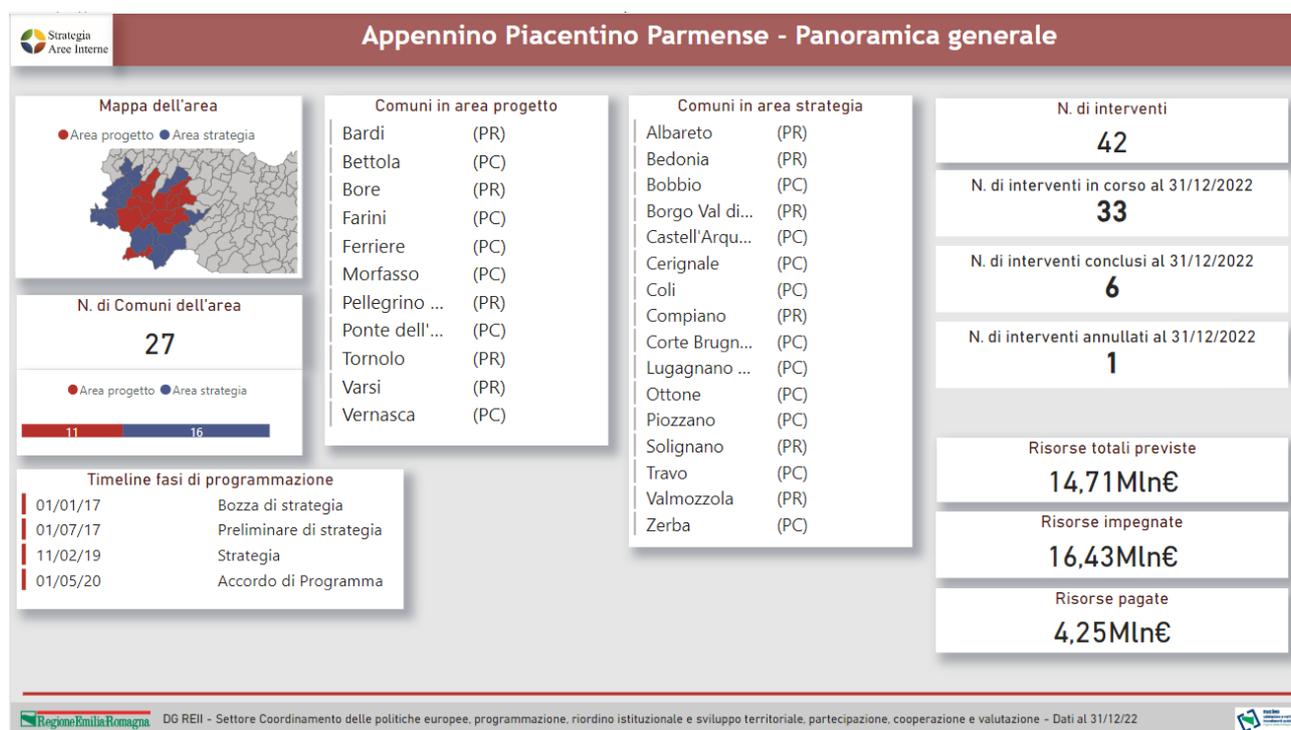

3.1 Inquadramento giuridico APQ

AREA INTERNA	Assegnazione risorse	Approvazione strategia	Approvazione schema di Accordo di Programma	Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro
Appennino Piacentino Parmense	Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015	DGR n. 222 del 11 febbraio 2022	DGR n. 974 del 6/18/06/2019	20 novembre 2020

3.2 Avanzamento finanziario

Risorse Totali previste/programmate (mil/€)	Risorse impegnate (mil/€)	Risorse pagate (mil/€)
14,71	16,43	4,25

Grafico: Avanzamento finanziario per Settore e per Fonte di finanziamento


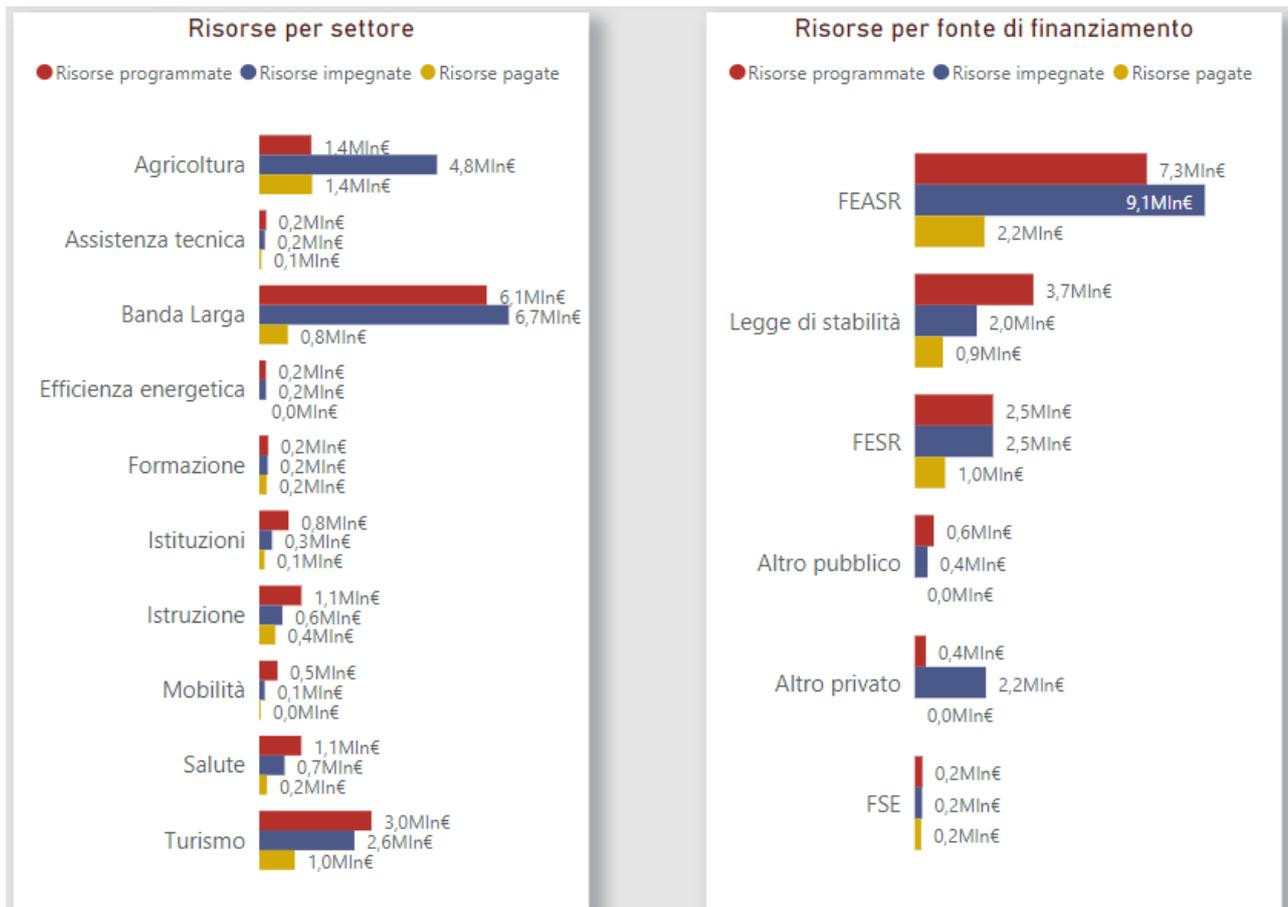


Grafico: Numero di interventi per Settore, per Fonte di finanziamento e tipologia intervento

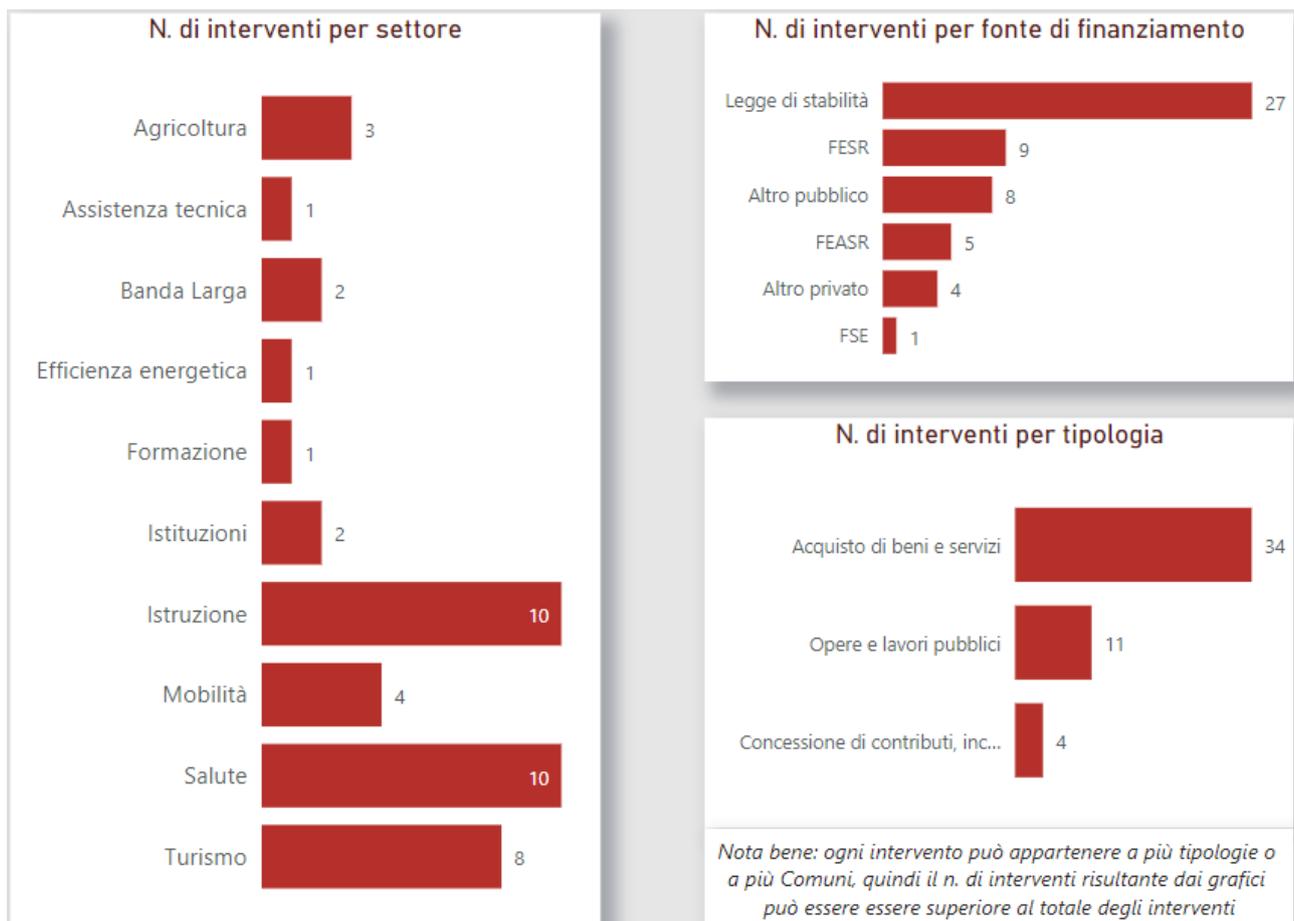

3.3 Stato di attuazione degli interventi

AREA	N. di interventi previsti in APQ	N. di interventi in corso	N. di interventi conclusi	N. di interventi da avviare	N. di interventi annullati
Appennino Piacentino Parmense	42	33	6	2	1*

* Vedi quanto descritto nella panoramica generale

3.4 Tabelle esplicative degli interventi

Tabella: Anagrafica degli interventi

Codice intervento	Titolo intervento	Settore intervento	Fonte finanziamento	Intervento oggetto	Stato intervento
EMIAPP01/A	Infermiere di comunità nell'Appennino Piacentino	Salute	Legge di stabilità	L'intervento è ispirato alla logica della "medicina di iniziativa", volta ad andare verso le persone e i loro bisogni con approccio proattivo, spostandosi sul territorio, frequentando i luoghi di residenza e in particolare quelli più distanti, cercando di prevenire i problemi o intercettarli al loro insorgere. Si rivolge anzitutto e in via privilegiata alla popolazione anziana fragile, con patologie croniche, residente nelle piccole frazioni di montagna distanti dai centri di erogazione dei servizi; alle gestanti, in quanto nell'area molte visite preparto risultano a gravidanza avanzata, segno di una capacità non ottimale dell'attuale organizzazione sanitaria di intercettare questa fascia di domanda, composta in buona parte da immigrate	In corso
EMIAPP01/B	Infermiere di comunità nell'Appennino Parmense	Salute	Legge di stabilità	L'intervento è ispirato alla logica della "medicina di iniziativa", volta ad andare verso le persone e i loro bisogni con approccio proattivo, spostandosi sul territorio, frequentando i luoghi di residenza e in particolare quelli più distanti, cercando di prevenire i problemi o intercettarli al loro insorgere. Si rivolge anzitutto e in via privilegiata alla popolazione anziana fragile, con patologie croniche, residente nelle piccole frazioni di montagna distanti dai centri di erogazione dei servizi; alle gestanti, in quanto nell'area molte visite preparto risultano a gravidanza avanzata, segno di una capacità non ottimale dell'attuale organizzazione sanitaria di intercettare questa fascia di domanda, composta in buona parte da immigrate	In corso
EMIAPP01/C	Estensione di Montagna Solidale nell'Appennino piacentino	Salute	Legge di stabilità	L'intervento è ispirato alla logica della "medicina di iniziativa", volta ad andare verso le persone e i loro bisogni con approccio proattivo, spostandosi sul territorio, frequentando i luoghi di residenza e in particolare quelli più distanti, cercando di prevenire i problemi o intercettarli al loro insorgere. Si rivolge anzitutto e in via privilegiata alla popolazione anziana fragile, con patologie croniche, residente nelle piccole frazioni di montagna distanti dai centri di erogazione dei servizi.	In corso
EMIAPP01/D	Estensione di Montagna Solidale nell'Appennino parmense	Salute	Legge di stabilità	L'intervento è ispirato alla logica della "medicina di iniziativa", volta ad andare verso le persone e i loro bisogni con approccio proattivo, spostandosi sul territorio, frequentando i luoghi di residenza e in particolare quelli più distanti, cercando di prevenire i problemi o intercettarli al loro insorgere. Si rivolge anzitutto e in via privilegiata alla popolazione anziana fragile, con patologie croniche, residente nelle piccole frazioni di montagna distanti dai centri di erogazione dei servizi	In corso
EMIAPP02	Accesso agevolato alla casa della salute di Bettola	Salute	Legge di stabilità	L'intervento istituisce un servizio per facilitare l'accesso alla Casa della Salute di Bettola, in particolare da parte di pazienti in cura presso la Chemioterapia ambulatoriale	In corso
EMIAPP03	Ricoveri di sollievo - Sostegno alle famiglie di Valtaro e Valceno	Salute	Legge di stabilità	Riclassificazione a valenza sanitaria di due nuovi posti letto per ricoveri di sollievo presso la CRA di Varsi (PR), per accogliere in fase post-acute e in via temporanea persone non autosufficienti e dare sostegno alla famiglia	In corso
EMIAPP04	Acquisto di automezzo per il trasporto sanitario semplice	Salute	Legge di stabilità	Acquisizione di un automezzo nuovo per il servizio di trasporto sanitario semplice, adeguatamente allestito e in regola con le normative antinquinamento - in sostituzione del veicolo attuale, immatricolato nel 2000 e con 240.000 chilometri di percorrenza - dotato di sistema automatico per caricare e scaricare un paziente in carrozzina. L'acquisto del nuovo mezzo permette di garantire il servizio di trasporto sanitario semplice almeno per i prossimi 15 anni, anche per pazienti disabili, con la necessaria affidabilità, impegnando un solo volontario e senza la necessità di sottrarre un'autoambulanza dal suo impiego	In corso
EMIAPP05	Rafforzamento dell'emergenza-urgenza	Salute	Legge di stabilità	L'intervento realizza nella parte Piacentina il potenziamento in termini di presenza giornaliera di due UOM (unità operative mobili), attraverso l'assunzione di n. 2 autisti soccorritori dipendenti che si affiancano ai militi volontari, nei comuni di Morfasso e Ferriere, rafforzando l'attuale sistema di pronta disponibilità garantito dai volontari di ANPAS, tramite convenzione con AUSL PC	In corso
EMIAPP06/A	Housing sociale nel comune di Farini	Salute	Legge di stabilità	L'intervento estende e migliora l'offerta di residenza per anziani autosufficienti, col supporto di servizi pubblici e privati. L'azione realizza all'interno di un edificio esistente 3 alloggi al primo piano oggi inutilizzato della casa protetta di Farini, per complessivi 130 mq. da utilizzare d'inverno per l'housing sociale (residenza temporanea di persone che vivono in luoghi isolati, per loro maggiore sicurezza e qualità di vita), d'estate come luogo di riposo e villeggiatura sempre al servizio degli anziani (residenze temporanee per vacanza, riposo, socializzazione, supportate da una rete locale di servizi). L'azione è ideata sulla scia di alcune esperienze già realizzate a Ferriere e Morfasso, e ne migliora e perfeziona l'approccio. La proprietà dell'immobile è del Comune di Farini, che ha assegnato l'utilizzo del bene con vincolo di destinazione al Consorzio "Casa protetta Alta Val Nure", consorzio interamente pubblico fondato nel 1997 dai Comuni di Farini (60%) e di Ferriere (40%). Il bene fisico, localizzato nel Comune di Farini, è quindi di proprietà del comune stesso	In corso
EMIAPP06/B	Housing sociale nel comune di Tornolo	Salute	Legge di stabilità	L'intervento estende e migliora l'offerta di residenza per anziani autosufficienti, col supporto di servizi pubblici e privati. L'azione realizza, all'interno di un edificio esistente, 3 alloggi in un ex-asilo ristrutturato a struttura polivalente sito nella frazione di S. Maria del Taro, nel comune di Tornolo, per complessivi 190 mq. da utilizzare d'inverno per housing sociale (residenza temporanea di persone che vivono in luoghi isolati, per loro maggiore sicurezza e qualità di vita), d'estate come luogo di riposo e villeggiatura sempre al servizio degli anziani (residenze temporanee per vacanza, riposo, socializzazione, supportate da una rete locale di servizi). L'azione è ideata sulla scia di alcune esperienze già realizzate a Ferriere e Morfasso, e ne migliora e perfeziona l'approccio. La proprietà dell'immobile è della Parrocchia di Santa Maria del Taro, che ne ha assegnato il comodato gratuito al Comune per 50 anni (scadenza il 19/07/2051)	In corso
EMIAPP07	Efficientamento energetico della RSA di Vernasca	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Efficientamento energetico dell'edificio che ospita la Residenza Socio-Assistenziale (RSA) nel Comune di Vernasca (PC)	In corso

EMIAPP08/A	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nei comuni dell'Alta Val Nure: doposcuola	Istruzione	Legge di stabilità	Nel suo complesso l'intervento (che attinge a risorse della Legge di Stabilità per 443.340 euro complessivi) comprende tre azioni, finalizzate ad arrestare la tendenza allo spostamento della residenza delle famiglie con minori verso centri urbani più grandi: - servizio di baby caring per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) in cinque comuni dell'area; - sostegno alla scuola dell'infanzia (3-6 anni) nei comuni di Bore (PR), Tornolo (PR) e Morfasso (PC) attraverso il ricorso a educatori professionali a completamento del tempo scuola; - allungamento al pomeriggio dell'orario di apertura dei plessi scolastici (primaria, secondaria di primo grado), con offerta di servizi comunali di doposcuola in nove comuni dell'area, a fini di conciliazione con i tempi di lavoro dei genitori nei comuni dell'Area Interna	In corso
EMIAPP08/B	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel comune di Morfasso	Istruzione	Legge di stabilità	Nel suo complesso l'intervento comprende tre azioni, finalizzate ad arrestare la tendenza allo spostamento della residenza delle famiglie con minori verso centri urbani più grandi: - servizio di baby caring per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) in cinque comuni dell'area; - sostegno alla scuola dell'infanzia (3-6 anni) nei comuni di Bore (PR), Tornolo (PR) e Morfasso (PC) attraverso il ricorso a educatori professionali a completamento del tempo scuola; - allungamento al pomeriggio dell'orario di apertura dei plessi scolastici (primaria, secondaria di primo grado), con offerta di servizi comunali di doposcuola in nove comuni dell'area, a fini di conciliazione con i tempi di lavoro dei genitori nei comuni dell'Area Interna	In corso
EMIAPP08/C	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel comune di Vernasca	Istruzione	Legge di stabilità	Nel suo complesso l'intervento comprende tre azioni, finalizzate ad arrestare la tendenza allo spostamento della residenza delle famiglie con minori verso centri urbani più grandi: - servizio di baby caring per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) in cinque comuni dell'area; - sostegno alla scuola dell'infanzia (3-6 anni) nei comuni di Bore (PR), Tornolo (PR) e Morfasso (PC) attraverso il ricorso a educatori professionali a completamento del tempo scuola; - allungamento al pomeriggio dell'orario di apertura dei plessi scolastici (primaria, secondaria di primo grado), con offerta di servizi comunali di doposcuola in nove comuni dell'area, a fini di conciliazione con i tempi di lavoro dei genitori nei comuni dell'Area Interna	In corso
EMIAPP08/D	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Tornolo	Istruzione	Legge di stabilità	Nel suo complesso l'intervento comprende tre azioni, finalizzate ad arrestare la tendenza allo spostamento della residenza delle famiglie con minori verso centri urbani più grandi: - servizio di baby caring per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) in cinque comuni dell'area; - sostegno alla scuola dell'infanzia (3-6 anni) nei comuni di Bore (PR), Tornolo (PR) e Morfasso (PC) attraverso il ricorso a educatori professionali a completamento del tempo scuola; - allungamento al pomeriggio dell'orario di apertura dei plessi scolastici (primaria, secondaria di primo grado), con offerta di servizi comunali di doposcuola in nove comuni dell'area, a fini di conciliazione con i tempi di lavoro dei genitori nei comuni dell'Area Interna	Annullato
EMIAPP08/E	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Varsi	Istruzione	Legge di stabilità	Nel suo complesso l'intervento comprende tre azioni, finalizzate ad arrestare la tendenza allo spostamento della residenza delle famiglie con minori verso centri urbani più grandi: - servizio di baby caring per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) in cinque comuni dell'area; - sostegno alla scuola dell'infanzia (3-6 anni) nei comuni di Bore (PR), Tornolo (PR) e Morfasso (PC) attraverso il ricorso a educatori professionali a completamento del tempo scuola; - allungamento al pomeriggio dell'orario di apertura dei plessi scolastici (primaria, secondaria di primo grado), con offerta di servizi comunali di doposcuola in nove comuni dell'area, a fini di conciliazione con i tempi di lavoro dei genitori nei comuni dell'Area Interna	In corso
EMIAPP08/F	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Bardi	Istruzione	Legge di stabilità	Nel suo complesso l'intervento comprende tre azioni, finalizzate ad arrestare la tendenza allo spostamento della residenza delle famiglie con minori verso centri urbani più grandi: - servizio di baby caring per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) in cinque comuni dell'area; - sostegno alla scuola dell'infanzia (3-6 anni) nei comuni di Bore (PR), Tornolo (PR) e Morfasso (PC) attraverso il ricorso a educatori professionali a completamento del tempo scuola; - allungamento al pomeriggio dell'orario di apertura dei plessi scolastici (primaria, secondaria di primo grado), con offerta di servizi comunali di doposcuola in nove comuni dell'area, a fini di conciliazione con i tempi di lavoro dei genitori nei comuni dell'Area Interna	In corso
EMIAPP08/G	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nei Comuni di Bore e Pellegrino Parmense	Istruzione	Legge di stabilità	Nel suo complesso l'intervento comprende tre azioni, finalizzate ad arrestare la tendenza allo spostamento della residenza delle famiglie con minori verso centri urbani più grandi: - servizio di baby caring per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) in cinque comuni dell'area; - sostegno alla scuola dell'infanzia (3-6 anni) nei comuni di Bore (PR), Tornolo (PR) e Morfasso (PC) attraverso il ricorso a educatori professionali a completamento del tempo scuola; - allungamento al pomeriggio dell'orario di apertura dei plessi scolastici (primaria, secondaria di primo grado), con offerta di servizi comunali di doposcuola in nove comuni dell'area, a fini di conciliazione con i tempi di lavoro dei genitori nei comuni dell'Area Interna	In corso
EMIAPP09	Didattica innovativa: Scuola digitale nell'Area Interna	Istruzione	Legge di stabilità	L'intervento riguarda la dotazione tecnologica e di metodi didattici per la scuola digitale (e-learning), e l'allestimento ed il funzionamento di un "bus digitale" per progetti educativi itineranti tra le scuole; con la finalità di creare una maggiore capacità della scuola primaria e secondaria di primo grado nell'utilizzo del digitale, nelle componenti sia di conoscenza e uso delle tecnologie sia di impiego di nuove metodologie didattiche in 21 plessi appartenenti ai quattro IICC dell'area progetto, con il supporto delle competenze degli esperti di due IICC dell'Area Strategia. Nel complesso, l'intervento coinvolge quindi sei IICC tra Area Progetto ed Area Strategia. L'intervento viene gestito attraverso la costituzione di una rete di scopo tra i sei IICC dell'area. La rete di scopo (DPR 275/99; Legge n.107/2015) ha come finalità di istituzionalizzare la governance delle progettualità scolastiche previste in ambito SNAI, rispondendo da un lato alle esigenze di efficienza nell'organizzazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, dall'altro alla volontà di utilizzare nella maniera più efficace le diverse risorse di conoscenza, competenza ed esperienza esistenti all'interno degli IICC locali. Questo secondo aspetto risponde appieno ad uno dei principi fondanti della Strategia dell'Al Appennino Piacentino Parmense, ovvero la valorizzazione e la condivisione su tutto il territorio delle esperienze di eccellenza già sperimentate con successo in qualche comune dell'area. La rete di scopo è costituita grazie ad una convenzione tra IICC all'indomani dell'approvazione e della firma dell'APQ.	In corso
EMIAPP10	Didattica innovativa: AAA nelle pluriclassi degli IICC dell'Area Interna	Istruzione	Legge di stabilità	L'azione è a sostegno delle pluriclassi e delle piccole classi presenti nell'area (il criterio di individuazione delle piccole classi è la partecipazione di meno di 10 alunni), ovvero di 16 dei 21 plessi complessivi all'interno dei quattro IICC dell'area progetto. La metodologia prevede che più pluri o piccole classi	In corso

				sviluppano progetti comuni sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie e dalla connettività Internet: partecipazione ad aule virtuali nel cui ambito svolgere le attività didattiche di comune interesse, coinvolgimento di esperti esterni in remoto. La metodologia fa ampio uso delle tecnologie ma non dà centralità a questo aspetto. Richiede invece di organizzare il tempo scuola, gli spazi e il materiale didattico, mettendo al centro la relazione educativa, umana, sociale, che la scuola è in grado di attivare al suo interno, tra gli alunni, con i docenti, con i genitori, con il resto della comunità. L'uso delle tecnologie rappresenta in questo quadro un mezzo che offre nuove e interessanti possibilità ampliando il potenziale di scelta e d'azione di tutti coloro che a vario titolo contribuiscono alla vita della comunità scolastica. L'intervento viene gestito attraverso la costituzione di una rete di scuole, che coinvolge sei IICC dell'area, tra cui i quattro interessati dall'intervento (in area progetto). La rete di scopo (DPR 275/99; Legge n.107/2015) ha come finalità di istituzionalizzare la governance delle progettualità scolastiche previste in ambito SNAI, rispondendo da un lato alle esigenze di efficienza nell'organizzazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, dall'altro alla volontà di utilizzare nella maniera più efficace le diverse risorse di conoscenza, competenza ed esperienza esistenti all'interno degli IICC locali. Questo secondo aspetto risponde appieno ad uno dei principi fondanti della Strategia dell'AI Appennino Piacentino Parmense, ovvero la valorizzazione e la condivisione su tutto il territorio delle esperienze di eccellenza già sperimentate con successo in qualche comune dell'area. La rete di scopo è costituita grazie ad una convenzione tra IICC.	
EMIAPP11/A	Percorsi formativi connessi al Polo tecnico-professionale per l'agro-ambiente e lo sviluppo rurale	Formazione	FSE	L'intervento si riferisce alla realizzazione di percorsi formativi connessi all'attività di un Polo tecnico-professionale locale dedicato all'agro-ambiente e allo sviluppo rurale e operante a favore del rafforzamento e della diffusione di competenze teoriche e pratiche su modelli produttivi e imprenditorialità in Appennino	Concluso
EMIAPP11/B	Polo tecnico-professionale agro-ambiente e sviluppo rurale - Progetti innovativi e laboratori	Istruzione	Legge di stabilità	L'intervento contribuisce all'attivazione di un Polo tecnico-professionale dedicato all'agroambiente e allo sviluppo rurale, per il rafforzamento e la diffusione di competenze teoriche e pratiche su: modelli produttivi e imprenditorialità in Appennino; rapporto tra pratiche zootecniche/agroforestali e biodiversità/difesa del suolo in contesti montani; forme di agricoltura multifunzionale in campo educativo, sociale, ricreativo; potenziali di innovazione dell'agricoltura 4.0 o legati all'impiego nelle aziende di tecnologie meccatroniche e digitali, forme innovative per l'agro-industria. In particolare, l'intervento realizza nel Polo nuovi spazi laboratoriali e progetti innovativi sia per la didattica e la ricerca applicata, sia di orientamento ed alternanza finalizzati a contenere la dispersione scolastica	In corso
EMIAPP12/A	Servizi flessibili di trasporto pubblico locale - mobility management e bus intelligenti in Val Nure e Val d'Arda	Mobilità	Legge di stabilità	Con questa azione si vuole migliorare l'efficienza di tali servizi, attraverso la migliore conoscenza della domanda e dell'offerta di trasporto e quindi una conseguente capacità di programmazione degli interventi.	In corso
EMIAPP12/B	Servizi flessibili di trasporto pubblico locale - mobility management e bus intelligenti in Valtaro e Valceno	Mobilità	Legge di stabilità	Con questa azione si vuole migliorare l'efficienza di tali servizi, attraverso la migliore conoscenza della domanda e dell'offerta di trasporto e quindi una conseguente capacità di programmazione degli interventi	In corso
EMIAPP13/A	Acquisto mezzi e gestione del servizio nelle valli piacentine. Consolidamento taxi sociale	Mobilità	Legge di stabilità	Le Piacentine UM della Val Nure e UM Val d'Arda, unitamente alla parmense UM Valli del Taro e del Ceno, organizza e consolida un servizio di trasporto coordinato alle risultanze e alle indicazioni derivanti dal mobility plan definito attraverso l'intervento EMIAPP12. Il miglioramento del parco mezzi, che si avvarrà di quattro nuovi minibus a basso impatto ambientale, consentirà di migliorare l'offerta per le esigenze di spostamento di particolari fasce sociali, in primis anziani e giovani nelle valli piacentine dell'Area Interna. Inoltre, nei periodi dell'anno in cui la domanda di servizi per studenti e cittadinanza tende a rarefarsi, il servizio può essere reindirizzato verso un'utenza turistica, da "educare" ad una fruizione del territorio attraverso mezzi collettivi. Il servizio si protrarrà oltre la durata della strategia a carico delle UM e dei Comuni che partecipano alla realizzazione dell'intervento	Da avviare
EMIAPP13/B	Acquisto mezzi e gestione del servizio nelle Valli Taro e Ceno Consolidamento taxi sociale	Mobilità	Legge di stabilità	L'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno - unitamente alle altre due UUMM coinvolte nella Strategia - organizza e consolida un servizio di trasporto coordinato alle risultanze e alle indicazioni derivanti dal mobility plan definito attraverso l'azione 12. Il miglioramento del parco mezzi, che si avvarrà di due nuovi minibus a basso impatto ambientale, consentirà di migliorare l'offerta per le esigenze di spostamento di particolari fasce sociali, in primis anziani e giovani; inoltre, nei periodi dell'anno in cui la domanda di servizi per studenti e cittadinanza tende a rarefarsi, il servizio può essere reindirizzato verso un'utenza turistica, da "educare" ad una fruizione del territorio attraverso mezzi collettivi. Il servizio si protrarrà oltre la durata della strategia a carico dell'UM e dei Comuni che partecipano alla realizzazione dell'intervento	Da avviare
EMIAPP14	Innovazione organizzativa del sistema agro-silvo-pastorale per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino Piacentino Parmense	Agricoltura	FEASR + Altro privato	Nel territorio si intendono costituire dei Gruppi Operativi per l'Innovazione (GO), che associno centri universitari, centri di formazione locale, consorzi, imprese agricole interessate a investire in nuove attività agricole e silvo pastorali, con l'obiettivo di avviare un'azione finalizzata a individuare i potenziali terreni e proprietari da coinvolgere in iniziative per il recupero produttivo, la sperimentazione di nuove forme di gestione agraria e di certificazione collettiva. Il progetto mira a promuovere una gestione integrata del territorio montano e pedemontano in modo sostenibile, al miglioramento della resilienza del tessuto socioeconomico del territorio e a migliorare il sequestro di carbonio e la mitigazione del cambiamento climatico, promuovendo la ricerca e la sperimentazione di modelli gestionali adatti ad affrontare il tema della frammentazione proprietaria in ambito agrosilvo-pastorale (terreni a bosco e bosco-pascolo), utilizzando nuove modalità organizzative nella istituzione delle filiere	In corso
EMIAPP15	Valorizzazione dei boschi e dei pascoli	Agricoltura	FEASR + Altro privato	L'intervento è finalizzato a valorizzare il patrimonio boschivo intervenendo con priorità sulle criticità legate alla parcellizzazione, anche attraverso la gestione associata dei fondi (boschi e pascoli). La gestione collettiva portata avanti dai Consorzi locali, ha consentito in molti casi di valorizzare la risorsa legno, il sottobosco e i pascoli. D'altro canto, la costante crescita della risorsa bosco è conseguente a due fenomeni interconnessi tra loro: lo spopolamento ed il progressivo abbandono dell'agricoltura in particolare nelle zone di montagna, che porta alla conversione naturale di pascoli e terreni coltivati in foresta	In corso
EMIAPP16	Agricoltura multifunzionale	Agricoltura	FEASR + Altro privato	L'intervento mira a consolidare le esperienze di multifunzionalità e a promuoverne di nuove, in stretta connessione con gli interventi 14 e 15 e l'intervento 18 (Cammini d'Appennino). La multifunzionalità aziendale è una	Concluso

				importante risposta all'abbandono della SAU. Legata in prima istanza al turismo, ma anche a servizi di carattere sociale. Sono già presenti esperienze di agriturismo nell'area così come di fattorie sociali. Proprio queste esperienze rappresentano le principali innovazioni avvenute in anni recenti, che hanno consentito di mantenere sostenibili le piccole realtà produttive	
EMIAPP17/A	Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico della Val d'Arda	Turismo	FESR + Altro privato	Il progetto intende intervenire su una rete diffusa di emergenze storiche, archeologiche e di archeologia industriale della parte piacentina dell'Area Interna, favorendo attraverso il ripristino ed il restauro di manufatti di diverse epoche, la nascita di un circuito storico-culturale delle Valli dell'Arda e del Nure. Tale circuito ha la potenzialità per entrare in rete con il già esistente circuito dei Castelli del Ducato, e si completa con la rete dei Cammini, a sua volta oggetto di intervento all'interno della Strategia dell'AI Appennino Piacentino Parmense. Con questa azione si intende finanziare il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico delle valli piacentine dell'AI, consentendone l'interazione con l'importante patrimonio storico delle Terre del Ducato e con il patrimonio escursionistico-ambientale locale. Grazie a questa iniziativa, allora, l'Area Interna aspira a potenziare l'offerta per la fruizione all'interno dell'organizzazione turistica di area vasta	In corso
EMIAPP17/B	Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico di Ponte dell'Olio	Turismo	FESR + Altro privato	Il progetto intende intervenire su una rete diffusa di emergenze storiche, archeologiche e di archeologia industriale della parte piacentina dell'Area Interna, favorendo attraverso il ripristino ed il restauro di manufatti di diverse epoche, la nascita di un circuito storico-culturale delle Valli dell'Arda e del Nure. Tale circuito ha la potenzialità per entrare in rete con il già esistente circuito dei Castelli del Ducato, e si completa con la rete dei Cammini, a sua volta oggetto di intervento all'interno della Strategia dell'AI Appennino Piacentino Parmense. Con questa azione si intende finanziare il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico delle valli piacentine dell'AI, consentendone l'interazione con l'importante patrimonio storico delle Terre del Ducato e con il patrimonio escursionistico-ambientale locale. Grazie a questa iniziativa, allora, l'Area Interna aspira a potenziare l'offerta per la fruizione all'interno dell'organizzazione turistica di area vasta	Concluso
EMIAPP18/A	Cammini d'Appennino - Percorsi nel Comune di Ponte dell'Olio	Turismo	FESR + Altro privato	L'intervento s'inserisce in una strategia più ampia e sovracomunale finalizzata a promuovere l'Appennino piacentino e parmense come luogo preferenziale per il turismo naturalistico-esperienziale e l'attività all'aria aperta. Rendendo ciclabili in sicurezza alcuni brevi tratti della porzione in territorio di Ponte dell'Olio, si arriva a creare un percorso di circa 25 Km di lunghezza senza eccessive pendenze, adatto ad una fruizione "dolce", sia a piedi che in bicicletta. L'intervento si completa con l'acquisto di 12 biciclette a pedalata assistita e con la realizzazione di cartografia digitalizzata dei percorsi in Val Nure	In corso
EMIAPP18/B	Cammini d'Appennino - Comune di Vernasca	Turismo	FESR + Altro privato	L'intervento favorisce la partecipazione al progetto dei Cammini di Appennino del Comune di Vernasca, interessato dalla stazione di partenza della Trasversale Francigena (Castello di Vigoleno). Grazie ad esso, il comune acquisisce infatti sei e-bike e la relativa strumentazione di supporto, da dare in gestione per la fruizione dei Cammini di Appennino da parte di turisti e visitatori	Concluso
EMIAPP18/C	Cammini d'Appennino - Comune di Farini	Turismo	FESR + Altro privato	L'intervento costituisce il contributo al progetto dei Cammini di Appennino del Comune di Farini, favorendo la valorizzazione ambientale e culturale del sistema delle miniere nel territorio di Farini, attraverso il recupero dei luoghi del lavoro, dall'impianto di trasformazione (rifunzionalizzato a "porta di ingresso" della rete sentieristica, luogo di assistenza ai ciclisti e spazio espositivo) fino all'ambito di estrazione della miniera di Vigonzano. Il nuovo percorso si collega alla rete di percorsi esistenti, che ha attualmente in una porzione della via degli Abati il proprio punto di maggiore interesse. Il percorso progettato dall'ex-fabbrica sul Nure a Vigonzano consente un ampliamento ed un arricchimento dell'offerta escursionistica per la Val Nure e per tutto l'Appennino	In corso
EMIAPP18/D	Cammini d'Appennino - Comune di Bettola	Turismo	FESR + Altro privato	L'intervento prevede la realizzazione di un'area sosta per 10 autocaravan, in prossimità di Pieve di Revigozzo e del Lago dei Pini. L'area rappresenta il luogo di partenza di numerosi percorsi per mountain bike ed escursionistici del comune, collegandosi direttamente con la Cappella dell'Apparizione	Concluso
EMIAPP18/E	Cammini d'Appennino - Percorsi in Valceno	Turismo	FESR + Altro privato	L'intervento concentra l'attenzione su Cammini a particolare valenza ambientale della Val Ceno, mettendoli in rete con altri percorsi escursionistici presenti sul territorio, raccogliendoli in un'offerta omogenea e completa, che declina sport, ambiente, cultura e storia in modo da risultare appetibile a visitatori con interessi diversi	In corso
EMIAPP19	Cooperative di comunità - Supporto all'impresa sociale per la gestione di iniziative turistiche	Turismo	FEASR + Altro privato	L'intervento è finalizzato a sostenere la nascita ed il consolidamento di diverse cooperative di comunità all'interno dell'area. Nell'ambito della Strategia dell'Area Interna, la forma della Cooperative di comunità si propone come strumento primario per la gestione di servizi turistici collegati al patrimonio storico-architettonico ed ambientale rimesso in valore con gli interventi dedicati e finanziati dal FESR (17 e 18), potendo poi evolvere, una volta consolidatasi, in diverse modalità di risposta alle esigenze plurime di mutualità e servizi delle comunità locali	Concluso
EMIAPP19	Cooperative di comunità - Supporto all'impresa sociale per la gestione di iniziative turistiche	Turismo	FEASR	L'intervento è finalizzato a sostenere la nascita ed il consolidamento di diverse cooperative di comunità all'interno dell'area. Nell'ambito della Strategia dell'Area Interna, la forma della Cooperative di comunità si propone come strumento primario per la gestione di servizi turistici collegati al patrimonio storico-architettonico ed ambientale rimesso in valore con gli interventi dedicati e finanziati dal FESR (17 e 18), potendo poi evolvere, una volta consolidatasi, in diverse modalità di risposta alle esigenze plurime di mutualità e servizi delle comunità locali	Concluso
EMIAPP20/A	Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense	Banda Larga	FEASR	Gli interventi sono relativi alla estensione della BUL a tutto il territorio di progetto, con realizzazione di tratte di competenza regionale (dorsali), realizzate da Lepida SpA, e tratte finali di accesso di competenza statale, realizzate da Infratel SpA attraverso il proprio concessionario	In corso
EMIAPP20/B	Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense	Banda Larga	FESR	Gli interventi sono relativi alla estensione della BUL a tutto il territorio di progetto, con realizzazione di tratte di competenza regionale (dorsali), realizzate da Lepida SpA, e tratte finali di accesso di competenza statale, realizzate da Infratel SpA attraverso il proprio concessionario	In corso
EMIAPP21	Rafforzamento e integrazione del sistema locale di protezione civile - Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di accesso e spostamento interno nell'area	Istituzioni	Legge di stabilità	Il progetto concorre al rafforzamento delle funzioni associative di area vasta del partenariato locale, sostanziano dal punto di vista operativo quanto previsto dalla convenzione per la gestione in forma associata della funzione di Protezione Civile ed assicurando in questo modo la continuità futura del servizio anche dal punto di vista operativo	In corso

EMIAPP22	Rafforzamento e integrazione dei servizi informatici	Istituzioni	Legge di stabilità	L'unificazione dei servizi informatici e la nascita di un Centro Elaborazione Dati unico tra le tre Unioni ed il Comune di Bardi è uno dei servizi su cui l'Area Interna ha deciso di puntare per ottemperare al pre-requisito associativo. Al momento i servizi informatici sono unificati tra Comuni per singola Unione, ma la nascita di un CED unico di area vasta va nella direzione della gestione condivisa dei processi di digitalizzazione amministrativa e della riduzione dei divari digitali nell'area, risultati importanti sulla strada del cambiamento. Grazie a questo intervento si inaugura quindi un processo che avrà come esito finale di medio periodo la realizzazione di un sistema informatico integrato tra i comuni dell'Area Interna, in grado di rispondere al meglio ai rischi informatici connessi all'attività amministrativa e di somministrare progressivamente servizi più sofisticati via web ai cittadini. Grazie alla convenzione e all'intervento i Comuni dell'Area Interna raggiungeranno un maggior grado di efficienza informatica, aspetto questo che si riflette sulla capacità di risposta alle esigenze dei cittadini	In corso
EMIAPP23	Assistenza tecnica all'attuazione del programma	Assistenza tecnica	Legge di stabilità	Istituzione di un ufficio di coordinamento e assistenza tecnica per il triennio di attuazione di SNAI, finalizzato alla gestione efficiente della Strategia nell'area attraverso la copertura di una serie articolata di funzioni (indirizzo politico della Strategia, assistenza tecnica agli attuatori degli interventi, diffusione dell'informazione sull'avanzamento della Strategia, sostegno alla raccolta dei dati di monitoraggio, partecipazione a nuovi bandi per i comuni dell'area coerenti con la Strategia).	In corso

Tabella: Avanzamento finanziario degli interventi

Nella tabella l'avanzamento finanziario di ogni intervento è distinto per fonte di finanziamento (Fondo SIE o Legge di Stabilità e, laddove previsto, cofinanziamento indicato con Altro pubblico, se cofinanziamento pubblico locale, o Altro privato) e per ogni fonte una riga.

Intervento codice	Intervento titolo	Fonte finanziamento	Stato intervento	Risorse previste	Risorse impegnate	Risorse pagate
EMIAPP01/A	Infermiere di comunità nell'Appennino Piacentino	Legge di stabilità	In corso	244.000 €	213.905 €	37.380 €
EMIAPP01/B	Infermiere di comunità nell'Appennino Parmense	Legge di stabilità	In corso	244.000 €	37.274 €	13.487 €
EMIAPP01/C	Estensione di Montagna Solidale nell'Appennino piacentino	Legge di stabilità	In corso	29.000 €	16.050 €	6.186 €
EMIAPP01/D	Estensione di Montagna Solidale nell'Appennino parmense	Legge di stabilità	In corso	29.000 €	13.487 €	13.487 €
EMIAPP02	Accesso agevolato alla casa della salute di Bettola	Legge di stabilità	In corso	43.000 €	34.242 €	4.939 €
EMIAPP03	Ricoveri di sollievo - Sostegno alle famiglie di Valtaro e Valceno	Legge di stabilità	In corso	150.000 €	150.000 €	51.298 €
EMIAPP04	Acquisto di automezzo per il trasporto sanitario semplice	Legge di stabilità	In corso	34.000 €	29.476 €	29.476 €
EMIAPP05	Rafforzamento dell'emergenza-urgenza	Legge di stabilità	In corso	180.000 €	180.000 €	54.636 €
EMIAPP06/A	Housing sociale nel comune di Farini	Legge di stabilità	In corso	90.000 €	9.272 €	0 €
EMIAPP06/B	Housing sociale nel comune di Tornolo	Legge di stabilità	In corso	90.000 €	0 €	0 €
EMIAPP07	Efficientamento energetico della RSA di Vernasca	Altro pubblico	In corso	72.000 €	74.680 €	0 €
EMIAPP07	Efficientamento energetico della RSA di Vernasca	FESR	In corso	108.000 €	108.000 €	0 €
EMIAPP08/A	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nei comuni dell'Alta Val Nure: doposcuola	Legge di stabilità	In corso	124.540 €	121.432 €	39.844 €
EMIAPP08/B	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel comune di Morfasso	Legge di stabilità	In corso	88.772 €	88.696 €	45.703 €
EMIAPP08/C	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel comune di Vernasca	Legge di stabilità	In corso	20.412 €	7.440 €	3.543 €
EMIAPP08/D	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Tornolo	Legge di stabilità	Annullato	91.360 €	0 €	0 €
EMIAPP08/E	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Varsi	Legge di stabilità	In corso	27.216 €	27.216 €	3.432 €
EMIAPP08/F	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nel Comune di Bardi	Legge di stabilità	In corso	45.360 €	0 €	0 €
EMIAPP08/G	Conciliazione dei tempi - Azioni di caring per i bambini della fascia 0-13 anni nei Comuni di Bore e Pellegrino Parmense	Legge di stabilità	In corso	45.340 €	40.459 €	32.023 €
EMIAPP09	Didattica innovativa: Scuola digitale nell'Area Interna	Legge di stabilità	In corso	357.000 €	177.696 €	172.809 €
EMIAPP10	Didattica innovativa: AAA nelle pluriclassi degli IICC dell'Area Interna	Legge di stabilità	In corso	176.000 €	97.531 €	77.429 €
EMIAPP11/A	Percorsi formativi connessi al Polo tecnico-professionale per l'agro-ambiente e lo sviluppo rurale	FSE	Concluso	240.000 €	227.808 €	201.057 €
EMIAPP11/B	Polo tecnico-professionale agro-ambiente e sviluppo rurale - Progetti innovativi e laboratori	Legge di stabilità	In corso	160.000 €	63.626 €	60.126 €
EMIAPP12/A	Servizi flessibili di trasporto pubblico locale - mobility management e bus intelligenti in Val Nure e Val d'Arda	Legge di stabilità	In corso	101.500 €	50.457 €	25.608 €
EMIAPP12/B	Servizi flessibili di trasporto pubblico locale - mobility management e bus intelligenti in Valtaro e Valceno	Legge di stabilità	In corso	100.500 €	97.131 €	16.130 €
EMIAPP13/A	Acquisto mezzi e gestione del servizio nelle valli piacentine. Consolidamento taxi sociale	Legge di stabilità	Da avviare	195.000 €	0 €	0 €
EMIAPP13/B	Acquisto mezzi e gestione del servizio nelle Valli Taro e Ceno Consolidamento taxi sociale	Legge di stabilità	Da avviare	97.000 €	0 €	0 €
EMIAPP14	Innovazione organizzativa del sistema agro-silvo-pastorale per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino Piacentino Parmense	Altro privato	In corso	60.000 €	3.936 €	0 €
EMIAPP14	Innovazione organizzativa del sistema agro-silvo-pastorale per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino Piacentino Parmense	FEASR	In corso	340.000 €	59.497 €	0 €
EMIAPP15	Valorizzazione dei boschi e dei pascoli	Altro privato	In corso	0 €	244.435 €	0 €
EMIAPP15	Valorizzazione dei boschi e dei pascoli	FEASR	In corso	700.000 €	1.168.684 €	1.050.910 €
EMIAPP16	Agricoltura multifunzionale	Altro privato	Concluso	130.000 €	1.983.495 €	0 €
EMIAPP16	Agricoltura multifunzionale	FEASR	Concluso	170.000 €	1.327.619 €	374.898 €
EMIAPP17/A	Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico della Val d'Arda	Altro pubblico	In corso	283.047 €	322.929 €	0 €
EMIAPP17/A	Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico della Val d'Arda	FESR	In corso	1.132.188 €	1.132.188 €	578.177 €
EMIAPP17/B	Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico di Ponte dell'Olio	Altro pubblico	Concluso	55.820 €	3.111 €	0 €
EMIAPP17/B	Viaggio nella Storia: circuito storico-archeologico di Ponte dell'Olio	FESR	Concluso	223.278 €	223.278 €	223.278 €
EMIAPP18/A	Cammini d'Appennino - Percorsi nel Comune di Ponte dell'Olio	Altro pubblico	In corso	130.000 €	0 €	0 €
EMIAPP18/A	Cammini d'Appennino - Percorsi nel Comune di Ponte dell'Olio	FESR	In corso	520.000 €	520.000 €	2.329 €

EMIAPP18/B	Cammini d'Appennino - Comune di Vernasca	Altro pubblico	Concluso	3.448 €	0 €	0 €
EMIAPP18/B	Cammini d'Appennino - Comune di Vernasca	FESR	Concluso	13.792 €	23.440 €	23.440 €
EMIAPP18/C	Cammini d'Appennino - Comune di Farini	Altro pubblico	In corso	21.600 €	0 €	0 €
EMIAPP18/C	Cammini d'Appennino - Comune di Farini	FESR	In corso	86.400 €	86.400 €	3.399 €
EMIAPP18/D	Cammini d'Appennino - Comune di Bettola	Altro pubblico	Concluso	10.000 €	0 €	0 €
EMIAPP18/D	Cammini d'Appennino - Comune di Bettola	FESR	Concluso	40.000 €	31.101 €	31.101 €
EMIAPP18/E	Cammini d'Appennino - Percorsi in Valceno	Altro pubblico	In corso	21.000 €	0 €	0 €
EMIAPP18/E	Cammini d'Appennino - Percorsi in Valceno	FESR	In corso	84.000 €	84.000 €	48.682 €
EMIAPP19	Cooperative di comunità - Supporto all'impresa sociale per la gestione di iniziative turistiche	Altro privato	Concluso	160.000 €	6.981 €	0 €
EMIAPP19	Cooperative di comunità - Supporto all'impresa sociale per la gestione di iniziative turistiche	FEASR	Concluso	240.000 €	130.098 €	49.414 €
EMIAPP20/A	Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense	FEASR	In corso	5.869.319 €	6.461.433 €	727.823 €
EMIAPP20/B	Banda Ultra Larga in Appennino Piacentino Parmense	FESR	In corso	258.955 €	258.955 €	44.518 €
EMIAPP21	Rafforzamento e integrazione del sistema locale di protezione civile - Miglioramento della sicurezza e delle condizioni di accesso e spostamento interno nell'area	Legge di stabilità	In corso	650.000 €	300.852 €	143.230 €
EMIAPP22	Rafforzamento e integrazione dei servizi informatici	Legge di stabilità	In corso	140.000 €	44.688 €	0 €
EMIAPP23	Assistenza tecnica all'attuazione del programma	Legge di stabilità	In corso	187.000 €	151.361 €	56.808 €

3.5 Esperienze e buone pratiche dal territorio

Da gennaio a dicembre 2022 si è compiuta la seconda annualità dell'attuazione dell'APQ. Nel corso di questa annualità sono stati avviati 9 dei 12 interventi segnalati come "in attesa di avvio" nella scorsa rendicontazione di avanzamento (giugno 2022 per l'annualità 2021). Ad essi si aggiungono i 15 interventi appostati su fondi SIE (FESR, FSE e FEASR), che a oggi risultano tutti avviati.

Considerando i soli interventi a finanziamento nazionale, i 16 soggetti attuatori (due AUSL, due Agenzie per la mobilità, due Istituti scolastici capofila di altrettante reti di scuole, due Unioni di Comuni e otto Comuni) hanno raggiunto oggi il seguente grado di attivazione dei rispettivi progetti:


- EMIAPP01/A, EMIAPP01/C, EMIAPP02, EMIAPP05: soggetto attuatore AUSL Piacenza. Tutti gli interventi sono in corso al 31/12/2022 e proseguono secondo il cronoprogramma. L'attuatore segnala un notevole apprezzamento da parte dei comuni coinvolti per quanto concerne in particolare EMIAPP01/C (Montagna solidale).
- EMIAPP01/B, EMIAPP01/D, EMIAPP03, EMIAPP04: soggetto attuatore AUSL Parma. Tutti gli interventi sono in corso al 31/12, anche se con diverso grado di maturazione: EMIAPP01/B (Infermiere di comunità nell'Appennino Parmense) si è limitato ad acquistare il mezzo per le trasferte di personale, non essendo ancora stata individuata la figura a cui affidare il previsto incarico; EMIAPP01/D ed EMIAPP04 hanno di fatto esaurito la spesa e l'attività per EMIAPP04 (Acquisto di automezzo per il trasporto sanitario) prosegue con l'utilizzo del mezzo, peraltro con prestazioni degli indicatori (numero di km percorsi) decisamente superiori a quanto preventivato. EMIAPP03 (Ricoveri di sollievo in Valceno) prosegue secondo cronoprogramma.
- EMIAPP06/A (Housing sociale): soggetto attuatore Comune di Farini. L'intervento risulta avviato solo per il completamento della progettazione esecutiva; un primo bando per la realizzazione dei lavori è andato deserto e un nuovo bando è previsto entro il primo semestre del 2023.
- EMIAPP08/A, EMIAPP08/B, EMIAPP08/C, EMIAPP08/E, EMIAPP08/F, EMIAPP08/G (conciliazione dei tempi): soggetti attuatori Unione Alta Val Nure, Comune di Morfasso, Comune di Vernasca, Comune di Varsi, Comune di Bardi, Comune di Bore. Tutti gli interventi risultano avviati ed incontrano l'apprezzamento della popolazione, tanto che per due di essi (EMIAPP08/B ed EMIAPP08/E) l'iniziativa sarà proseguita al termine di SNAI grazie al nuovo finanziamento intercettato con l'Investimento M5C3 Inv. 1.1 del PNRR. Dei progetti di questo grappolo, si segnala anche la modifica di EMIAPP08/G nella parte relativa al Comune di Bore, con arricchimento dell'attività da semplice doposcuola a vero e proprio progetto pedagogico territoriale, con incremento dei costi e necessità di copertura attraverso fondi comunali e nuove risorse da stornare da altri interventi. Infine, da rimarcare l'avvio a settembre 2022 dell'intervento nel Comune di Bardi (ritardato di un anno per la mancanza della certificazione antisismica della struttura ospitante, oggi risolta), anche se al 31/12/2022 ancora senza effettuare i relativi impegni e pagamenti.
- EMIAPP09 ed EMIAPP10 (Didattica innovativa): attuatore l'IC della Val Nure come capofila di rete di scuole. Il progetto prosegue come da cronoprogramma con l'acquisto e l'utilizzo delle attrezzature previste e l'impiego delle risorse umane; all'interno di EMIAPP09, si segnala l'attività del *digital school bus*, secondo programma e con piena soddisfazione degli utenti (www.digitalschoolbus.it/).
- EMIAPP11/B (Polo tecnico-professionale agro-ambiente - Progetti innovativi e laboratori): attuatore IIS Zappa-Fermi come capofila di rete di scuole. Il progetto è stato avviato con

l'acquisto dell'attrezzatura, ma l'allestimento dei due laboratori previsti non è ancora completato perché in attesa di lavori di sistemazione a carico del proprietario dello stabile (la Provincia di Parma). I lavori dovrebbero essere realizzati nell'estate 2023, di modo da rendere perfettamente funzionanti i laboratori per l'avvio dell'anno scolastico 2023-24.

- EMIAPP12/A, EMIAPP12/B (Servizi flessibili di TPL): attuatori Tempi Agenzia Piacenza e SMTP Parma. Entrambi gli interventi proseguono secondo cronoprogramma. Per quanto concerne EMIAPP12/B, si segnala l'insoddisfacente risultato di un'azione (trasporto a chiamata nel periodo estivo a Varsi), che ne prevedrà la ricollocazione nella annualità successiva e la necessità – come ipotizzato fin dal principio – di reperire risorse per il completamento della seconda annualità (periodo gennaio-giugno) del servizio di TPL scolastico.
- EMIAPP21 (Rafforzamento sistema locale di protezione civile): attuatore Unione Alta Val Nure. Il progetto prosegue con soddisfazione come da cronoprogramma. Proprio perché trasversale e di interesse per ogni membro, il partenariato lo ha indicato come progetto a cui destinare parte delle risorse suppletive (300.000 euro) stanziata dalla delibera CIPESS.
- EMIAPP22 (Rafforzamento e integrazione dei servizi informatici): attuatore Unione Valli Taro e Ceno. Al 31/12 sono state bandite e terminate le istruttorie di gara relative ad alcune categorie di attrezzature, ma la spesa sarà avviata solo nel 2023.
- EMIAPP23 (AT all'attuazione del programma): attuatore Unione Alta Val Nure. L'intervento prosegue secondo cronoprogramma per due delle tre figure di AT previste. Per la terza figura (supporto nella ricerca di nuovi finanziamenti), è prevista l'attivazione della gara per la seconda metà del 2023.

4 APQ BASSO FERRARESE

Di seguito si propone una rappresentazione generale dello stato di attuazione dell'APQ Basso Ferrarese, estratta dal cruscotto di monitoraggio SNAI, che fornisce una panoramica sulle informazioni generali relative all'avanzamento dei progetti finanziati nell'area ma anche un riepilogo dei comuni e una mappa dell'area interna.

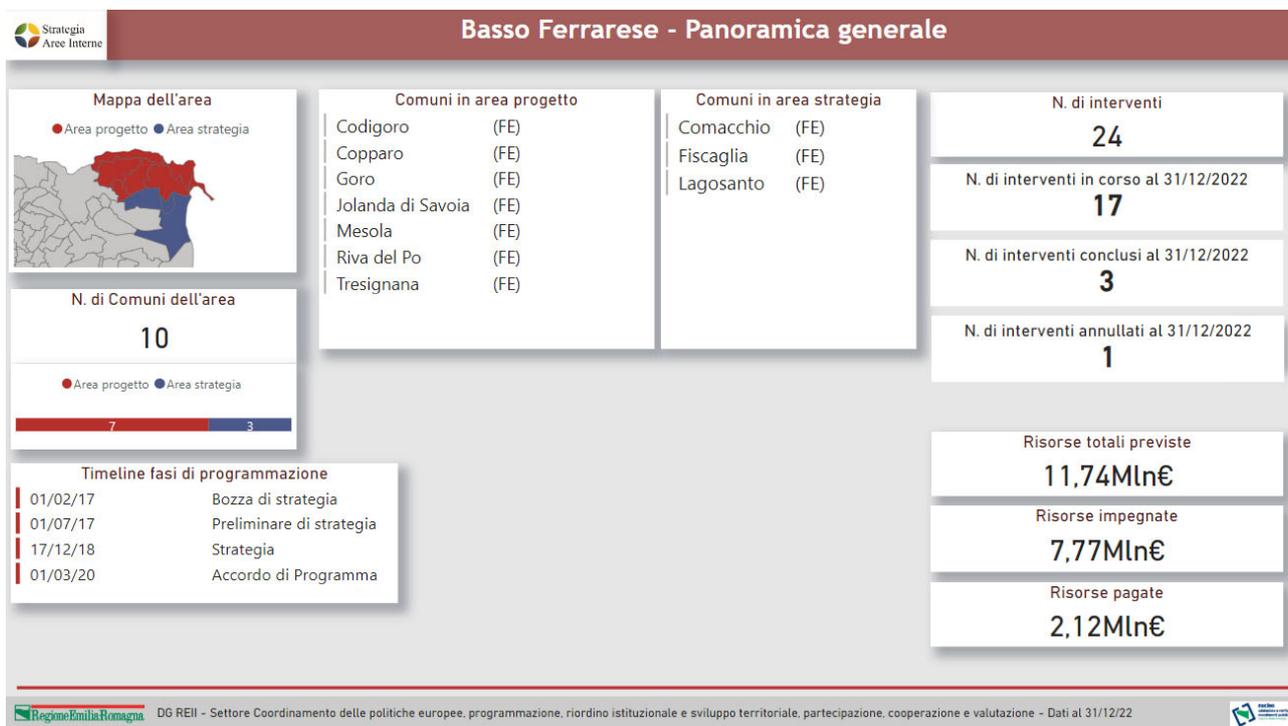

4.1 Inquadramento giuridico APQ

AREA INTERNA	Assegnazione risorse	Approvazione strategia		Approvazione schema di Accordo di Programma	Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro
		DGR n. 2204 del 17/12/2018	DGR n. 931 del 18/06/2019		
BASSO FERRARESE	Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015	DGR n. 2204 del 17/12/2018	DGR n. 931 del 18/06/2019	10 giugno 2020	

4.2 Avanzamento finanziario

Risorse Totali previste /programmate (mil/€)	Risorse impegnate (mil/€)	Risorse pagate (mil/€)
11,74	7,77	2,12

Grafico: Avanzamento finanziario per Settore e per Fonte di finanziamento


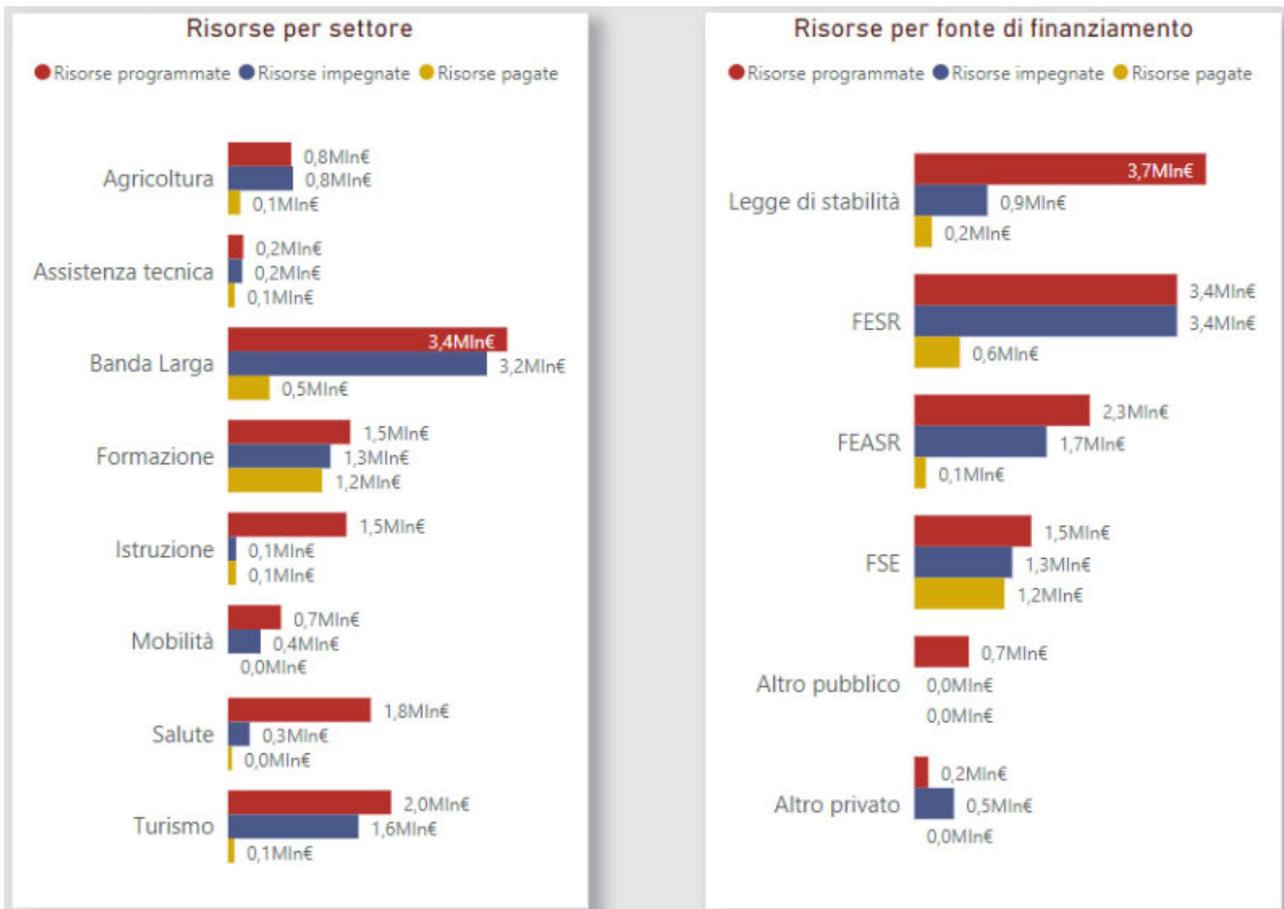


Grafico: Numero di interventi per Settore, per Fonte di finanziamento e tipologia intervento

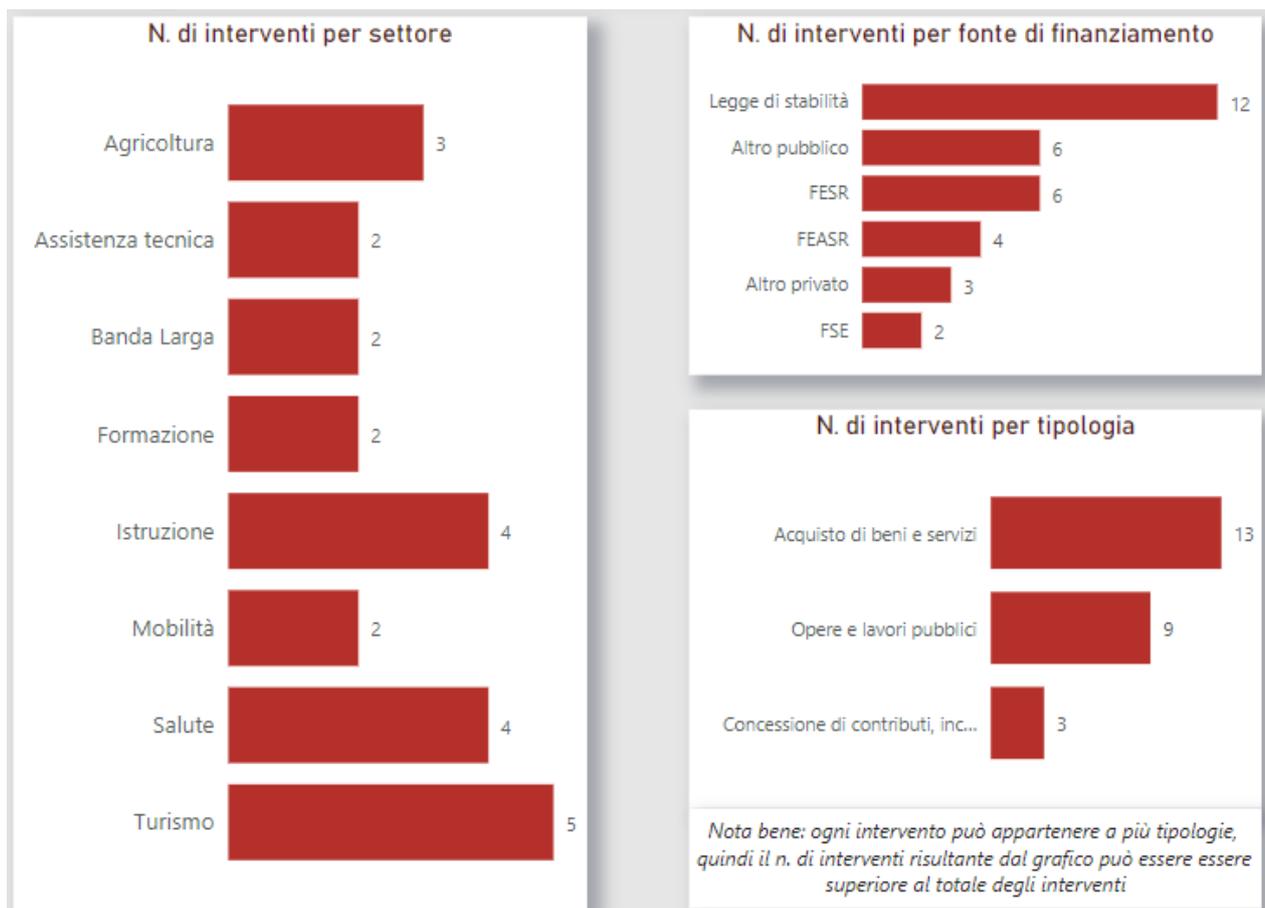

4.3 Stato di attuazione degli interventi

AREA	N. di interventi previsti in APQ	N. di interventi in corso	N. di interventi conclusi	N. di interventi da avviare	N. di interventi annullati
Basso Ferrarese	24	17	3	3	1*

* Vedi quanto descritto nella panoramica generale

4.4 Tabelle esplicative degli interventi

Tabella: Anagrafica degli interventi

Codice intervento	Titolo intervento	Settore intervento	Fonte finanziamento	Intervento oggetto	Stato intervento
EMIBF01	Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio.	Salute	Legge di stabilità	Utilizzo della telemedicina come strumento innovativo per superare le barriere organizzative ed operative soprattutto per anziani e per malati cronici dell'area oggetto dell'intervento	In corso
EMIBF02/A	Co3 – Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale	Salute	Legge di stabilità	Sviluppo di un processo di promozione di cittadinanza attiva, lavoro e innovazione sociale, con l'obiettivo di supportare nuove espressioni di mutualità, attraverso il modello della cooperazione di comunità, per l'attivazione di presidi territoriali e comunitari rivolti alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto in frazioni carenti di servizi, sia di presidio pubblico (es. ufficio postale) che privato (es. negozio) L'intervento si colloca all'interno del Distretto Centro Nord; un intervento parallelo sarà condotto all'interno del Distretto Sud Est	In corso
EMIBF02/B	Co3 – Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale	Salute	Legge di stabilità	Sviluppo di un processo di promozione di cittadinanza attiva, lavoro e innovazione sociale, con l'obiettivo di supportare nuove espressioni di mutualità, attraverso il modello della cooperazione di comunità, per l'attivazione di presidi territoriali e comunitari rivolti alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto in frazioni carenti di servizi, sia di presidio pubblico (es. ufficio postale) che privato (es. negozio) L'intervento si colloca all'interno del Distretto Sud Est; un intervento parallelo sarà condotto all'interno del Distretto Centro Nord	In corso
EMIBF03	M.A.I + soli: Minori e Anziani Insieme	Salute	Legge di stabilità	Sperimentazione di una serie di interventi di mixité generazionale, che favoriscano da un lato l'active aging delle persone anziane, dall'altro la riabilitazione sociosanitaria dei giovanissimi che non possono contare su contesti famigliari accidentati, facendo di questa Area Strategica, un cluster sperimentale di welfare intergenerazionale	Da avviare
EMIBF04/A	In&Out- Nella scuola per andare oltre la scuola - Cittadini di domani	Istruzione	Legge di stabilità	Sviluppo di un sistema formativo 2.0, sia dal punto di vista delle attrezzature (LIM, Tablet, robotica, Stampante 3D, Notebook, arredo) che dell'offerta didattica, sia per i docenti che per gli studenti	In corso
EMIBF04/B	In&Out- Nella scuola per andare oltre la scuola - Cittadini di domani	Istruzione	Legge di stabilità	Sviluppo di un sistema formativo 2.0, sia dal punto di vista delle attrezzature che dell'offerta didattica, sia per i docenti che per gli studenti.	Concluso
EMIBF05/A	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. CampusDelta – Interventi edilizi	Istruzione	Legge di stabilità + Altro pubblico	Sistemazione spazi/aule da adibire a sale mensa e/o sale polifunzionali per attività extra-scolastiche; - sistemazione aree esterne e di pertinenza agli spazi dell'edificio scolastico, rendendo in particolare fruibili e migliorate le aree sportive già esistenti ma in situazione di degrado; - iniziative di supporto per il dopo-scuola in orario pomeridiano	Da avviare
EMIBF05/B	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. CampusDelta – Laboratori	Istruzione	Legge di stabilità	Infrastrutturazione di spazi e laboratori nei quali gli studenti possano trascorrere del tempo o per approfondire temi affrontati in classe o in attesa di altre attività pomeridiane o per vivere esperienze che altrimenti non rientrano nel normale curriculum. Il tutto nell'ottica di massima implementazione delle competenze trasversali, della multidisciplinarietà, della progettazione di attività di gruppo che coinvolgono studenti di più indirizzi o della realizzazione di particolari progetti per gruppi classe interi.	Da avviare
EMIBF06	PECo – Patto Educativo di Comunità. Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico	Formazione	FSE	Sottoscrizione di un Patto Educativo di Comunità, in cui tutti i soggetti coinvolti – genitori, insegnanti, agenzie educative e professionali, la comunità – partecipino all'obiettivo di contrastare l'abbandono scolastico, grazie ad un orientamento più mirato nella scelta della scuola superiore e a percorsi sperimentali "ponte" tra scuola e formazione professionale	Concluso
EMIBF07	GoToJob. Promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità	Formazione	FSE	Azioni di sostegno all'occupazione e alla creazione di impresa, attraverso iniziative formative finalizzate ad innalzare le competenze delle persone nella direzione dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro stesso	Concluso
EMIBF08	Mobility Management - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale	Mobilità	Legge di stabilità	Il progetto si pone la finalità di realizzare un mix di soluzioni di servizi di trasporto, supportando l'utilizzo del trasporto pubblico, applicando il paradigma della sharing economy per offrire una mobilità di base a tutti, anche alle persone con difficoltà motoria, in particolare verso 5 poli individuati come strategici (Ospedale del Delta, Ospedale di Cona, Polo scolastico di Codigoro, Case della salute di Copparo e Codigoro), anche grazie alla realizzazione di una piattaforma web	In corso
EMIBF09	Soluzioni per la mobilità locale	Mobilità	Legge di stabilità	Interventi di integrazione del TPL sia attraverso l'incremento di mezzi collettivi, sia con l'ottimizzazione della gestione del sistema di trasporto, pubblico e privato. Gli obiettivi sono i seguenti: - offrire una mobilità di base a tutti, anche a coloro che hanno difficoltà motorie, in tutte le aree del basso ferrarese che afferiscono ai poli individuati, comprese quelle dove i servizi tradizionali di trasporto pubblico risulterebbero grandemente inefficienti; - realizzare una alternativa di servizio nelle aree dove non è erogato il trasporto pubblico tradizionale ed estendere il servizio di trasporto nelle zone e nelle località attualmente non raggiunte dal servizio convenzionale	In corso
EMIBF10/A	Metropoli di paesaggio: le prime fermate COPPARO	Turismo	FESR + Altro pubblico	Il risultato che si intende perseguire è la costruzione di un sistema infrastrutturale continuo che consenta di impostare un sistema permanente di servizi per la promozione del territorio attraverso il turismo slow e la mobilità lenta alternativa all'auto.	In corso
EMIBF10/B	Metropoli di paesaggio: le prime fermate RIVA DEL PO	Turismo	FESR + Altro pubblico	Il risultato che si intende perseguire è la costruzione di un sistema infrastrutturale continuo che consenta di impostare un sistema permanente di servizi per la promozione del territorio attraverso il turismo slow e la mobilità lenta alternativa all'auto.	In corso
EMIBF10/C	Metropoli di paesaggio: le prime fermate TRESIGNANA	Turismo	FESR + Altro pubblico	Il risultato che si intende perseguire è la costruzione di un sistema infrastrutturale continuo che consenta di impostare un sistema permanente di servizi per la promozione del territorio attraverso il turismo slow e la mobilità lenta alternativa all'auto.	In corso
EMIBF10/D	Metropoli di paesaggio: le prime fermate FISCAGLIA	Turismo	FESR + Altro pubblico	Il risultato che si intende perseguire è la costruzione di un sistema infrastrutturale continuo che consenta di impostare un sistema	In corso

				permanente di servizi per la promozione del territorio attraverso il turismo slow e la mobilità lenta alternativa all'auto.	
EMIBF10/E	Metropoli di paesaggio: le prime fermate CODIGORO	Turismo	FESR + Altro pubblico	Il risultato che si intende perseguire è la costruzione di un sistema infrastrutturale continuo che consenta di impostare un sistema permanente di servizi per la promozione del territorio attraverso il turismo slow e la mobilità lenta alternativa all'auto.	In corso
EMIBF11	Agricoltura di precisione. Sensori integrati per il Diario di campo e il monitoraggio dell'agricoltura biologica	Agricoltura	FEASR + Altro pubblico	Il Piano apporta un incremento dell'attività di innovazione delle imprese, in termini di tecnologie e metodologie di misura, nonché sulla dimostrazione della sostenibilità economica e ambientale delle pratiche agronomiche biologiche. Nel progetto verranno applicati principi di "ecologica" per ottimizzare l'utilizzo di input verso le colture oggetto di sperimentazione: passeremo dal paradigma di fabbisogni della coltura al paradigma dello "strettamente necessario" che permetterà di ottimizzare, attraverso un approccio integrato di rilevazione ed elaborazione dei dati, ogni tipo di attività agronomica. Preliminare sarà valutare la presenza di un livello adeguato di sostanza organica nei terreni e nel caso di indice insoddisfacenti sarà cura riportare a livelli di sostenibilità riproduttiva i suoli e attraverso l'apporto di sostanza organica, un uso consapevole delle precessioni colturali e l'utilizzo di cover crops come strumento migliorativo del terreno	In corso
EMIBF12	Il paniere dei prodotti dell'Area Interna	Agricoltura	FEASR + Altro pubblico	L'intervento proposto vuole sostenere e promuovere la creazione e il rafforzamento di aggregazioni, orizzontali o verticali, per rafforzare la fase di commercializzazione delle produzioni finali in un ambito di mercato locale. Questo obiettivo potrà essere realizzato attraverso la valorizzazione dell'aggregazione e dell'integrazione dell'offerta agricola all'interno della filiera agroalimentare, valorizzando le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, nonché la sua sostenibilità ambientale. Il processo prende avvio dall'individuazione di alcune produzioni tipiche con forte legame col territorio e si conclude con un accordo per il ritiro del prodotto con la grande distribuzione, che intende sviluppare la filiera locale come diversificazione dell'offerta merceologica, con forte stagionalità e con quantità limitate. Nel mezzo si pongono almeno tre azioni da sviluppare e possibilmente incentivare: - la certificazione, per lo sviluppo di filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata, - il pretrattamento o la prima lavorazione, per rafforzare la filiera e avvicinare i produttori ai bisogni di acquisto dei consumatori, - il supporto alla logistica come creazione di modelli organizzativi e formule commerciali innovative	Annullato
EMIBF13	Agricoltura sociale	Agricoltura	FEASR + Altro pubblico	L'intervento è finalizzato alla creazione di occupazione di qualità per soggetti svantaggiati, e agirà su due direttrici: da una parte il coinvolgimento di imprese agricole per aumentare e migliorare la produzione attraverso interventi di messa a coltura di un numero maggiori di ettari, fornendo all'agricoltore sia attrezzature che supporto; dall'altra, il recupero di uno spazio per la comunità, sia in senso didattico che per la promozione dei prodotti e dei risultati del progetto	In corso
EMIBF14/A	BUL in Area Interna	Banda Larga	FESR	Individuazione aree bianche non coperte dalla connessione in fibra Regolamentazione dei rapporti tra i comuni beneficiari e Lepida (affidamento da parte di Comuni/Unioni a LepidaSpA dei compiti esecutivi e delle funzioni operative per la predisposizione delle azioni necessarie) Individuazione delle aree nelle quali installare i tralicci Realizzazione delle opere necessarie e connessione Gli interventi previsti nel territorio dell'area progetto del Basso Ferrarese, in virtù dell'appartenenza all'area della SNAI, rientrano nella fase 1 di realizzazione, relativa alle annualità 2017-2018 (stime di tempistica relativa alle fasi realizzazione). Nell'area progetto, considerando gli interventi finanziati con fondi FESR, FEASR ricadono: • 8 interventi di dorsale, 3 finanziati con il FEASR e 5 con il FESR; • 8 interventi di accesso finale, 3 finanziati con il FEASR e 5 con il FESR; Per quanto riguarda gli interventi di accesso finale Infratel Italia SpA ha effettuato l'aggiudicazione definitiva efficace al concessionario Open Fiber spa: sono in fase avanzata le progettazioni di queste tratte, la cui realizzazione dovrà avvenire nella fase temporale prevista dalla dalla Convenzione (nel Piano Tecnico) tra Regione Emilia- Romagna e MISE	In corso
EMIBF14/B	BUL in Area Interna	Banda Larga	FEASR	Individuazione aree bianche non coperte dalla connessione in fibra Regolamentazione dei rapporti tra i comuni beneficiari e Lepida (affidamento da parte di Comuni/Unioni a LepidaSpA dei compiti esecutivi e delle funzioni operative per la predisposizione delle azioni necessarie) Individuazione delle aree nelle quali installare i tralicci Realizzazione delle opere necessarie e connessione Gli interventi previsti nel territorio dell'area progetto del Basso Ferrarese, in virtù dell'appartenenza all'area della SNAI, rientrano nella fase 1 di realizzazione, relativa alle annualità 2017-2018 (stime di tempistica relativa alle fasi realizzazione). Nell'area progetto, considerando gli interventi finanziati con fondi FESR, FEASR ricadono: • 8 interventi di dorsale, 3 finanziati con il FEASR e 5 con il FESR; • 8 interventi di accesso finale, 3 finanziati con il FEASR e 5 con il FESR; Per quanto riguarda gli interventi di accesso finale Infratel Italia SpA ha effettuato l'aggiudicazione definitiva efficace al concessionario Open Fiber spa: sono in fase avanzata le progettazioni di queste tratte, la cui realizzazione dovrà avvenire nella fase temporale prevista dalla dalla Convenzione (nel Piano Tecnico) tra Regione Emilia- Romagna e MISE	In corso
EMIBF15	Supporto all'attuazione della strategia	Assistenza tecnica	Legge di stabilità	Supporto all'attuazione della strategia, alla gestione delle attività previste e al monitoraggio degli interventi	In corso
EMIBF16	Rete di aree interne	Assistenza tecnica	Legge di stabilità	Creazione di una rete strutturata di scambio e collaborazione con i territori oggetto della SNAI, nella logica di creazione della Federazione delle Aree Interne indicata più volte come step fondamentale e necessario al definitivo consolidamento della Strategia	In corso

Tabella: Avanzamento finanziario degli interventi

Nella tabella l'avanzamento finanziario di ogni intervento è distinto per fonte di finanziamento (Fondo SIE o Legge di Stabilità e, laddove previsto, cofinanziamento indicato con Altro pubblico, se cofinanziamento pubblico locale, o Altro privato) e per ogni fonte una riga.

Intervento codice	Intervento titolo	Fonte finanziamento	Stato intervento	Risorse previste	Risorse impegnate	Risorse pagate
EMIBF01	Tele Home Care. Strumenti di integrazione e modelli organizzativi per la continuità assistenziale ospedale-territorio.	Legge di stabilità	In corso	600.000 €	230.678 €	35.279 €
EMIBF02/A	Co3 – Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale	Legge di stabilità	In corso	125.000 €	34.999 €	12.427 €
EMIBF02/B	Co3 – Cooperazione, Comunità, Coesione. La cooperazione di comunità per la coesione sociale	Legge di stabilità	In corso	125.000 €	0 €	0 €
EMIBF03	M.A.I + soli : Minori e Anziani Insieme	Legge di stabilità	Da avviare	900.000 €	0 €	0 €
EMIBF04/A	In&Out- Nella scuola per andare oltre la scuola - Cittadini di domani	Legge di stabilità	In corso	88.840 €	68.525 €	66.265 €
EMIBF04/B	In&Out- Nella scuola per andare oltre la scuola - Cittadini di domani	Legge di stabilità	Concluso	31.160 €	31.023 €	31.023 €
EMIBF05/A	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. CampusDelta – Interventi edilizi	Altro pubblico	Da avviare	300.000 €	0 €	0 €
EMIBF05/A	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. CampusDelta – Interventi edilizi	Legge di stabilità	Da avviare	967.720 €	0 €	0 €
EMIBF05/B	In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. CampusDelta – Laboratori	Legge di stabilità	Da avviare	65.000 €	0 €	0 €
EMIBF06	PECo – Patto Educativo di Comunità. Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico	FSE	Concluso	500.000 €	410.296 €	309.058 €
EMIBF07	GoToJob. Promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità	FSE	Concluso	1.000.000 €	845.667 €	845.667 €
EMIBF08	Mobility Management - Riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale	Legge di stabilità	In corso	90.280 €	0 €	0 €
EMIBF09	Soluzioni per la mobilità locale	Legge di stabilità	In corso	560.000 €	400.000 €	0 €
EMIBF10/A	Metropoli di paesaggio: le prime fermate COPPARO	Altro pubblico	In corso	132.560 €	0 €	0 €
EMIBF10/A	Metropoli di paesaggio: le prime fermate COPPARO	FESR	In corso	530.240 €	530.240 €	0 €
EMIBF10/B	Metropoli di paesaggio: le prime fermate RIVA DEL PO	Altro pubblico	In corso	47.440 €	0 €	0 €
EMIBF10/B	Metropoli di paesaggio: le prime fermate RIVA DEL PO	FESR	In corso	189.760 €	189.700 €	13.457 €
EMIBF10/C	Metropoli di paesaggio: le prime fermate TRESIGNANA	Altro pubblico	In corso	120.000 €	0 €	0 €
EMIBF10/C	Metropoli di paesaggio: le prime fermate TRESIGNANA	FESR	In corso	480.000 €	480.000 €	63.247 €
EMIBF10/D	Metropoli di paesaggio: le prime fermate FISCAGLIA	Altro pubblico	In corso	40.000 €	0 €	0 €
EMIBF10/D	Metropoli di paesaggio: le prime fermate FISCAGLIA	FESR	In corso	160.000 €	160.000 €	0 €
EMIBF10/E	Metropoli di paesaggio: le prime fermate CODIGORO	Altro pubblico	In corso	60.000 €	0 €	0 €
EMIBF10/E	Metropoli di paesaggio: le prime fermate CODIGORO	FESR	In corso	240.000 €	240.000 €	0 €
EMIBF11	Agricoltura di precisione. Sensori integrati per il Diario di campo e il monitoraggio dell'agricoltura biologica	Altro privato	In corso	40.000 €	406.309 €	0 €
EMIBF11	Agricoltura di precisione. Sensori integrati per il Diario di campo e il monitoraggio dell'agricoltura biologica	FEASR	In corso	360.000 €	139.375 €	0 €
EMIBF12	Il paniere dei prodotti dell'Area Interna	Altro privato	Annullato	15.000 €	0 €	0 €
EMIBF12	Il paniere dei prodotti dell'Area Interna	FEASR	Annullato	35.000 €	0 €	0 €
EMIBF13	Agricoltura sociale	Altro privato	In corso	125.000 €	102.204 €	0 €
EMIBF13	Agricoltura sociale	FEASR	In corso	200.000 €	150.000 €	149.548 €
EMIBF14/A	BUL in Area Interna	FESR	In corso	1.769.303 €	1.769.303 €	508.631 €
EMIBF14/B	BUL in Area Interna	FEASR	In corso	1.656.342 €	1.406.977 €	0 €
EMIBF15	Supporto all'attuazione della strategia	Legge di stabilità	In corso	130.000 €	118.007 €	35.402 €
EMIBF16	Rete di aree interne	Legge di stabilità	In corso	57.000 €	55.483 €	46.427 €

4.5 Esperienze e buone pratiche dal territorio

Gli interventi inseriti nella Strategia SNAI *“Fare Ponti”* sono ad un buon livello di attuazione, l’80% dei progetti è partito e alcuni sono già finiti e rendicontati. Si tratta di un risultato soddisfacente, se si considera che l’attuazione è partita con la firma dell’Accordo di Programma Quadro a maggio 2020, in piena pandemia.

In particolare, il progetto sul tele-monitoraggio di AUSL è partito con la sperimentazione su 40 pazienti residenti nell’area interna, e verrà poi esteso a tutta la provincia, con risorse PNRR. Entrambi i percorsi sulla cooperazione di comunità sono stati avviati, nel Comune di Copparo è partito a settembre 2022 il servizio di doposcuola realizzato da un nuovo ramo di attività di una cooperativa del territorio, in cui sono impegnati i giovani del paese. Anche i laboratori digitali degli Istituti Comprensivi di Copparo-Riva del Po e Tresignana sono già attivi e rendicontati, i primi ragazzi sono entrati in laboratorio già nell’aprile del 2022. Sono in fase di allestimento anche i 3 laboratori previsti presso l’Istituto Guido Monaco di Pomposa, che risponderanno alle esigenze di supportare le competenze dei ragazzi, inclusi gli studenti del corso di studi in meccanica e mecatronica, partito nel 2019. Le attività formative dedicate ai disoccupati (Go to Job), si sono concluse nel corso del 2021, mentre le azioni del Patto Educativo di Comunità (PECO) a giugno 2022.

Proseguendo nella disamina degli interventi previsti, si è conclusa anche la gara per l’acquisto degli 8 pulmini previsti dalla Scheda dedicata al trasporto sociale, che verranno consegnati ai Comuni entro il mese di giugno 2023. La consegna prevista inizialmente per settembre 2022 ha subito un ritardo dovuto al conflitto in Ucraina, che ha portato all’allungarsi dei tempi per l’arrivo dei mezzi. Grazie allo stanziamento di ulteriori 300mila € previsti dalla Delibera CIPESS 41/2022, il servizio di trasporto dedicato alle fasce fragili della popolazione previsto inizialmente per 12 mesi, potrà essere esteso fino a 48 mesi. Anche il progetto *“Metropoli di paesaggio: le prime fermate”*, finanziato con fondi FESR 2014-20 e dedicato alla valorizzazione turistica delle vie d’acqua dei Comuni di Codigoro, Riva del Po, Copparo, Tresignana e Fiscaglia attraverso la realizzazione di infrastrutture per il turismo sostenibile è pressoché realizzato. I Comuni di Fiscaglia, Tresignana e Riva del Po hanno già concluso il progetto, e Copparo e Codigoro arriveranno al collaudo entro il 31/12/2023 al più tardi.

Il progetto PECO (EMIBF06), un patto educativo di comunità capofilato dal CFP Cesta e finanziato nella Strategia dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il FSE, che ha l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica con un percorso centrato sulla persona e strutturato all’interno dei contesti scolastici (12 istituti scolastici) e amministrativi locali (9 Comuni, ASP, ASL, CPIA), ha previsto: l’introduzione di nuovi servizi educativi (centri di ascolto per attività di counselling ed orientamento verso allievi, insegnanti e famiglie fin dalla scuola secondaria di primo grado); la creazione di un Tavolo istituzionale multi-disciplinare incentrato sulla dispersione scolastica; la definizione di linee guida innovative sulla dispersione scolastica; la definizione di nuove figure professionali, in grado di collegare la scuola alla famiglia; momenti di raccordo tra scuola, impresa e territorio.

Da questo punto di vista, il Patto educativo si configura come una grande strategia che prende coscienza della significativa dispersione scolastica presente nel territorio, cerca di invertire una tendenza e innescare un cambiamento socioculturale. Il PECO è cresciuto negli anni, fino a diventare un case study di livello nazionale, scelto tra i 15 progetti sulla povertà educativa inseriti nello studio del Forum Disuguaglianze e Diversità, e oggetto di interesse di numerose realtà che ne hanno approfondito contenuti e metodo. La consapevolezza acquisita dai soggetti coinvolti, ovvero l’importanza del lavoro comune e della condivisione di criticità e ricerca di soluzioni, ha portato il CFP Cesta ad andare oltre, e a candidarsi nella call 2021 di Erasmus+, con il Progetto EARS, finanziato

dal Programma e che per tre anni porterà l'area del basso ferrarese a confrontarsi con altre realtà a livello europeo.


Grazie all'esperienza del PECO, si è diffusa la consapevolezza negli attori locali, istituzionali e non, dell'importanza del contrasto all'abbandono scolastico, che resta prioritario per la comunità. In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con il forte impulso dei Sindaci dell'area interna, si è avviata da gennaio 2023 (DGR Num. 2245 del 19/12/2022) una prima esperienza di Hub territoriale di contrasto alla dispersione scolastica. Nel territorio regionale è presente un unico centro provinciale per la presa in carico individualizzata dei ragazzi che abbandonano la scuola prima di aver concluso il percorso in obbligo, mentre grazie a questa nuova opportunità, nel territorio ferrarese si aggiunge al centro già esistente a Ferrara un altro hub specifico per l'area interna del basso ferrarese, che consente ai ragazzi più fragili di non dover frequentare le attività di orientamento e accompagnamento in città, ma direttamente sul territorio, presso un Ente di formazione di Codigoro. Inoltre, gli Istituti Comprensivi di Tresignana e Codigoro, che sono stati beneficiari dell'attività della strategia fare ponti, hanno dato continuità alle azioni dedicate al rafforzamento dell'attività laboratoriale, anche in contrasto alla dispersione scolastica, intercettando risorse PNRR dedicate a questa finalità¹.

¹ Di seguito sono indicate le risorse PNRR assegnate a ciascun istituto:

- M4C1I1.04 - IS I.T.C.G. G.MONACO DI POMPOSA: 137.517,06 €
- M4C1I1.04 - I.C. CODIGORO: 104.738,48 €
- M4C1I1.04 - I.C. "DON CHENDI" TRESIGALLO: 101.260,79 €

5 APQ ALTA VALMARECCHIA

Di seguito una rappresentazione generale dello stato di attuazione dell'APQ Alta Valmarecchia estratta dal cruscotto di monitoraggio SNAI che fornisce una panoramica sulle informazioni generali relative all'avanzamento dei progetti finanziati nell'area ma anche un riepilogo dei comuni e una mappa dell'area interna.

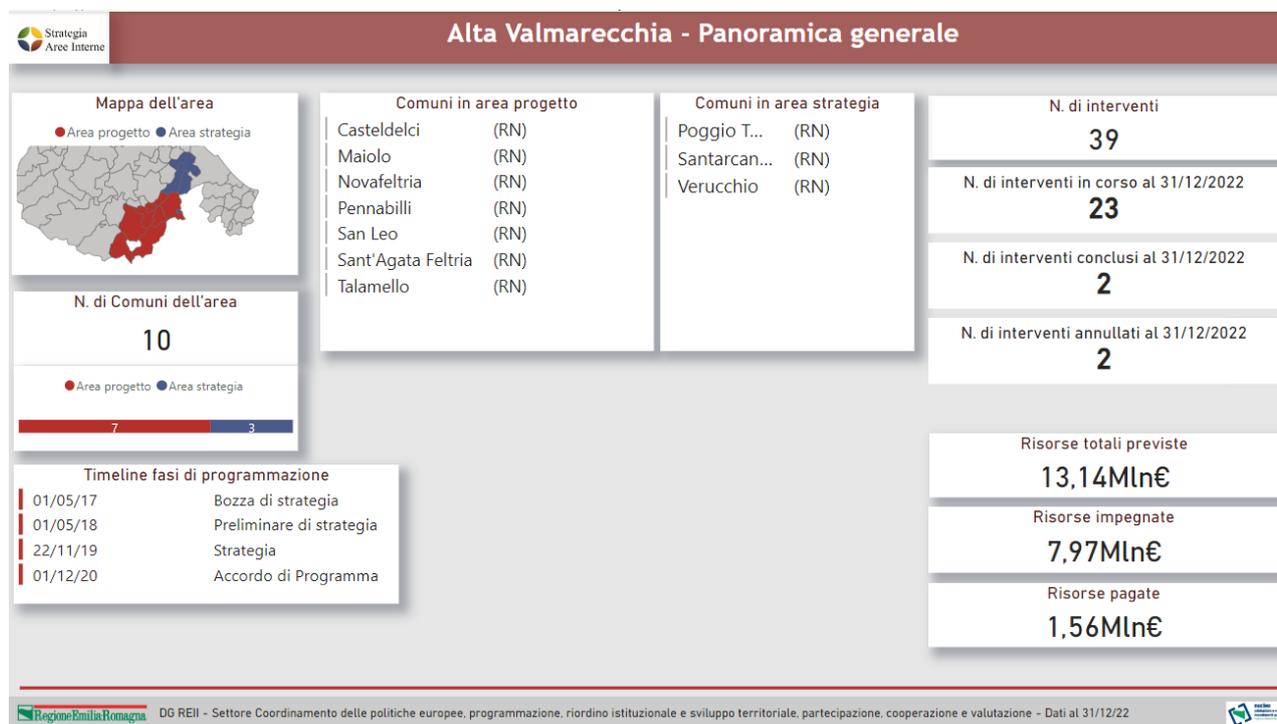

5.1 Inquadramento giuridico APQ

AREA INTERNA	Assegnazione risorse	Approvazione strategia	Approvazione schema di Accordo di Programma	Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro
Alta Valmarecchia	Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015	DGR n. 2271 del 22 novembre 2019	DGR n. 1004 del 03/08/2020	19 febbraio 2021

5.2 Avanzamento finanziario

Risorse Totali previste /programmate (mil/€)	Risorse impegnate (mil/€)	Risorse pagate (mil/€)
13,14	7,9	1,56

Grafico: Avanzamento finanziario per Settore e per Fonte di finanziamento


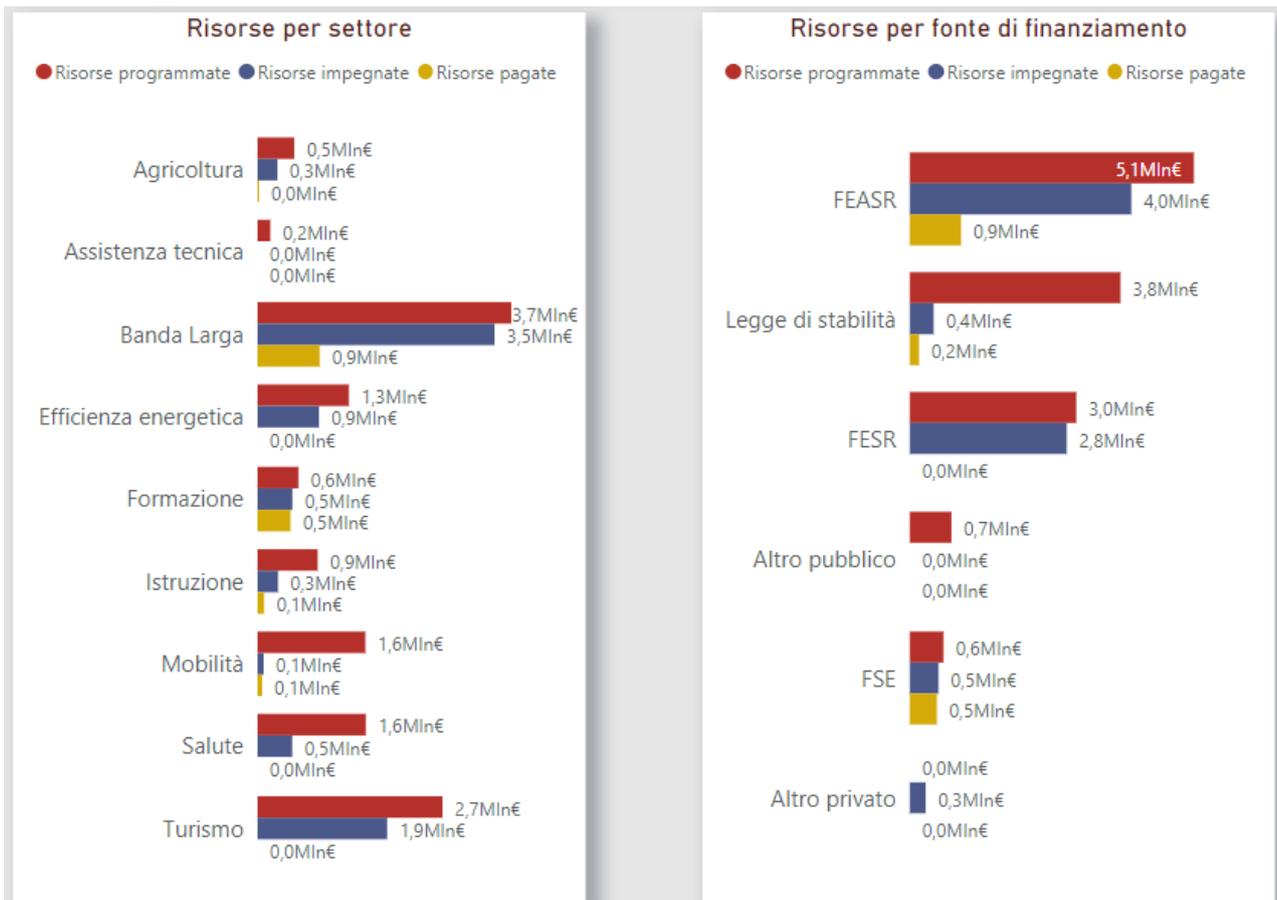


Grafico: Numero di interventi per Settore, per Fonte di finanziamento e tipologia intervento

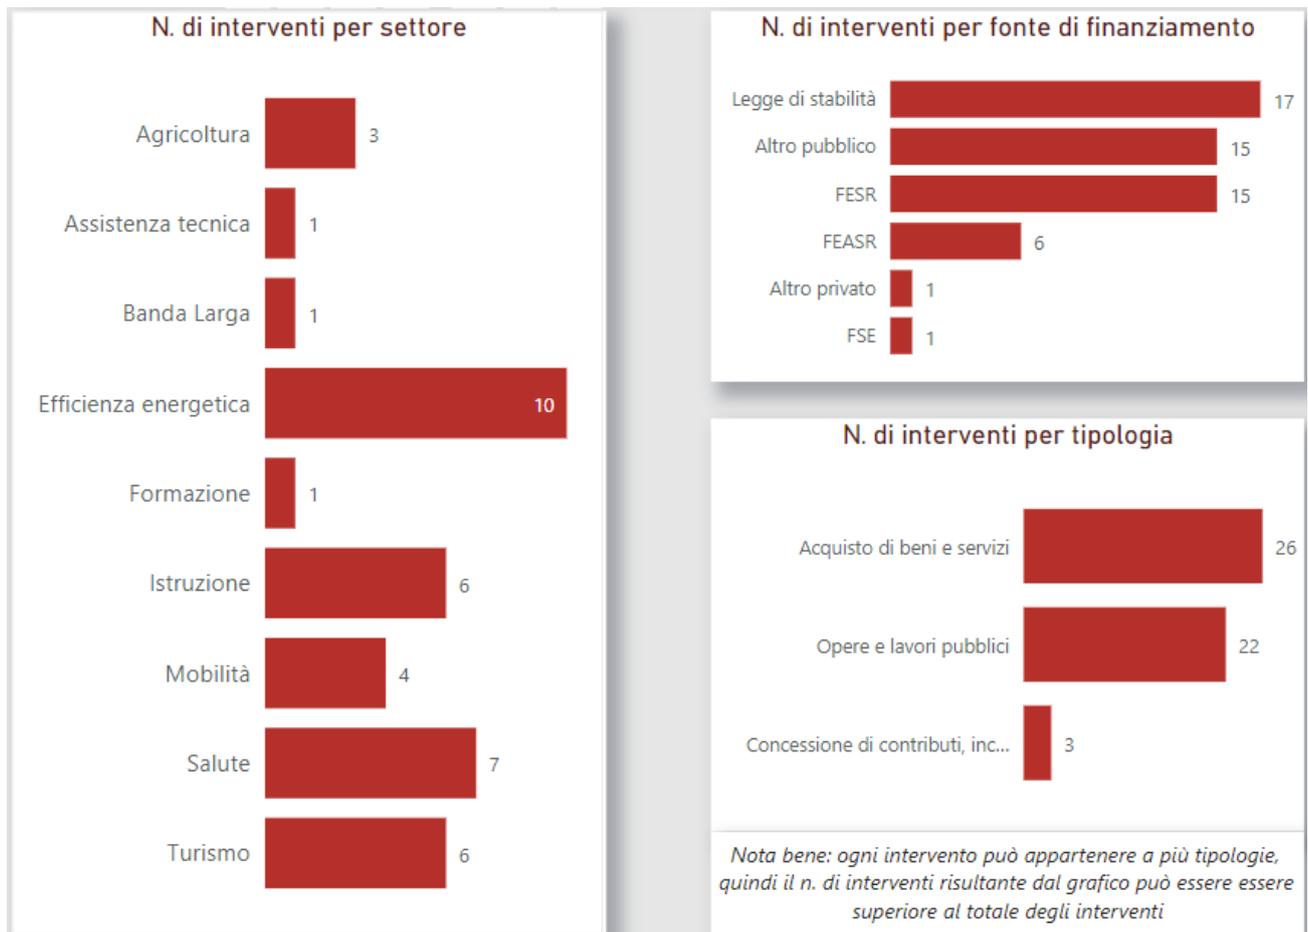

5.3 Stato di attuazione degli interventi

AREA	N. di interventi previsti in APQ	N. di interventi in corso	N. di interventi conclusi	N. di interventi da avviare	N. di interventi annullati
Alta Valmarecchia	39	23	2	12	2*

* Vedi quanto descritto nella panoramica generale

5.4 Tabelle esplicative degli interventi

Tabella: Anagrafica degli interventi

Codice intervento	Titolo intervento	Settore intervento	Fonte finanziamento	Intervento oggetto	Stato intervento
EMIAV01/A	Le filiere corte di montagna	Agricoltura	FEASR	Creazione e sviluppo di filiere corte	Da avviare
EMIAV01/B	Le filiere corte di montagna	Agricoltura	FEASR	Creazione e sviluppo di filiere corte	Da avviare
EMIAV02	Salvaguardia e valorizzazione grani antichi della Valmarecchia "Sgranava"	Agricoltura	FEASR + Altro pubblico	Studio di grani antichi	In corso
EMIAV03/A	T1.a - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! Maiolo Realizzazione osservatorio geologico interattivo del territorio - "Dalla terra al pane"	Turismo	FESR + Altro pubblico	Azioni per la realizzazione di un Geoparco della Valmarecchia Realizzazione Osservatorio geologico interattivo del territorio - "Dalla terra al pane"	In corso
EMIAV03/B	T1.b - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! San Leo - Realizzazione osservatorio geologico	Turismo	FESR + Altro pubblico	Azioni per la realizzazione di un Geoparco della Valmarecchia San Leo realizzazione osservatorio geologico "La grande frana"	In corso
EMIAV03/C	T1.c - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! Novafeltria (Peticara) realizzazione Centro studi geologici	Turismo	FESR + Altro pubblico	Interventi per la realizzazione di un Centro studi geologici come fulcro del Geoparco della Valmarecchia mediante la ristrutturazione/completamento laboratori didattici e scientifici l'ospitalità delle comunità locali e di accoglienza per studenti e visitatori	In corso
EMIAV03/D	T1.d - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! Pennabilli allestimento "Antico palazzo del Bargello" Osservatorio del paesaggio montano dal virtuale al reale	Turismo	FESR + Altro pubblico	Azioni per la realizzazione di un Geoparco della Valmarecchia Pennabilli allestimento all'interno "Antico palazzo del Bargello" dell'Osservatorio del paesaggio montano dal virtuale al reale	In corso
EMIAV03/E	T1.e - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! Talamello - Fruizione sostenibile del Geoparco. Interventi di valorizzazione del sentiero del Minatore	Turismo	FESR + Altro pubblico	Azioni per la realizzazione di un Geoparco della Valmarecchia Talamello - Fruizione sostenibile del Geoparco. Interventi di valorizzazione del sentiero del Minatore	In corso
EMIAV04	T1.f - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! CIP- CENTRI INTERPRETAZIONE PAESAGGIO	Turismo	FEASR	Azioni propedeutiche per la realizzazione di un Geoparco della Valmarecchia	Da avviare
EMIAV05	S1 - La Telemedicina per l'innovazione della rete dei servizi sanitari e socio-assistenziali	Salute	Legge di stabilità	Innovare la rete dei servizi sanitari e socio-assistenziali	In corso
EMIAV06	S2 - Infermiere di comunità per la prossimità dei servizi	Salute	Legge di stabilità	Sviluppare nuove modalità organizzative per potenziare la prossimità e l'integrazione dei servizi sanitari e sociali	In corso
EMIAV07	S3 - Punto unico di accoglienza e orientamento per i servizi socio-sanitari	Salute	Legge di stabilità	Realizzazione di un unico punto di accoglienza e orientamento delle prestazioni Sanitarie e SocioAssistenziali presso l'Ospedale di zona a Novafeltria.	Da avviare
EMIAV08	S4 - Casa di vita - Co-Housing sociale	Salute	Legge di stabilità	Ristrutturazione di un edificio da dedicare al co-housing per l'accoglienza di persone con disagio abitativo	Da avviare
EMIAV09	S5a - Incontri di Vita a Sant'Agata Feltria	Salute	Legge di stabilità	Completamento e ammodernamento della casa di riposo per anziani non autosufficienti in Comune di Sant'Agata Feltria	Da avviare
EMIAV10	S5b - Incontri di Vita a Pennabilli	Salute	Legge di stabilità	Ristrutturazione della Casa Albergo "Terza Primavera" a Pennabilli	In corso
EMIAV11	S6- Casa della Salute a Media Complessità Assistenziale	Salute	FEASR	Realizzazione del presidio sanitario "Casa della Salute a Media complessità"	Concluso
EMIAV12	M1 - Trasporto Sociale	Mobilità	Legge di stabilità	Implementazione del Trasporto sociale a chiamata	In corso
EMIAV13	M2 - Trasporto bus a chiamata	Mobilità	Legge di stabilità	Trasporto bus a chiamata nei sette Comuni dell'area strategia Alta Valmarecchia	Da avviare
EMIAV14	M3 - Pista ciclopedonale Valle del Marecchia	Mobilità	Legge di stabilità	Realizzazione nodi di collegamento e prolungamento "Pista ciclopedonale Valle del Marecchia"	In corso
EMIAV15	M4 - Collegamento vicolo della stazione - via Marechiese	Mobilità	Legge di stabilità	Nodo di collegamento	Da avviare
EMIAV16	F1 - A scuola di sviluppo locale	Formazione	FSE	Interventi di qualificazione del capitale umano	Concluso
EMIAV17	I1 - Learning by doing: la metalmeccanica a scuola (attrezzature)	Istruzione	Legge di stabilità	Allestimento di laboratori polifunzionali	In corso
EMIAV18	I2 - Fab LAB	Istruzione	Legge di stabilità	Realizzazione di un FabLAB	Da avviare
EMIAV19	I3 - Oggi ti racconto la Valmarecchia - corsi extracurricolari per alunni della scuola primaria e secondaria	Istruzione	Legge di stabilità	Attività formativa di educazione al paesaggio, al patrimonio e alle pratiche di innovazione sociale	In corso
EMIAV20/A	I4a- La musica per tutti (potenziamento aule didattiche)	Istruzione	Legge di stabilità	Potenziamento aula didattica dedicata alla musica	Da avviare
EMIAV20/B	I4b- La musica per tutti (potenziamento aule didattiche)	Istruzione	Legge di stabilità	Potenziamento aula didattica dedicata alla musica	Da avviare
EMIAV20/C	I4c- La musica per tutti (potenziamento aule didattiche)	Istruzione	Legge di stabilità	Potenziamento aula didattica dedicata alla musica	Da avviare
EMIAV21/A	E1a - Sant'Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici - Casa di riposo	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici: Casa di Riposo "Incontri di vita"	In corso
EMIAV21/B	E1b - Sant'Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici - Casa della Musica	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici: Casa della Musica	Annullato
EMIAV21/C	E1c - Sant'Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici - Plesso scolastico e palestra	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici: Plesso scolastico e palestra	Annullato
EMIAV22	E2 - Pennabilli - Efficiamento energetico in edificio adibito Museo Mateureka	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche ad uso pubblico - Museo Mateureka	In corso
EMIAV23	E3 - Maiolo - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edificio pubblico sede di attività polivalenti	In corso

EMIAV24/A	E4a – Novafeltria - Efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Polo multiservizi	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici: Polo multiservizi	In corso
EMIAV24/B	E4b – Novafeltria - Efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Scuola dell’infanzia	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici: Scuola dell’infanzia	In corso
EMIAV24/C	E4c – Novafeltria - Efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Palestra comunale	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici: Palestra comunale	In corso
EMIAV25	E5 – San Leo - Efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici - Palazzo Mediceo	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edificio pubblico: Palazzo mediceo	In corso
EMIAV26	E6 – Talamello - Efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Plesso scolastico primario	Efficienza energetica	FESR + Altro pubblico	Riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici: Plesso scolastico primario	In corso
EMIAV27	B1 - Banda Ultra Larga in Valmarecchia	Banda Larga	FEASR	Gli interventi sono relativi alla estensione della BUL a tutto il territorio di progetto	In corso
EMIAV28	AT - Supporto all’attuazione della Strategia - Assistenza Tecnica	Assistenza tecnica	Legge di stabilità	Supporto all’attuazione della strategia, alla gestione delle attività previste e al monitoraggio degli interventi	In corso

Tabella: Avanzamento finanziario degli interventi

Nella tabella l'avanzamento finanziario di ogni intervento è distinto per fonte di finanziamento (Fondo SIE o Legge di Stabilità e, laddove previsto, cofinanziamento indicato con Altro pubblico, se cofinanziamento pubblico locale, o Altro privato) e per ogni fonte una riga.

Intervento codice	Intervento titolo	Fonte finanziamento	Stato intervento	Risorse previste	Risorse impegnate	Risorse pagate
EMIAV01/A	Le filiere corte di montagna	FEASR	Da avviare	200.000 €	0 €	0 €
EMIAV01/B	Le filiere corte di montagna	FEASR	Da avviare	200.000 €	0 €	0 €
EMIAV02	Salvaguardia e valorizzazione grani antichi della Valmarecchia "Sgranava"	Altro privato	In corso	0 €	282.767 €	0 €
EMIAV02	Salvaguardia e valorizzazione grani antichi della Valmarecchia "Sgranava"	FEASR	In corso	139.029 €	8.058 €	3.348 €
EMIAV03/A	T1.a - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale – Salute viaggiatore! Maiolo Realizzazione osservatorio geologico interattivo del territorio – "Dalla terra al pane"	Altro pubblico	In corso	62.000 €	0 €	0 €
EMIAV03/A	T1.a - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale – Salute viaggiatore! Maiolo Realizzazione osservatorio geologico interattivo del territorio – "Dalla terra al pane"	FESR	In corso	248.000 €	247.896 €	0 €
EMIAV03/B	T1.b - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! San Leo - Realizzazione osservatorio geologico	Altro pubblico	In corso	20.000 €	0 €	0 €
EMIAV03/B	T1.b - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! San Leo - Realizzazione osservatorio geologico	FESR	In corso	80.000 €	79.966 €	0 €
EMIAV03/C	T1.c - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! Novafeltria (Peticara) realizzazione Centro studi geologici	Altro pubblico	In corso	234.200 €	0 €	0 €
EMIAV03/C	T1.c - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! Novafeltria (Peticara) realizzazione Centro studi geologici	FESR	In corso	936.800 €	936.406 €	0 €
EMIAV03/D	T1.d - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale – Salute viaggiatore! Pennabilli allestimento "Antico palazzo del Bargello" Osservatorio del paesaggio montano dal virtuale al reale	Altro pubblico	In corso	24.000 €	0 €	0 €
EMIAV03/D	T1.d - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale – Salute viaggiatore! Pennabilli allestimento "Antico palazzo del Bargello" Osservatorio del paesaggio montano dal virtuale al reale	FESR	In corso	96.000 €	95.960 €	0 €
EMIAV03/E	T1.e - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale – Salute viaggiatore! Talamello – Fruizione sostenibile del Geoparco. Interventi di	Altro pubblico	In corso	135.000 €	0 €	0 €

	valorizzazione del sentiero del Minatore					
EMIAV03/E	T1.e - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale – Salute viaggiatore! Talamello – Fruizione sostenibile del Geoparco. Interventi di valorizzazione del sentiero del Minatore	FESR	In corso	540.000 €	539.773 €	0 €
EMIAV04	T1.f - Progetto Integrato Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore! CIP-CENTRI INTERPRETAZIONE PAESAGGIO	FEASR	Da avviare	335.000 €	0 €	0 €
EMIAV05	S1 - La Telemedicina per l'innovazione della rete dei servizi sanitari e socio-assistenziali	Legge di stabilità	In corso	270.000 €	35.063 €	0 €
EMIAV06	S2 – Infermiere di comunità per la prossimità dei servizi	Legge di stabilità	In corso	200.000 €	0 €	0 €
EMIAV07	S3 - Punto unico di accoglienza e orientamento per i servizi socio-sanitari	Legge di stabilità	Da avviare	60.000 €	0 €	0 €
EMIAV08	S4 - Casa di vita – Co-Housing sociale	Legge di stabilità	Da avviare	280.000 €	0 €	0 €
EMIAV09	S5a - Incontri di Vita a Sant'Agata Feltria	Legge di stabilità	Da avviare	220.000 €	0 €	0 €
EMIAV10	S5b - Incontri di Vita a Pennabilli	Legge di stabilità	In corso	80.000 €	0 €	0 €
EMIAV11	S6- Casa della Salute a Media Complessità Assistenziale	FEASR	Concluso	476.508 €	473.430 €	0 €
EMIAV12	M1 – Trasporto Sociale	Legge di stabilità	In corso	90.000 €	90.000 €	67.439 €
EMIAV13	M2 – Trasporto bus a chiamata	Legge di stabilità	Da avviare	300.000 €	0 €	0 €
EMIAV14	M3 - Pista ciclopedonale Valle del Marecchia	Legge di stabilità	In corso	770.000 €	0 €	0 €
EMIAV15	M4 - Collegamento vicolo della stazione - via Marechiese	Legge di stabilità	Da avviare	420.000 €	0 €	0 €
EMIAV16	F1 - A scuola di sviluppo locale	FSE	Concluso	600.000 €	510.811 €	483.000 €
EMIAV17	I1 - Learning by doing: la metalmeccanica a scuola (attrezzature)	Legge di stabilità	In corso	203.850 €	188.173 €	61.212 €
EMIAV18	I2 – Fab LAB	Legge di stabilità	Da avviare	45.000 €	3.850 €	0 €
EMIAV19	I3 - Oggi ti racconto la Valmarecchia - corsi extracurricolari per alunni della scuola primaria e secondaria	Legge di stabilità	In corso	300.000 €	108.439 €	35.058 €
EMIAV20/A	I4a- La musica per tutti (potenziamento aule didattiche)	Legge di stabilità	Da avviare	182.435 €	0 €	0 €
EMIAV20/B	I4b- La musica per tutti (potenziamento aule didattiche)	Legge di stabilità	Da avviare	78.880 €	0 €	0 €
EMIAV20/C	I4c- La musica per tutti (potenziamento aule didattiche)	Legge di stabilità	Da avviare	71.835 €	0 €	0 €
EMIAV21/A	E1a – Sant'Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Casa di riposo	Altro pubblico	In corso	17.898 €	0 €	0 €
EMIAV21/A	E1a – Sant'Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Casa di riposo	FESR	In corso	71.593 €	71.593 €	0 €
EMIAV21/B	E1b – Sant'Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Casa della Musica	Altro pubblico	Annullato	40.000 €	0 €	0 €
EMIAV21/B	E1b – Sant'Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia	FESR	Annullato	160.000 €	0 €	0 €

	da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Casa della Musica					
EMIAV21/C	E1c – Sant’Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Plesso scolastico e palestra	Altro pubblico	Annullato	68.000 €	0 €	0 €
EMIAV21/C	E1c – Sant’Agata Feltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Plesso scolastico e palestra	FESR	Annullato	272.000 €	272.000 €	0 €
EMIAV22	E2 – Pennabilli - Efficiamento energetico in edificio adibito Museo Mateureka	Altro pubblico	In corso	16.819 €	0 €	0 €
EMIAV22	E2 – Pennabilli - Efficiamento energetico in edificio adibito Museo Mateureka	FESR	In corso	67.275 €	62.667 €	0 €
EMIAV23	E3 – Maiolo - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici	Altro pubblico	In corso	19.503 €	0 €	0 €
EMIAV23	E3 – Maiolo - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici	FESR	In corso	78.014 €	78.014 €	0 €
EMIAV24/A	E4a – Novafeltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Polo multiservizi	Altro pubblico	In corso	16.000 €	0 €	0 €
EMIAV24/A	E4a – Novafeltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Polo multiservizi	FESR	In corso	64.000 €	58.229 €	0 €
EMIAV24/B	E4b – Novafeltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Scuola dell’infanzia	Altro pubblico	In corso	18.500 €	0 €	0 €
EMIAV24/B	E4b – Novafeltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Scuola dell’infanzia	FESR	In corso	74.000 €	74.000 €	0 €
EMIAV24/C	E4c – Novafeltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Palestra comunale	Altro pubblico	In corso	21.385 €	0 €	0 €
EMIAV24/C	E4c – Novafeltria - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Palestra comunale	FESR	In corso	85.540 €	85.540 €	0 €
EMIAV25	E5 – San Leo - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici - Palazzo Mediceo	Altro pubblico	In corso	19.752 €	0 €	0 €
EMIAV25	E5 – San Leo - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici - Palazzo Mediceo	FESR	In corso	79.008 €	79.008 €	0 €

EMIAV26	E6 – Talamello - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Plesso scolastico primario	Altro pubblico	In corso	29.851 €	0 €	0 €
EMIAV26	E6 – Talamello - Efficiamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici pubblici – Plesso scolastico primario	FESR	In corso	119.405 €	119.405 €	0 €
EMIAV27	B1 - Banda Ultra Larga in Valmarecchia	FEASR	In corso	3.719.427 €	3.472.534 €	911.229 €
EMIAV28	AT - Supporto all'attuazione della Strategia - Assistenza Tecnica	Legge di stabilità	In corso	188.000 €	0 €	0 €

5.5 Esperienze e buone pratiche dal territorio

Nel corso dell'anno 2022 la strategia dell'area Alta Valmarecchia ha subito un rallentamento dovuto alla situazione di forte crisi, già preoccupante per gli effetti generati dalla pandemia da Covid-19, che è andata ulteriormente ad aggravarsi a seguito del conflitto scoppiato in Ucraina.

Le imprese di costruzioni, tramite i beneficiari, lamentano i costi lievitati di alcune materie prime (anche per l'aumento del costo dell'energia) e le difficoltà nell'approvvigionamento delle stesse.

Se da una parte gli interventi di tipo infrastrutturale hanno subito un rallentamento, dall'altra la Sanità, già fortemente impegnata nell'emergenza Covid, ha puntato sui servizi di prossimità per non appesantire ulteriormente le strutture sanitarie. I progetti di telemedicina e quello degli infermieri di prossimità sono stati attivati.

Gli interventi per la formazione e l'istruzione sono proseguiti come programmato anche se con tempistiche dilatate.

Rilevante il successo dell'intervento "Trasporto sociale" (EMIAV12 – M1) che ha servito un'utenza di circa 500 persone. È stato acquisito un automezzo nuovo ad uso sanitario semplice, ad integrazione di quello esistente, per pazienti dializzati e per disabili, adeguatamente allestito e in regola con le normative antinquinamento, impegnando un solo operatore volontario senza la necessità di utilizzare l'autoambulanza, che resta così destinata alle funzioni di soccorso e trasporto in emergenza-urgenza.
